PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

DESPESAS

CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 1 PADRÃO
FNDE
(PROINFÂNCIA)B.STA.CLARA
PAC II 10029/2014
– CT Nº 92/15
BB – C: 100.707-6
EMPRESA: NORRAU

JUNHO/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Junho de 2023

CONTA: 111.03.56 - BB - 100.707-6 - PM CRISTINÁPOLIS - PAC II - CONSTR. — **Junho**

DATA	LANC	DOC	NE - NL - NP	GR	OBSERVAÇÃO	VALOR
07/06/2023	6070053	1987	*** - *** - ***		VALOR ref ao resgate automático de saldo da conta de aplicação para a conta corrente	110.171,07 +
07/06/2023	6070063	060702	*** - *** - 6070043		REF A TAXA ADMINISTRATIVA - NORRAU	1.101,71 -
07/06/2023	6070064	060701	6070001/2023 - 6070015 - 6070044	6070047	PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 6070015 - 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. (REEMPENHO DO EMPENHO N° 3270001/2023).	109.069,36 -

DEPÓSITO: 110.171,07 **SAQUE: 110.171,07** **SALDO DIA: 0,00**

TOTAL DE LANÇAMENTOS:3

SALDO ANTERIOR:	**0,00**
TOTAL DEPÓSITO:	**110.171,07**
TOTAL SAQUE:	**110.171,07**
SALDO ATUAL:	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO - Nº 7070033/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED

Fonte de Recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres

FORNECEDOR

NOME:	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME		2852		
ENDEREÇO:	AV SETE DE SETEMBRO, 71	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	DOIS DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05917626000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	NORRAU CONSTRUÇÕES
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE:	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490510000 - OBRAS E INSTALACOES

EMPENHO

EMPENHO	DATA DO EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	DATA DA LIQUIDAÇÃO	SALDO ANTERIOR	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO	SALDO ATUAL
6070001/2023	07/06/2023	7070025	07/07/2023	R$ 110.171,07	R$ 110.171,07	R$ 1.101,71	R$ 109.069,36	R$ 0,00

HISTÓRICO DO EMPENHO:

10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. (REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3270001/2023).

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. (REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3270001/2023).

HISTÓRICO DE PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: 7070025 - 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. (REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3270001/2023).

DADOS DO PAGAMENTO:

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.56 - BB - 100.707-6 - PM CRISTINÁPOLIS - PAC II - CONSTR.	060701	R$ 109.069,36
	TOTAL:	**R$ 110.171,07**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 07/07/2023

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 07/07/2023

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340714147587781
07/06/2023 14:18:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.18.10
2750202750          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PAC I
AGENCIA: 2750-2 CONTA:       100.707-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PAC I
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4827-5 - NOVA SOURE
CONTA:         511-0

FAVORECIDO:  NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E
CPF/CNPJ: 05.917.626/0001-80
VALOR: R$                              109.069,36
DEBITO EM: 07/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB:        2.224.330.8C1.E71.149
```

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE PAGAMENTO EXTRA - Nº 6070043/2023

FORNECEDOR

NOME:	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				
ENDEREÇO:	AV SETE DE SETEMBRO, 71	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	DOIS DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05917626000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	NORRAU CONSTRUÇÕES
CONTA:					

CONTA	BRUTO	RETIDO	LÍQUIDO
213.01.205 - TAXAS	R$ 1.101,71	R$ 0,00	R$ 1.101,71

REF A TAXA ADMINISTRATIVA - NORRAU

CONTA	DOCUMENTO	VALOR
111.03.56 - BB - 100.707-6 - PM CRISTINÁPOLIS - PAC II - CONSTR.	060702	1.101,71
	TOTAL:	**R$ 1.101,71**

PAGUE-SE

Autorizo o pagamento deste processo

Data : 07/06/2023

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

PAGO

O processo foi pago confome autorização

Data : 07/06/2023

013.048.415-61 - RENATA CAROLINE REIS RITA BRITO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS - DEC. 407/2021

NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME 05.917.626/0001-80

Recebi(emos) da(o)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS

a importância abaixo discriminada,conforme especificações da Nota de Pagamento de Despesa acima, pelo que damos total quitação.

TOTAL: **R$ 1.101,71**

CONTA	OB/CH	VALOR
111.03.56 - BB - 100.707-6 - PM CRISTINÁPOLIS - PAC II - CONSTR.	060702	1.101,71

NOME:	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				
ENDEREÇO:	AV SETE DE SETEMBRO, 71	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	DOIS DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05917626000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	NORRAU CONSTRUÇÕES

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.18.10
2750202750         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
              COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CRISTINAPOLIS-PAC I
AGENCIA: 2750-2 CONTA:       100.707-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CRISTINAPOLIS-PAC I
BANCO: 047 - BCO DO EST. DE SE S.A.
AGENCIA: 0020-5 - CRISTINAPOLIS
CONTA:     300.279-2

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS
CPF/CNPJ: 13.096.029/0001-60
VALOR: R$                            1.101,71
DEBITO EM: 07/06/2023
================================================
DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB:        4.977.94A.56D.4EF.561
```

Transação efetuada com sucesso por: JE694806 SANDRO DE JESUS DOS SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE LIQUIDAÇÃO - Nº 6070015/2023

Fonte de Recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

FORNECEDOR

NOME:	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				
ENDEREÇO:	AV SETE DE SETEMBRO, 71	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	DOIS DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05917626000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	NORRAU CONSTRUÇÕES
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE:	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490510000 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE:	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

EMPENHO

EMPENHO	ANO	DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO:	SALDO ATUAL
6070001	2023	07/06/2023	111.308,40	R$ 110.171,07	1.137,33

HISTÓRICO DO EMPENHO

10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. (REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3270001/2023).

HISTÓRICO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. (REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3270001/2023).

DOCUMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

DOCUMENTO	VALOR
TIPO: NOTA FISCAL (Nº NOTA: 2023000044 / SÉRIE: 1 / UF: BA / DATA DE EMISSÃO: 07/06/2023 / CHAVE:)	R$ 110.171,07

RETENÇÕES

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR
213.01.205 - TAXAS	1.101,71
TOTAL RETIDO:	**1.101,71**
TOTAL LÍQUIDO:	**109.069,36**

Declaração

Declaramos que os materiais foram recebidos e/ ou Serviços foram prestados

Data : 07/06/2023

Sandro de Jesus dos Santos

030.242.935-23 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

A despesa foi devidamente liquidada, podendo ser paga.

Data : 07/06/2023

Samile Santos Reis

SAMILE SANTOS REIS
Setor de Empenho

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE OLINDINA
Secretaria Municipal de Finanças
PCA Antônio Borges Santana, SN - CENTRO - 48.470-000
CNPJ: 13.647.854/0001-06

01/06/2023 10:52:34

NÚMERO DA NOTA	202300000000044
DATA E HORA DA EMISSÃO	01/06/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	AMZQ0MDU5
COD. MUNICIPIO GERADOR	2923100BA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 44300134
NOME FANTASIA: NORRAU SERVIÇOS			UF: BA
CNPJ/CPF: 05917626000180			CIDADE - 2923100: Olindina
ENDEREÇO: AVENIDA JONIVAL LUCAS DA SILVA, 12	COMPLEMENTO: SALA		BAIRRO: CENTRO
E-MAIL: DEBORAHPONTUALCONTABILIDADE@GMAIL.COM	TELEFONE: 75 998251734		CEP: 48470000

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS - SERGIPE				CNPJ/CPF: 13096029000160
NOME FANTASIA	INSC. ESTADUAL	TELEFONE: 79 35421205_	UF: SE	CEP: 49270000
ENDEREÇO: PRACA DA BANDEIRA, 81				BAIRRO: CENTRO
E-MAIL: cpl.cpl.cris@yahoo.com.br				CIDADE - 2801702: Cristinapolis

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1 PADRÃO FNDE, NO BAIRRO SANTA CLARA NA SEDE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 92/2015, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27 (VINTE E SETE), NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/05/2023, ORGÃO CONCEDENTE FNDE/MEC, TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 10029/2014, PROGRAMA PROINFANCIA.

MÃO DE OBRA 60%
MATERIAIS 40%

ISS R$ 1.322,05
INSS R$ 2.313,59

ISS CALCULADO SOB BASE DE 2% SOBRE MÃO DE OBRA, CONFORME LEI DO SIMPLES NACIONAL.
INSS CALCULADO SOB BASE DE 3,5% SOBRE MÃO DE OBRE, CONFORME LEI 12.844/2013.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG 4827 C/C 511-0

DECLARO QUE
- O material foi fornecido ☐
- A obra foi executada ☒
- O serviço foi prestado ☐

Em: 07 / 06 / 2023

José Eduardo Macedo Carvalho

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377OSE
Engenheiro Civil

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO CNAE
4299599	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CODIGO / DESCRIÇÃO DO SERVIÇO LC 116/2003

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

VALOR TOTAL DO(S) SERVIÇO(S) (R$) = 110.171,07

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	2.313,59	0,00	0,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	Retenção ISS	Outras Retenções (R$)	Valor Líquido (R$)
44.068,40	66.102,67	2,00	1.322,05	Sim	0,00	106.535,43

INFORMAÇÕES FISCAIS

Tributação:
Iss Devido Fora do Municipio

Regime Tributação Especial
CONSTRUCAO, HIDRAULICA

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

UF / Municipio de Prestação do Serviço:
SE - Cristinapolis

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFs-e esta sujeita a verificação.
Utilize o QRCode para acessar o endereço ou vá em http://olindina.ba.link3.com.br:2022/l3-grp/NFe.html/ clique em verificar NFs-e
O crédito gerado estará disponível somente após recolhimento do ISS desta NF-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 1542	CONTRIBUINTE NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E	Nrº DAM 75142023	16/06/2023
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV JONIVAL LUCAS DA SILVA, nº: 12, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE OLINDINA		UF BA

DOCUMENTOS				
C.P.F / C.N.P.J. 05917626000180	R.G.	IE	IM	PIS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		
TRIBUTO 110	ESPECIFICAÇÃO ISSQN VARIAVEL	Nrº SERVIÇO

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO					
BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 66.102,67	2,00	R$ 1.322,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.322,05

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2023	09/06/2023	16/06/2023

MENSAGEM		
NFSe 202300000000044	(=) VALOR DEVIDO	R$ 1.322,05
	(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
	(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
	(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
	(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
	(=) VALOR A PAGAR	R$ 1.322,05

81660000013 6 22051281202 9 30616202310 6 07011007514 3

ISSQN VARIAVEL

BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE

NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	75142023	ISSQN-VAR	16/06/2023	R$ 1.322,05

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

Documento de Arrecadação Municipal - DAM

pix

DADOS DO CONTRIBUINTE			VENCIMENTO
CÓDIGO 1542	CONTRIBUINTE NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E	Nrº DAM 74482023	31/08/2023
TIPO/NOME/LOGRADOURO/NÚMERO AV JONIVAL LUCAS DA SILVA, nº: 12, Complemento: SALA			
BAIRRO CENTRO	CIDADE OLINDINA		UF BA

DOCUMENTOS

C.P.F / C.N.P.J.	R.G.	IE	IM	PIS
05917626000180				

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIBUTO	ESPECIFICAÇÃO	Nrº SERVIÇO
103	TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	

COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO

BASE CÁLCULO	ALIQUOTA	VALOR IMPOSTO	TX.	TSU	VALOR TOTAL
R$ 110.171,07	1,00	R$ 1.101,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.101,71

DADOS PARA PAGAMENTO

PARCELA	MÊS REF.	EXERCICIO	DATA LANÇAMENTO	DATA VENCIMENTO
0	06	2023	07/06/2023	31/08/2023

MENSAGEM
NFSe 202300000000044
LEI 748/2018

(=) VALOR DEVIDO	R$ 1.101,71
(-) VALOR DESCONTO	R$ 0,00
(+)CORREÇÃO MON.	R$ 0,00
(+)MULTA DE MORA	R$ 0,00
(+)JUROS DE MORA	R$ 0,00
(=) VALOR A PAGAR	R$ 1.101,71

81660000011 0 01711281202 3 30831202310 1 02010307448 8

TAXA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
BOLETO PAGAVEL NOS BANCOS: BANCO DO BRASIL E BANESE - BANCO DO ESTADO DE

CONTRIBUINTE
NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

EXERCICIO	Nrº DAM	ESPÉCIE	VENCIMENTO	VALOR
2023	74482023	TAM	31/08/2023	R$ 1.101,71

Impresso por: Cesar Mota

Gerado por:Cesar Mota

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 6070001/2023

07/06/2023

FORNECEDOR

NOME:	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				
ENDEREÇO:	AV SETE DE SETEMBRO, 71	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	DOIS DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05917626000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	NORRAU CONSTRUÇÕES
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE:	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490510000 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE:	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	111.308,40	R$ 110.171,07	1.137,33

LICITAÇAO	OBRA
TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 43 - ART. 55, XI DA LEI Nº 8.666/93	10029/2015 - Do Órgão construção

CONTRATO	CONVÊNIO
92/2015 - Do Órgão	10029/2015 - Do Órgão

HISTÓRICO

10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS. (REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3270001/2023).

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA	1,000	SER	110.171,0700	110.171,07
				TOTAL:	**110.171,07**

Autorizado
Data : 07/06/2023

Sandro de Jesus dos Santos

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 07/06/2023

Samile Santos Reis

SAMILE SANTOS REIS
Setor de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA Nº: 81, Bairro CENTRO
CEP: 49.270-000 CRISTINAPOLIS/SE
13096029000160

INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS POR PLANO DE CONTA

NÚMERO	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	REAVALIADO	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
122.02.01 - BENS IMOVEIS					QUANT.: 1,00	TOTAL: R$ 110.171,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS					QUANT.: 1,00	TOTAL: R$ 110.171,07
0000002331	CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO SANTA CLARA 1ª ETAPA CONFORME CONTRATO 92/2015	01/06/2023		NOVO	R$ 110.171,07	R$ 110.171,07
				QUANT.:	1,00	TOTAL CORRIGIDO: R$ 110.171,07

_____, _____ de _____ de _____

_____
Responsável

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

CHECK LIST PAGAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Processo nº: Contrato Nº 092/2015 **Vigência:** 19/07/2023
Empresa Contratada: NORRAU
Resumo do objeto: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA
Fonte de Recurso: FNDE

ITENS	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
Nota fiscal contendo nº do empenho/ano da licitação e nº do contrato /ano.			
Certidão de Regularidade do FGTS	√		OK
Certidão Negativa de Tributos Municipais	√		OK
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais e Dívidas Ativa da União.	√		OK
Certidão Negativa de Tributos Estaduais	√		OK
Certidão de Regularidade Trabalhista	√		OK
CERTIDÃO DP CREA- PESSOA JURÍDICA	√		OK
CERTIDÃO DO CREA- PESSOA FÍSICA	√		OK
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica- **ART DE EXECUÇÃO.**	√		OK
Cópia do comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica-**ART DE FISCALIZAÇÃO.**	√		OK
CNO **(CADASTRO NACIONAL DE OBRA)** ou justificativa do fiscal quando não for necessário.	√		OK
REGISTRO FOTOGRÁFICO	√		OK
MEMORIA DE CÁLCULO	√		OK
DIÁRIO DA OBRA (02 VIAS)	√		
Extrato de Optante ou de Não Optante pelo Simples	√		OK
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários **(Guia da Previdência Social – (GPS)).**			É RECOLHIDO AQUI
Recolhimento do INSS relativo aos funcionários **(Guia de Recolhimento do FGTS – (GRF)).**			É RECOLHIDO AQUI
Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – **SEFIP**, do mês anterior à Prestação de Serviço, só com relação dos trabalhadores constates do arquivo e com resumo das informações á Previdência Social constantes do arquivo, e que comprove o valor pago referente ao FGTS e à Contribuição Previdenciária.			É RECOLHIDO AQUI

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINAPOLIS
PC DA BANDEIRA, 81, CENTRO
CEP: 49.270-000
CNPJ: 13.096.029/0001-60

NOTA DE EMPENHO - Nº 3270001/2023

27/03/2023

FORNECEDOR

NOME:	NORRAU CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA-ME				
ENDEREÇO:	AV SETE DE SETEMBRO, 71	**Nº:**	0	**BAIRRO:**	DOIS DE JULHO
CIDADE:	CRISTINAPOLIS	**ESTADO:**	SE	**COMPLEMENTO:**	
CNPJ/CPF :	05917628000180	**INSC. ESTADUAL:**		**INSC. MUNICIPAL:**	NORRAU CONSTRUÇÕES
CONTA:					

CLASSIFICAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	30012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED
FUNÇÃO:	12 - EDUCACAO
SUBFUNÇÃO:	365 - EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA:	1123 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ ESCOLA)
PROJETO/ATIVIDADE:	1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHES
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA:	4490510000 - OBRAS E INSTALACOES
FONTE:	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
SUBELEMENTO DE DESPESA:	03 - OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO

EMPENHO

TIPO	NATUREZA DE CRÉDITO	CATEGORIA	SALDO ANTERIOR	Valor do Empenho	SALDO ATUAL
GLOBAL	ORÇAMENTÁRIO	COMUM	10.000,00	R$ 1.000,00	9.000,00

LICITAÇÃO

TIPO MOD.: 6 - DISPENSA, B. LEGAL: 43 - ART. 55, XI DA LEI Nº 8.666/93

OBRA

10029/2015 - Do Órgão
construção

CONTRATO

92/2015 - Do Órgão

CONVÊNIO

10029/2015 - Do Órgão

HISTÓRICO

10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 92/2015 DE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICÍPIO DE CRISTINÁPOLIS.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNIDADE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA	1,000	MS	1.000,0000	1.000,00
				TOTAL:	1.000,00


Autorizado
Data : 27/03/2023

03024293523 - SANDRO DE JESUS DOS SANTOS
PREFEITO

Empenhado
Data : 27/03/2023

DANIEL SANTOS REIS
Setor de Empenho


OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1- PADRÃO FNDE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO: 092/2015
Contratada : NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	Período: 01/09/2021 À 30/05/2023	

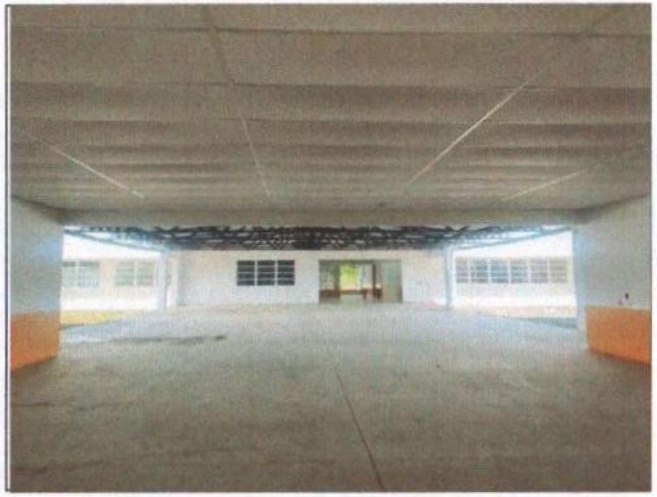

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

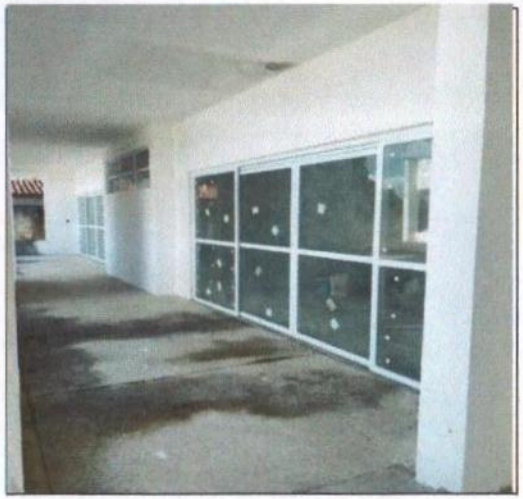

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1




CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA 233340-0

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1- PADRÃO FNDE Contratada : NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** Período: 01/09/2021 À 30/05/2023	CONTRATO: 092/2015

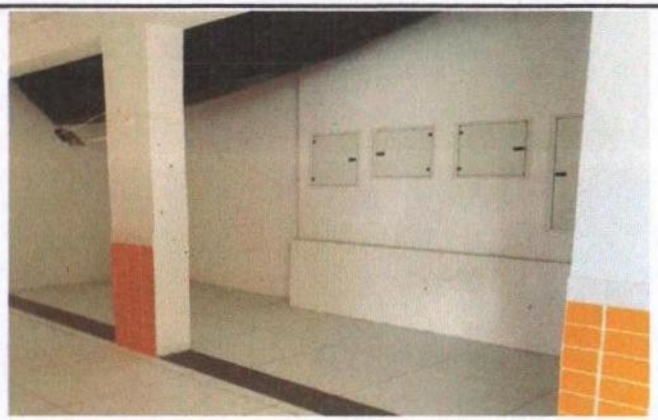

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1




CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA/BA Nº 050366840-0


OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1- PADRÃO FNDE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO: 092/2015
Contratada : NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	Período: 01/09/2021 À 30/05/2023	

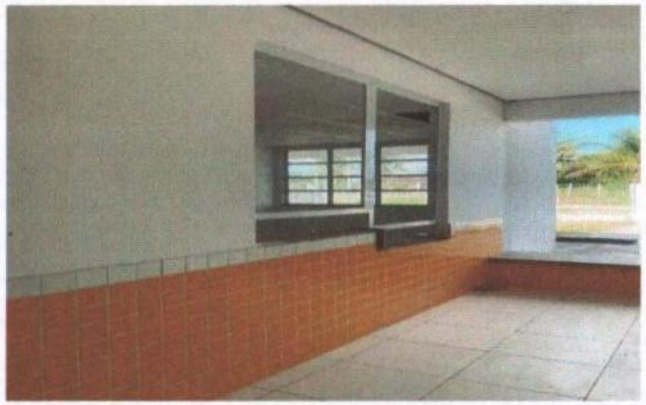


CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

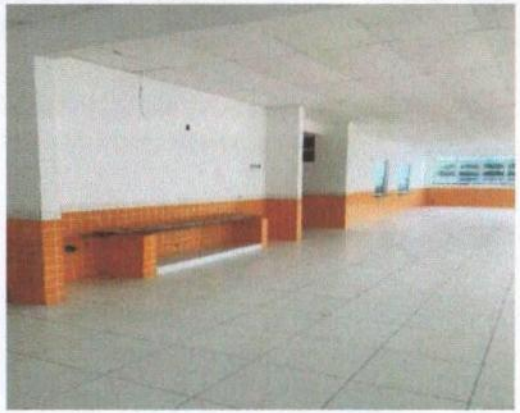

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

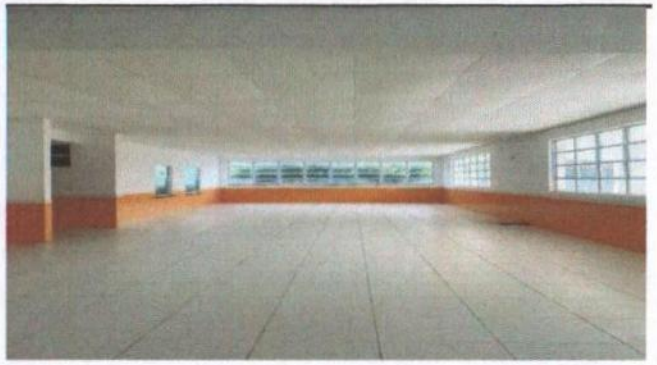

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-SP Nº 5060366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado - padrão Governo Federal	m2	6,00	R$ 236,74	R$ 1.420,44	-	0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 1.420,44	6,00	100,00%	R$ 1.420,44
1.2	Ligação provisória de água	un	1,00	R$ 303,48	R$ 303,48	-	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 303,48	1,00	100,00%	R$ 303,48
1.3	Ligação provisória de energia	un	1,00	R$ 1.387,07	R$ 1.387,07	-	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 1.387,07	1,00	100,00%	R$ 1.387,07
1.4	Ligação provisória de esgoto	un	1,00	R$ 303,48	R$ 303,48	-	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 303,48	1,00	100,00%	R$ 303,48
1.5	Barracão provisório (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m2	40,00	R$ 149,95	R$ 5.998,00	-	0,00%	R$ -	40,00	100,00%	R$ 5.998,00	40,00	100,00%	R$ 5.998,00
1.6	Sondagem do terreno (um furo de 7 m a cada 200 m²) - SPT	m	56,00	R$ 49,33	R$ 2.762,48	-	0,00%	R$ -	56,00	100,00%	R$ 2.762,48	56,00	100,00%	R$ 2.762,48
1.7	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m2	80,00	R$ 51,81	R$ 4.144,80	-	0,00%	R$ -	80,00	100,00%	R$ 4.144,80	80,00	100,00%	R$ 4.144,80
1.8	Limpeza e Regularização mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	3.084,20	R$ 0,56	R$ 1.727,15	-	0,00%	R$ -	3.084,20	100,00%	R$ 1.727,15	3.084,20	100,00%	R$ 1.727,15
1.9	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	3.084,20	R$ 1,33	R$ 4.101,99	-	0,00%	R$ -	3.084,20	100,00%	R$ 4.101,99	3.084,20	100,00%	R$ 4.101,99
1.10	Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia (para nivelamento do terreno)	m3	65,00	R$ 43,91	R$ 2.854,15	-	0,00%	R$ -	65,00	100,00%	R$ 2.854,15	65,00	100,00%	R$ 2.854,15
1.11	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.510,23	R$ 3,57	R$ 5.391,52	-	0,00%	R$ -	1.510,23	100,00%	R$ 5.391,52	1.510,23	100,00%	R$ 5.391,52
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 30.394,56			R$ 0,00			R$ 30.394,56		100,00%	R$ 30.394,56
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES													
2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m3	146,87	R$ 25,10	R$ 3.686,44	-	0,00%	R$ -	146,87	100,00%	R$ 3.686,44	146,87	100,00%	R$ 3.686,44
2.2	Regularização e compactação do fundo de vala	m2	298,47	R$ 15,21	R$ 4.539,73	-	0,00%	R$ -	298,47	100,00%	R$ 4.539,73	298,47	100,00%	R$ 4.539,73
2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	98,77	R$ 1,72	R$ 169,88		0,00%	R$ -	98,77	100,00%	R$ 169,88	98,77	100,00%	R$ 169,88
2.4	Aterro apiloado com camadas de 0,20 m com areia entre baldrames	m3	298,47	R$ 43,91	R$ 13.105,82	-	0,00%	R$ -	298,47	100,00%	R$ 13.105,82	298,47	100,00%	R$ 13.105,82
2.5	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m (MURETA)	m3	11,26	R$ 25,10	R$ 282,63		0,00%	R$ -	11,26	100,00%	R$ 282,63	11,26	100,00%	R$ 282,63
2.6	Regularização e compactação do fundo de vala (MURETA)	m2	17,74	R$ 15,21	R$ 269,83		0,00%	R$ -	17,74	100,00%	R$ 269,83	17,74	100,00%	R$ 269,83
2.7	Reaterro apiloado de vala com material da obra (MURETA)	m3	6,39	R$ 1,72	R$ 10,99		0,00%	R$ -	6,39	100,00%	R$ 10,99	6,39	100,00%	R$ 10,99
2.8	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m (CASTELO D' ÁGUA)	m3	5,78	R$ 25,10	R$ 145,08	-	0,00%	R$ -	5,78	100,00%	R$ 145,08	5,78	100,00%	R$ 145,08
2.9	Regularização e compactação do fundo de vala (CASTELO D' ÁGUA)	m2	12,96	R$ 15,21	R$ 197,12	-	0,00%	R$ -	12,96	100,00%	R$ 197,12	12,96	100,00%	R$ 197,12
2.10	Reaterro apiloado de vala com material da obra (CASTELO D' ÁGUA)	m3	1,06	R$ 1,72	R$ 1,82	-	0,00%	R$ -	1,06	100,00%	R$ 1,82	1,06	100,00%	R$ 1,82
2.11	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m (MURO)	m3	72,03	R$ 25,10	R$ 1.807,95	-	0,00%	R$ -	72,03	100,00%	R$ 1.807,95	72,03	100,00%	R$ 1.807,95
2.12	Reaterro apiloado de vala com material da obra (MURO)	m3	13,60	R$ 1,72	R$ 23,39	-	0,00%	R$ -	13,60	100,00%	R$ 23,39	13,60	100,00%	R$ 23,39
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 24.240,68			R$ 0,00			R$ 24.240,68		100,00%	R$ 24.240,68
3	FUNDAÇÕES													
3.1	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico para sapatas (SAPATAS)	m2	108,97	R$ 18,04	R$ 1.965,82	-	0,00%	R$ -	108,97	100,00%	R$ 1.965,82	108,97	100,00%	R$ 1.965,82
3.2	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para sapatas	m2	193,58	R$ 23,37	R$ 4.523,96	-	0,00%	R$ -	193,58	100,00%	R$ 4.523,96	193,58	100,00%	R$ 4.523,96
3.3	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (SAPATAS)	kg	1.302,09	R$ 6,90	R$ 8.984,42	-	0,00%	R$ -	1.302,09	100,00%	R$ 8.984,42	1.302,09	100,00%	R$ 8.984,42
3.4	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (SAPATAS)	kg	151,64	R$ 6,64	R$ 1.006,89	-	0,00%	R$ -	151,64	100,00%	R$ 1.006,89	151,64	100,00%	R$ 1.006,89
3.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SAPATAS)	m3	25,36	R$ 375,00	R$ 9.534,85	-	0,00%	R$ -	25,36	100,00%	R$ 9.534,85	25,36	100,00%	R$ 9.534,85
3.6	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (VIGA	m2	707,67	R$ 23,37	R$ 16.538,25	-	0,00%	R$ -	707,67	100,00%	R$ 16.538,25	707,67	100,00%	R$ 16.538,25

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 060366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023				DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
3.7	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (VIGA BALDRAME)	kg	1.248,55	R$ 6,90	R$ 8.615,00	-	0,00%	R$ -	1.248,55	100,00%	R$ 8.615,00	1.248,55	100,00%	R$ 8.615,00	
3.8	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (VIGA BALDRAME)	kg	645,82	R$ 6,64	R$ 4.288,24	-	0,00%	R$ -	645,82	100,00%	R$ 4.288,24	645,82	100,00%	R$ 4.288,24	
3.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (VIGA BALDRAME)	m3	40,93	R$ 375,98	R$ 15.388,86	-	0,00%	R$ -	40,93	100,00%	R$ 15.388,86	40,93	100,00%	R$ 15.388,86	
3.10	Estaca a trado (broca) diametro = 30 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa,	m	56,00	R$ 48,86	R$ 2.736,16	-	0,00%	R$ -	56,00	100,00%	R$ 2.736,16	56,00	100,00%	R$ 2.736,16	
3.11	Corte e preparo em cabeca de estaca (CASTELO D' ÁGUA)	un	12,00	R$ 35,35	R$ 424,20	-	0,00%	R$ -	12,00	100,00%	R$ 424,20	12,00	100,00%	R$ 424,20	
3.12	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico para bloco (CASTELO D'	m2	12,96	R$ 18,04	R$ 233,80	-	0,00%	R$ -	12,96	100,00%	R$ 233,80	12,96	100,00%	R$ 233,80	
3.13	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (CASTELO D' ÁGUA)	m2	7,20	R$ 23,37	R$ 168,26	-	0,00%	R$ -	7,20	100,00%	R$ 168,26	7,20	100,00%	R$ 168,26	
3.14	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto (CASTELO D' ÁGUA)	un	6,48	R$ 604,72	R$ 3.918,59	-	0,00%	R$ -	6,48	100,00%	R$ 3.918,59	6,48	100,00%	R$ 3.918,59	
3.15	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (CASTELO D' ÁGUA)	m3	4,71	R$ 375,98	R$ 1.770,87	-	0,00%	R$ -	4,71	100,00%	R$ 1.770,87	4,71	100,00%	R$ 1.770,87	
3.16	Estaca a trado (broca) diametro = 30 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armacao - 7 m (MURETA - BLOCO)	m	52,50	R$ 48,86	R$ 2.565,15		0,00%	R$ -	52,50	100,00%	R$ 2.565,15	52,50	100,00%	R$ 2.565,15	
3.17	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico para bloco (MURETA - BLOCO)	m2	27,97	R$ 18,04	R$ 504,58		0,00%	R$ -	27,97	100,00%	R$ 504,58	27,97	100,00%	R$ 504,58	
3.18	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (MURETA - BLOCO)	m2	21,39	R$ 23,37	R$ 499,88		0,00%	R$ -	21,39	100,00%	R$ 499,88	21,39	100,00%	R$ 499,88	
3.19	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURETA - BLOCO)	kg	34,36	R$ 6,90	R$ 237,08		0,00%	R$ -	34,36	100,00%	R$ 237,08	34,36	100,00%	R$ 237,08	
3.20	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (MURETA - BLOCO)	kg	37,91	R$ 6,64	R$ 251,72		0,00%	R$ -	37,91	100,00%	R$ 251,72	37,91	100,00%	R$ 251,72	
3.21	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURETA - BLOCO)	m3	2,38	R$ 375,98	R$ 894,83		0,00%	R$ -	2,38	100,00%	R$ 894,83	2,38	100,00%	R$ 894,83	
3.22	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (MURETA - VIGA BALDRAME)	m2	28,49	R$ 23,37	R$ 665,81		0,00%	R$ -	28,49	100,00%	R$ 665,81	28,49	100,00%	R$ 665,81	
3.23	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURETA - VIGA BALDRAME)	kg	62,91	R$ 6,90	R$ 434,08		0,00%	R$ -	62,91	100,00%	R$ 434,08	62,91	100,00%	R$ 434,08	
3.24	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (MURETA - VIGA BALDRAME)	kg	26,82	R$ 6,64	R$ 178,08		0,00%	R$ -	26,82	100,00%	R$ 178,08	26,82	100,00%	R$ 178,08	
3.25	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURETA -	m3	1,52	R$ 375,98	R$ 571,49		0,00%	R$ -	1,52	100,00%	R$ 571,49	1,52	100,00%	R$ 571,49	
3.26	Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte - 30cm x 30cm (MURO)	m3	17,47	R$ 305,64	R$ 5.339,53	-	0,00%	R$ -	17,47	100,00%	R$ 5.339,53	17,47	100,00%	R$ 5.339,53	
3.27	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco	m2	116,52	R$ 23,37	R$ 2.723,07	-	0,00%	R$ -	116,52	100,00%	R$ 2.723,07	116,52	100,00%	R$ 2.723,07	
3.28	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - VIGA BALDRAME - 15cm x 30cm)	m3	8,74	R$ 375,98	R$ 3.286,07	-	0,00%	R$ -	8,74	100,00%	R$ 3.286,07	8,74	100,00%	R$ 3.286,07	
3.29	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - SAPATAS - 80cm x 80cm x 30cm)	m3	12,28	R$ 375,98	R$ 4.617,03	-	0,00%	R$ -	12,28	100,00%	R$ 4.617,03	12,28	100,00%	R$ 4.617,03	
3.30	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURO - SAPATAS)	kg	132,04	R$ 6,90	R$ 911,08	-	0,00%	R$ -	132,04	100,00%	R$ 911,08	132,04	100,00%	R$ 911,08	
3.31	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de	kg	302,96	R$ 6,90	R$ 2.090,42	-	0,00%	R$ -	302,96	100,00%	R$ 2.090,42	302,96	100,00%	R$ 2.090,42	
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 105.868,09			R$ 0,00			R$ 105.868,07		100,00%	R$ 105.868,07	
4	SUPERESTRUTURA														
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (PILARES)	m2	459,20	R$ 28,53	R$ 13.100,98	-	0,00%	R$ -	459,20	100,00%	R$ 13.100,98	459,20	100,00%	R$ 13.100,98	
4.2	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (PILARES)	kg	1.730,55	R$ 6,90	R$ 11.940,80	-	0,00%	R$ -	1.730,55	100,00%	R$ 11.940,80	1.730,55	100,00%	R$ 11.940,80	

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
4.3	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (PILARES)	kg	628,91	R$ 6,64	R$ 4.175,96	-	0,00%	R$ -	628,91	100,00%	R$ 4.175,96	628,91	100,00%	R$ 4.175,96
4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (PILARES)	m3	25,19	R$ 375,98	R$ 9.470,94		0,00%	R$ -	25,19	100,00%	R$ 9.470,94	25,19	100,00%	R$ 9.470,94
4.5	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (VIGAS)	m2	714,44	R$ 28,53	R$ 20.382,97		0,00%	R$ -	714,44	100,00%	R$ 20.382,97	714,44	100,00%	R$ 20.382,97
4.6	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (VIGAS)	kg	1.152,73	R$ 6,90	R$ 7.953,84		0,00%	R$ -	1.152,73	100,00%	R$ 7.953,84	1.152,73	100,00%	R$ 7.953,84
4.7	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (VIGAS)	kg	581,18	R$ 6,64	R$ 3.859,04		0,00%	R$ -	581,18	100,00%	R$ 3.859,04	581,18	100,00%	R$ 3.859,04
4.8	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (VIGAS)	m3	41,19	R$ 375,98	R$ 15.486,62		0,00%	R$ -	41,19	100,00%	R$ 15.486,62	41,19	100,00%	R$ 15.486,62
4.9	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (MURETA - PILARES)	m2	17,29	R$ 28,53	R$ 493,28		0,00%	R$ -	17,29	100,00%	R$ 493,28	17,29	100,00%	R$ 493,28
4.10	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURETA - PILARES)	kg	48,82	R$ 6,90	R$ 336,86		0,00%	R$ -	48,82	100,00%	R$ 336,86	48,82	100,00%	R$ 336,86
4.11	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (MURETA - PILARES)	kg	20,36	R$ 6,64	R$ 135,19		0,00%	R$ -	20,36	100,00%	R$ 135,19	20,36	100,00%	R$ 135,19
4.12	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURETA - PILARES)	m3	0,80	R$ 375,98	R$ 300,78		0,00%	R$ -	0,80	100,00%	R$ 300,78	0,80	100,00%	R$ 300,78
4.13	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa (casa do gás/Lixo)	m2	6,38	R$ 65,92	R$ 420,57		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 420,57	6,38	100,00%	R$ 420,57
4.14	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento	m3	0,73	R$ 415,00	R$ 302,95		0,00%	R$ -	0,73	100,00%	R$ 302,95	0,73	100,00%	R$ 302,95
4.15	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (parede de concreto central gás)	m2	14,62	R$ 28,53	R$ 417,11		0,00%	R$ -	14,62	100,00%	R$ 417,11	14,62	100,00%	R$ 417,11
4.16	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x (MURO - PILAR)	m2	76,80	R$ 29,12	R$ 2.236,42		0,00%	R$ -	76,80	100,00%	R$ 2.236,42	76,80	100,00%	R$ 2.236,42
4.17	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURO - PILARES)	kg	199,68	R$ 6,90	R$ 1.377,79		0,00%	R$ -	199,68	100,00%	R$ 1.377,79	199,68	100,00%	R$ 1.377,79
4.18	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - PILARES), pilares a cada 3m	m3	3,45	R$ 375,98	R$ 1.297,13		0,00%	R$ -	3,45	100,00%	R$ 1.297,13	3,45	100,00%	R$ 1.297,13
4.19	Forma tabua para concreto em cinta superior c/ reaproveitamento 5x (MURO -	m2	116,52	R$ 29,12	R$ 3.393,06		0,00%	R$ -	116,52	100,00%	R$ 3.393,06	116,52	100,00%	R$ 3.393,06
4.20	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURO - VIGA SUPERIOR)	kg	302,96	R$ 6,90	R$ 2.090,42		0,00%	R$ -	302,96	100,00%	R$ 2.090,42	302,96	100,00%	R$ 2.090,42
4.21	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - CINTA SUPERIOR)	m3	5,24	R$ 375,98	R$ 1.970,14		0,00%	R$ -	5,24	100,00%	R$ 1.970,14	5,24	100,00%	R$ 1.970,14
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 101.142,84			R$ 0,00			R$ 101.142,85		100,00%	R$ 101.142,85
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)													
5.1	Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x40x40cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	5,14	R$ 91,58	R$ 470,72		0,00%	R$ -	5,14	100,00%	R$ 470,72	5,14	100,00%	R$ 470,72
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos cerâmicos de 08 furos de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	942,96	R$ 28,51	R$ 26.883,79		0,00%	R$ -	942,96	100,00%	R$ 26.883,79	942,96	100,00%	R$ 26.883,79
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 9x19x19cm, (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	17,07	R$ 56,71	R$ 968,04		0,00%	R$ -	17,07	100,00%	R$ 968,04	17,07	100,00%	R$ 968,04
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 9x14x19; assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	478,93	R$ 42,77	R$ 20.483,84		0,00%	R$ -	478,93	100,00%	R$ 20.483,84	478,93	100,00%	R$ 20.483,84
5.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico 5,7x9x19cm 1 vez (espessura 20cm) com argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	m	50,56	R$ 12,53	R$ 633,52		0,00%	R$ -	50,56	100,00%	R$ 633,52	50,56	100,00%	R$ 633,52

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA Nº 050366340-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UMID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
6.19	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, JA-03, 140x115 completa conforme projeto de esquadrias	m2	3,22	R$ 208,79	R$ 672,30		0,00%	R$ -	3,22	100,00%	R$ 672,30	3,22	100,00%	R$ 672,30
6.20	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m2	2,03	R$ 316,31	R$ 642,11	2,03	100,00%	R$ 642,11		0,00%	R$ -	2,03	100,00%	R$ 642,11
6.21	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m2	2,10	R$ 279,08	R$ 586,07	2,10	100,00%	R$ 586,07		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 586,07
6.22	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	2,10	R$ 336,02	R$ 705,64	2,10	100,00%	R$ 705,64		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 705,64
6.23	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	12,60	R$ 336,02	R$ 4.233,85	12,60	100,00%	R$ 4.233,85		0,00%	R$ -	12,60	100,00%	R$ 4.233,85
6.24	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	6,30	R$ 336,02	R$ 2.116,93	6,30	100,00%	R$ 2.116,93		0,00%	R$ -	6,30	100,00%	R$ 2.116,93
6.25	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	18,90	R$ 336,02	R$ 6.350,78	12,44	65,80%	R$ 4.178,51	6,46	34,20%	R$ 2.172,27	18,90	100,00%	R$ 6.350,78
6.26	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	2,10	R$ 336,02	R$ 705,64	2,10	100,00%	R$ 705,64		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 705,64
6.27	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	6,30	R$ 336,02	R$ 2.116,93	6,30	100,00%	R$ 2.116,93		0,00%	R$ -	6,30	100,00%	R$ 2.116,93
6.28	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	8,40	R$ 336,02	R$ 2.822,57	8,40	100,00%	R$ 2.822,57		0,00%	R$ -	8,40	100,00%	R$ 2.822,57
6.29	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	12,60	R$ 336,02	R$ 4.233,85	12,60	100,00%	R$ 4.233,85		0,00%	R$ -	12,60	100,00%	R$ 4.233,85
6.30	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	33,60	R$ 336,02	R$ 11.290,27	33,60	100,00%	R$ 11.290,27		0,00%	R$ -	33,60	100,00%	R$ 11.290,27
6.31	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	16,80	R$ 336,02	R$ 5.645,14	16,80	100,00%	R$ 5.645,14		0,00%	R$ -	16,80	100,00%	R$ 5.645,14
6.32	Tela de nylon de proteção com moldura em alumínio - fixada nas esquadrias - conforme projeto	m2	20,25	R$ 34,66	R$ 701,87		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.33	Vidro temperado incolor liso, espessura 6mm, fornecimento e instalação	m2	10,70	R$ 208,79	R$ 2.234,05		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.34	Vidro temperado incolor liso, espessura 10mm, fornecimento e instalação	m2	11,40	R$ 278,09	R$ 3.170,23		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.35	Espelho de cristal 4mm	m2	21,28	R$ 300,39	R$ 6.392,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.36	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m2	145,20	R$ 128,06	R$ 18.594,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.37	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branco Gelo, Beigo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios (Portões de entrada e Gradil) - PO e GR	m²	53,75	R$ 159,48	R$ 8.572,05		0,00%	R$ -	53,75	100,00%	R$ 8.572,05	53,75	100,00%	R$ 8.572,05
6.38	Fornecimento de cadeado 50mm	un	6,00	R$ 28,41	R$ 170,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 162.114,56			R$ 39.277,51			R$ 86.823,42		77,79%	R$ 126.100,93
7	COBERTURA													
7.1	Estrutura metálica em tesoura inclusive pintura prime e esmalte sintético branco	m²	1.426,85	R$ 58,92	R$ 84.070,00		0,00%	R$ -	1.426,85	100,00%	R$ 84.070,00	1.426,85	100,00%	R$ 84.070,00
7.2	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m2	1.283,33	R$ 109,82	R$ 140.935,30		0,00%	R$ -	1.283,33	100,00%	R$ 140.935,30	1.283,33	100,00%	R$ 140.935,30
7.3	Cumeeira metálica termoacústica trapezoidal	m	83,25	R$ 57,92	R$ 4.821,84		0,00%	R$ -	83,25	100,00%	R$ 4.821,84	83,25	100,00%	R$ 4.821,84
7.4	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	186,15	R$ 49,88	R$ 9.285,16		0,00%	R$ -	186,15	100,00%	R$ 9.285,16	186,15	100,00%	R$ 9.285,16
7.5	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	258,90	R$ 25,94	R$ 6.715,87		0,00%	R$ -	258,90	100,00%	R$ 6.715,87	258,90	100,00%	R$ 6.715,87
7.6	Pingadeira (Chapim) de concreto conforme projeto	m	258,20	R$ 26,15	R$ 6.751,93		0,00%	R$ -	258,20	100,00%	R$ 6.751,93	258,20	100,00%	R$ 6.751,93
	SUB-TOTAL ITEM				R$			R$ 0,00			R$ 252.580,10		100,00%	R$ 252.580,10

Álvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA								BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO					
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36		VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300		FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO				MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
8	IMPERMEABILIZAÇÃO													
8.1	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundações, blocos e baldrames, duas demaos	m2	707,67	R$ 8,32	R$ 5.887,81		0,00%	R$ -	707,67	100,00%	R$ 5.887,81	707,67	100,00%	R$ 5.887,81
8.2	Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes	m2	6,38	R$ 45,03	R$ 287,29		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 287,29	6,38	100,00%	R$ 287,29
8.3	Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica duas demãos para área do chuveiro infantil	m2	17,52	R$ 20,02	R$ 350,75		0,00%	R$ -	17,52	100,00%	R$ 350,75	17,52	100,00%	R$ 350,75
8.4	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm (laje da casa do gás/lixo)	m2	6,38	R$ 67,33	R$ 429,57		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 429,57	6,38	100,00%	R$ 429,57
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 6.955,42			R$ 0,00			R$ 6.955,42		100,00%	R$ 6.955,42
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS													
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibandas e calhas	m2	2.736,46	R$ 2,79	R$ 7.634,72		0,00%	R$ -	2.736,46	100,00%	R$ 7.634,72	2.736,46	100,00%	R$ 7.634,72
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	6,38	R$ 8,14	R$ 51,93		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 51,93	6,38	100,00%	R$ 51,93
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:8 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m2	2.826,43	R$ 21,96	R$ 62.068,40		0,00%	R$ -	2.826,43	100,00%	R$ 62.068,40	2.826,43	100,00%	R$ 62.068,40
9.4	Emboço paulista, para paredes, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	686,87	R$ 23,94	R$ 16.443,67		0,00%	R$ -	686,87	100,00%	R$ 16.443,67	686,87	100,00%	R$ 16.443,67
9.5	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m2	1.251,61	R$ 14,96	R$ 18.724,09		0,00%	R$ -	1.251,61	100,00%	R$ 18.724,09	1.251,61	100,00%	R$ 18.724,09
9.6	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	6,38	R$ 21,63	R$ 138,00		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 138,00	6,38	100,00%	R$ 138,00
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - branca	m2	629,61	R$ 40,00	R$ 25.184,40	535,43	85,04%	R$ 21.417,20	94,18	14,96%	R$ 3.767,20	629,61	100,00%	R$ 25.184,40
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - azul	m2	9,21	R$ 41,94	R$ 386,27	4,60	49,95%	R$ 192,92	4,61	50,05%	R$ 193,34	9,21	100,00%	R$ 386,27
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - vermelho	m2	7,49	R$ 41,94	R$ 314,13	3,75	50,07%	R$ 157,28	3,74	49,93%	R$ 156,86	7,49	100,00%	R$ 314,13
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - branco	m2	15,17	R$ 41,94	R$ 636,23	7,60	50,10%	R$ 318,74	7,57	49,90%	R$ 317,49	15,17	100,00%	R$ 636,23
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - amarelo	m2	136,50	R$ 41,94	R$ 5.724,81	120,20	88,06%	R$ 5.041,19	16,30	11,94%	R$ 683,62	136,50	100,00%	R$ 5.724,81
9.12	Faixa em madeira de lei aparelhada 10 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	191,30	R$ 19,33	R$ 3.697,83		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
9.13	Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e aplicação	m2	498,03	R$ 72,55	R$ 36.132,06	250,00	50,20%	R$ 18.137,50	168,03	33,74%	R$ 12.190,58	418,03	83,94%	R$ 30.328,08
9.14	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m2	738,27	R$ 82,68	R$ 61.040,16	139,95	18,96%	R$ 11.571,07	498,32	67,50%	R$ 41.201,10	638,27	86,45%	R$ 52.772,16
9.15	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibandas e calhas (MURO)	m2	776,84	R$ 2,79	R$ 2.167,38		0,00%	R$ -	776,84	100,00%	R$ 2.167,38	776,84	100,00%	R$ 2.167,38
9.16	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm (MURO)	m2	776,84	R$ 14,96	R$ 11.621,53		0,00%	R$ -	776,84	100,00%	R$ 11.621,53	776,84	100,00%	R$ 11.621,53
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 251.965,63			R$ 56.835,90			R$ 177.359,91		92,95%	R$ 234.195,80
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA													
10.1	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa (inclusive lona preta para impermeabilização)	m2	1.159,70	R$ 18,18	R$ 21.083,35		0,00%	R$ -	1.159,70	100,00%	R$ 21.083,35	1.159,70	100,00%	R$ 21.083,35
10.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de	m2	386,12	R$ 38,69	R$ 14.938,98	49,12	12,72%	R$ 1.900,45	337,00	87,28%	R$ 13.038,53	386,12	100,00%	R$ 14.938,98
10.3	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m2	226,97	R$ 28,18	R$ 6.396,01	11,35	5,00%	R$ 319,84	215,62	95,00%	R$ 6.076,17	226,97	100,00%	R$ 6.396,01

Alvaro Barreto Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
10.4	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m2	355,53	R$ 49,97	R$ 17.765,83	17,78	5,00%	R$ 888,47	337,75	95,00%	R$ 16.877,37	355,53	100,00%	R$ 17.765,83
10.5	Piso vinílico em manta e=2,0mm - conforme projeto	m2	394,33	R$ 75,53	R$ 29.783,74		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.6	Rodapé vinílico de aba curva h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	m	254,10	R$ 15,92	R$ 4.045,27		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.7	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, fornecimento e assentamento	m2	27,90	R$ 203,13	R$ 5.667,33		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.8	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, fornecimento e assentamento	m2	22,68	R$ 203,13	R$ 4.606,99		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.9	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	90,00	R$ 35,51	R$ 3.195,90	15,00	16,67%	R$ 532,65	75,00	83,33%	R$ 2.663,25	90,00	100,00%	R$ 3.195,90
10.10	Soleira em granito cinza andorinha, l = 30 cm, e = 2 cm	m	1,77	R$ 38,15	R$ 67,53		0,00%	R$ -	1,77	100,00%	R$ 67,53	1,77	100,00%	R$ 67,53
10.11	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação plástica a cada 1,20m, incluso lançamento e adensamento	m2	345,98	R$ 24,50	R$ 8.476,51		0,00%	R$ -	345,98	100,00%	R$ 8.476,51	345,98	100,00%	R$ 8.476,51
10.12	Rampa de acesso em concreto	m2	28,22	R$ 27,33	R$ 771,25	28,22	100,00%	R$ 771,25		0,00%	R$ -	28,22	100,00%	R$ 771,25
10.13	Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, fck 35mpa,	m2	67,22	R$ 53,10	R$ 3.569,38		0,00%	R$ -	60,22	89,59%	R$ 3.197,68	60,22	89,59%	R$ 3.197,68
10.14	Piso tátil de alerta 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	4,86	R$ 75,50	R$ 366,93		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.15	Piso tátil direcional 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	8,64	R$ 75,50	R$ 652,32		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.16	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	23,10	R$ 19,96	R$ 461,08		0,00%	R$ -	23,10	100,00%	R$ 461,08	23,10	100,00%	R$ 461,08
10.17	Fornecimento e instalação de grama sintética 12mm para playground	m2	76,77	R$ 46,19	R$ 3.546,01		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.18	Plantio de grama batatais em placas inclusive terra vegetal	m2	368,56	R$ 12,50	R$ 4.607,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.19	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar para degraus do chuveiros infantis	m	2,40	R$ 25,16	R$ 60,38		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 130.061,80			R$ 4.412,66			R$ 71.941,47		58,71%	R$ 76.354,12
11	PINTURA													
11.1	Emassamento com massa acrílica de paredes internas e externas, com aplicação de 02 demãos e lixamento	m2	1.251,61	R$ 8,94	R$ 11.189,39	963,87	77,01%	R$ 8.617,00	187,74	15,00%	R$ 1.678,40	1.151,61	92,01%	R$ 10.295,39
11.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas	m2	1.938,48	R$ 8,96	R$ 17.368,78		0,00%	R$ -	1.356,94	70,00%	R$ 12.158,18	1.356,94	70,00%	R$ 12.158,18
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto sobre forro de gesso acartonado	m2	498,03	R$ 5,14	R$ 2.559,87	200,00	40,16%	R$ 1.028,00		0,00%	R$ -	200,00	40,16%	R$ 1.028,00
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m2	107,10	R$ 19,54	R$ 2.092,73		0,00%	R$ -	107,10	100,00%	R$ 2.092,73	107,10	100,00%	R$ 2.092,73
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m2	19,13	R$ 19,64	R$ 375,71		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
11.6	Pintura epoxi, duas demaos nas paredes	m2	172,17	R$ 38,49	R$ 6.626,82		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
11.7	Pintura epoxi sobre piso em diversas cores 02 demãos	m2	58,70	R$ 38,49	R$ 2.259,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 42.472,68			R$ 9.645,00			R$ 15.929,31		60,21%	R$ 25.574,30
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA													
12.1	Engate flexível plástico 1/2 -30cm	un	45,00	R$ 5,83	R$ 262,35		0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 262,35	45,00	100,00%	R$ 262,35
12.2	Tubo de descarga VDE 38mm	un	26,00	R$ 18,95	R$ 492,70		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 492,70	26,00	100,00%	R$ 492,70
12.3	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	26,00	R$ 16,18	R$ 420,68		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 420,68	26,00	100,00%	R$ 420,68
12.4	Luva soldável com rosca 25mm	un	15,00	R$ 2,97	R$ 44,55		0,00%	R$ -	15,00	100,00%	R$ 44,55	15,00	100,00%	R$ 44,55
12.5	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 110mmx4" - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$ 233,78	R$ 935,12		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 935,12	4,00	100,00%	R$ 935,12
12.6	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 85mmx3" - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$ 168,83	R$ 675,32		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 675,32	4,00	100,00%	R$ 675,32
12.7	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 11,58	R$ 11,58		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 11,58	1,00	100,00%	R$ 11,58

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA					BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023				DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
12.50	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	R$ 45,62	R$ 228,10		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 228,10	5,00	100,00%	R$	228,10
12.51	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	R$ 86,63	R$ 433,15		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 433,15	5,00	100,00%	R$	433,15
12.52	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 86,63	R$ 173,26		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 173,26	2,00	100,00%	R$	173,26
12.53	Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	R$ 8,74	R$ 61,18		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 61,18	7,00	100,00%	R$	61,18
12.54	Joelho de redução 90° soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00	R$ 16,13	R$ 1.419,44		0,00%	R$ -	88,00	100,00%	R$ 1.419,44	88,00	100,00%	R$	1.419,44
12.55	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	R$ 7,48	R$ 104,72		0,00%	R$ -	14,00	100,00%	R$ 104,72	14,00	100,00%	R$	104,72
12.56	Tê de Redução 90° sodável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 7,80	R$ 156,00		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 156,00	20,00	100,00%	R$	156,00
12.57	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 5,84	R$ 17,52		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 17,52	3,00	100,00%	R$	17,52
12.58	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm	un	5,00	R$ 4,87	R$ 24,35		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 24,35	5,00	100,00%	R$	24,35
12.59	Tê soldavel com rosca bolsa central 20mm - 1/2"	un	1,00	R$ 5,84	R$ 5,84		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 5,84	1,00	100,00%	R$	5,84
12.60	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	R$ 11,35	R$ 417,45		0,00%	R$ -	36,78	100,00%	R$ 417,45	36,78	100,00%	R$	417,45
12.61	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	R$ 3,20	R$ 880,35		0,00%	R$ -	275,11	100,00%	R$ 880,35	275,11	100,00%	R$	880,35
12.62	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43	R$ 6,43	R$ 105,64		0,00%	R$ -	16,43	100,00%	R$ 105,64	16,43	100,00%	R$	105,64
12.63	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	R$ 11,43	R$ 1.323,25		0,00%	R$ -	115,77	100,00%	R$ 1.323,25	115,77	100,00%	R$	1.323,25
12.64	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	R$ 17,47	R$ 750,34		0,00%	R$ -	42,95	100,00%	R$ 750,34	42,95	100,00%	R$	750,34
12.65	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33	R$ 24,35	R$ 1.225,54		0,00%	R$ -	50,33	100,00%	R$ 1.225,54	50,33	100,00%	R$	1.225,54
12.66	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74	R$ 30,52	R$ 2.891,46		0,00%	R$ -	94,74	100,00%	R$ 2.891,46	94,74	100,00%	R$	2.891,46
12.67	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	R$ 70,10	R$ 3.252,64		0,00%	R$ -	46,40	100,00%	R$ 3.252,64	46,40	100,00%	R$	3.252,64
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 14,27	R$ 14,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 14,27	1,00	100,00%	R$	14,27
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 72,22	R$ 72,22		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 72,22	1,00	100,00%	R$	72,22
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 14,27	R$ 14,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 14,27	1,00	100,00%	R$	14,27
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	R$ 101,06	R$ 808,48		0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 808,48	8,00	100,00%	R$	808,48
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 243,54	R$ 487,08		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 487,08	2,00	100,00%	R$	487,08
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 421,56	R$ 843,12		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 843,12	2,00	100,00%	R$	843,12
12.74	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 39,59	R$ 79,18		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 79,18	2,00	100,00%	R$	79,18
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 704,20	R$ 1.408,40		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 1.408,40	2,00	100,00%	R$	1.408,40
12.76	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$ 97,72	R$ 97,72		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 97,72	1,00	100,00%	R$	97,72
12.77	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	5,00	R$ 143,97	R$ 719,85		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 719,85	5,00	100,00%	R$	719,85
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	R$ 79,68	R$ 2.470,08		0,00%	R$ -	31,00	100,00%	R$ 2.470,08	31,00	100,00%	R$	2.470,08
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	R$ 69,35	R$ 1.040,25		0,00%	R$ -	15,00	100,00%	R$ 1.040,25	15,00	100,00%	R$	1.040,25
12.80	Ligação predial individual de água, na parede, cavalete com registro esfera pvc sold. d=25mm, inclusive hidrômetro padrão DESO	un	1,00	R$ 173,13	R$ 173,13		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 173,13	1,00	100,00%	R$	173,13
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 32.689,80			R$ -			R$ 32.689,79		100,00%		R$ 32.689,79
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS														
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	R$ 18,74	R$ 4.446,44		0,00%	R$ -	237,27	100,00%	R$ 4.446,44	237,27	100,00%	R$	4.446,44
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	R$ 35,06	R$ 3.756,33		0,00%	R$ -	107,14	100,00%	R$ 3.756,33	107,14	100,00%	R$	3.756,33
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	R$ 21,03	R$ 1.093,56		0,00%	R$ -	52,00	100,00%	R$ 1.093,56	52,00	100,00%	R$	1.093,56
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00	R$ 14,03	R$ 364,78		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 364,78	26,00	100,00%	R$	364,78
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 15,71	R$ 62,84		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 62,84	4,00	100,00%	R$	62,84
13.6	Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 54,54	R$ 218,16		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 218,16	4,00	100,00%	R$	218,16
13.7	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	R$ 34,42	R$ 826,08		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 826,08	24,00	100,00%	R$	826,08

Ayrton Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 060366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA								BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO					
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36		VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300		FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO				MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
13.8	Caixa de concreto com tampa 80x80cm conforme projeto	un	20,00	R$ 73,45	R$ 1.469,00		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 1.469,00	20,00	100,00%	R$ 1.469,00
13.9	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, af_12/2014	un	6,00	R$ 43,95	R$ 263,70		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 263,70	6,00	100,00%	R$ 263,70
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 12.500,89			R$ -			R$ 12.500,89		100,00%	R$ 12.500,89
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA													
14.1	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	19,00	R$ 35,97	R$ 683,43		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 683,43	19,00	100,00%	R$ 683,43
14.2	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, af_12/2014_p	un	1,00	R$ 46,66	R$ 46,66		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 46,66	1,00	100,00%	R$ 46,66
14.3	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado	un	30,00	R$ 6,83	R$ 204,90		0,00%	R$ -	30,00	100,00%	R$ 204,90	30,00	100,00%	R$ 204,90
14.4	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	39,00	R$ 4,07	R$ 158,73		0,00%	R$ -	39,00	100,00%	R$ 158,73	39,00	100,00%	R$ 158,73
14.5	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	213,06	R$ 18,74	R$ 3.992,74		0,00%	R$ -	213,06	100,00%	R$ 3.992,74	213,06	100,00%	R$ 3.992,74
14.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	125,81	R$ 9,61	R$ 1.209,03		0,00%	R$ -	125,81	100,00%	R$ 1.209,03	125,81	100,00%	R$ 1.209,03
14.7	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	136,81	R$ 13,72	R$ 1.877,03		0,00%	R$ -	136,81	100,00%	R$ 1.877,03	136,81	100,00%	R$ 1.877,03
14.8	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	92,42	R$ 21,12	R$ 1.951,91		0,00%	R$ -	92,42	100,00%	R$ 1.951,91	92,42	100,00%	R$ 1.951,91
14.9	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	37,60	R$ 35,06	R$ 1.318,26		0,00%	R$ -	37,60	100,00%	R$ 1.318,26	37,60	100,00%	R$ 1.318,26
14.10	Caixa de gordura simples em concreto com tampa e puxador conforme projeto - CG 37cm	un	7,00	R$ 81,74	R$ 572,18		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 572,18	7,00	100,00%	R$ 572,18
14.11	Caixa de inspeção em concreto com tampa e puxador conforme projeto - 60 x 60 cm	un	17,00	R$ 310,78	R$ 5.283,26		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 5.283,26	17,00	100,00%	R$ 5.283,26
14.12	Caixa de passagem modulada em concreto DN 30cm com tampa e puxador conforme projeto	un	1,00	R$ 128,35	R$ 128,35		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
14.13	Fossa séptica em concretro armado conforme projeto 3,05mx2,70mx2,70m inclusive tampa de concreto armado, escavação e conexões conforme projeto	un	1,00	R$ 9.285,02	R$ 9.285,02		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 9.285,02	1,00	100,00%	R$ 9.285,02
14.14	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 3,05x2,70x2,80 m inclusive escavação, tampas, brita nº 4 e conexões conforme projeto	un	1,00	R$ 11.949,27	R$ 11.949,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 11.949,27	1,00	100,00%	R$ 11.949,27
14.15	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 2,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado, espessura 10cm inclusive escavação conforme projeto	un	1,00	R$ 3.139,54	R$ 3.139,54		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 3.139,54	1,00	100,00%	R$ 3.139,54
14.16	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	37,00	R$ 11,11	R$ 411,07		0,00%	R$ -	37,00	100,00%	R$ 411,07	37,00	100,00%	R$ 411,07
14.17	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário, af_12/2014_p	un	97,00	R$ 6,69	R$ 648,93		0,00%	R$ -	97,00	100,00%	R$ 648,93	97,00	100,00%	R$ 648,93
14.18	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	23,00	R$ 37,47	R$ 861,81		0,00%	R$ -	23,00	100,00%	R$ 861,81	23,00	100,00%	R$ 861,81
14.19	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	7,00	R$ 15,31	R$ 107,17		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 107,17	7,00	100,00%	R$ 107,17
14.20	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	4,00	R$ 13,75	R$ 55,00		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 55,00	4,00	100,00%	R$ 55,00
14.21	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	62,00	R$ 6,77	R$ 419,74		0,00%	R$ -	62,00	100,00%	R$ 419,74	62,00	100,00%	R$ 419,74
14.22	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	49,00	R$ 5,50	R$ 269,50		0,00%	R$ -	49,00	100,00%	R$ 269,50	49,00	100,00%	R$ 269,50
14.23	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	26,00	R$ 15,71	R$ 408,46		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 408,46	26,00	100,00%	R$ 408,46
14.24	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	35,00	R$ 11,43	R$ 400,05		0,00%	R$ -	35,00	100,00%	R$ 400,05	35,00	100,00%	R$ 400,05
14.25	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	3,00	R$ 6,34	R$ 19,02		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 19,02	3,00	100,00%	R$ 19,02
14.26	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19,00	R$ 5,33	R$ 101,27		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 101,27	19,00	100,00%	R$ 101,27
14.27	Joelho de 90° com anel, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	65,00	R$ 7,42	R$ 482,30		0,00%	R$ -	65,00	100,00%	R$ 482,30	65,00	100,00%	R$ 482,30

Alvaro Barreto Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil / Ag. 8308-9 / Conta: 707-2		PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
14.28	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	25,00	R$ 26,98	R$ 674,50		0,00%	R$ -	25,00	100,00%	R$ 674,50	25,00	100,00%	R$ 674,50
14.29	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2,00	R$ 30,82	R$ 61,64		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 61,64	2,00	100,00%	R$ 61,64
14.30	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	19,00	R$ 31,19	R$ 592,61		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 592,61	19,00	100,00%	R$ 592,61
14.31	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	5,00	R$ 20,37	R$ 101,85		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 101,85	5,00	100,00%	R$ 101,85
14.32	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	2,00	R$ 23,36	R$ 46,72		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 46,72	2,00	100,00%	R$ 46,72
14.33	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	6,00	R$ 11,76	R$ 70,56		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 70,56	6,00	100,00%	R$ 70,56
14.34	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	5,00	R$ 8,60	R$ 43,00		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 43,00	5,00	100,00%	R$ 43,00
14.35	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 7,81	R$ 7,81		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 7,81	1,00	100,00%	R$ 7,81
14.36	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19,00	R$ 7,81	R$ 148,39		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 148,39	19,00	100,00%	R$ 148,39
14.37	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	11,00	R$ 31,86	R$ 350,46		0,00%	R$ -	11,00	100,00%	R$ 350,46	11,00	100,00%	R$ 350,46
14.38	Tê redução 90 gr pvc rígido p/esgoto primário diâmetro 150x100mm	un	2,00	R$ 72,36	R$ 144,72		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 144,72	2,00	100,00%	R$ 144,72
14.39	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	19,00	R$ 14,76	R$ 280,44		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 280,44	19,00	100,00%	R$ 280,44
14.40	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	4,00	R$ 28,50	R$ 114,00		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 114,00	4,00	100,00%	R$ 114,00
14.41	Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	20,00	R$ 58,52	R$ 1.170,40		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 1.170,40	20,00	100,00%	R$ 1.170,40
SUB-TOTAL ITEM					R$ 49.791,74			R$ -			R$ 49.663,38		99,74%	R$ 49.663,38
15	LOUÇAS E METAIS													
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, inclusive asento com furo, acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 221,18	R$ 442,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente inclusive assento plástico e acessórios - fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 204,94	R$ 819,76		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.3	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	20,00	R$ 381,31	R$ 7.626,20		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.4	Valvula descarga 1.1/2" com registro, com duplo acionamento, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	26,00	R$ 224,14	R$ 5.827,64		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.5	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	26,00	R$ 63,71	R$ 1.656,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.6	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00	R$ 163,98	R$ 655,92		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.7	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	un	4,00	R$ 325,71	R$ 1.302,84		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.8	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	un	6,00	R$ 91,24	R$ 547,44		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.9	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira	un	22,00	R$ 103,87	R$ 2.285,14		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.10	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 125,40	R$		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC: 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07		R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07		R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
18.65	Suporte vertical 120 x 146 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	4,40	R$ 9,53	R$ 41,93		0,00%	R$ -	4,40	100,00%	R$ 41,93	4,40	100,00%	R$ 41,93
18.66	Suporte vertical 120 x 160 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	3,00	R$ 9,53	R$ 28,59		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 28,59	3,00	100,00%	R$ 28,59
18.67	Suporte vertical 70 x 125 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	6,00	R$ 9,53	R$ 57,18		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 57,18	6,00	100,00%	R$ 57,18
18.68	Suporte vertical 70 x 81 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	18,00	R$ 9,53	R$ 171,54		0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 171,54	18,00	100,00%	R$ 171,54
18.69	Suporte vertical 70 x 96 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	R$ 9,53	R$ 209,66		0,00%	R$ -	22,00	100,00%	R$ 209,66	22,00	100,00%	R$ 209,66
18.70	Suporte vertical 95 x 114 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	19,00	R$ 9,53	R$ 181,07		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 181,07	19,00	100,00%	R$ 181,07
18.71	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	38,00	R$ 5,92	R$ 224,96		0,00%	R$ -	38,00	100,00%	R$ 224,96	38,00	100,00%	R$ 224,96
18.72	Tala plana perfurada 75mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	6,00	R$ 6,70	R$ 40,20		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 40,20	6,00	100,00%	R$ 40,20
18.73	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	R$ 6,70	R$ 26,80		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 26,80	4,00	100,00%	R$ 26,80
18.74	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - cor branca - fornecimento e instalacao	un	137,00	R$ 12,41	R$ 1.700,17		0,00%	R$ -	137,00	100,00%	R$ 1.700,17	137,00	100,00%	R$ 1.700,17
18.75	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - cor branca - fornecimento e instalacao	un	18,00	R$ 21,39	R$ 385,02		0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 385,02	18,00	100,00%	R$ 385,02
18.76	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00	R$ 12,20	R$ 24,40		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 24,40	2,00	100,00%	R$ 24,40
18.77	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	36,00	R$ 22,57	R$ 812,52		0,00%	R$ -	36,00	100,00%	R$ 812,52	36,00	100,00%	R$ 812,52
18.78	Interruptor 1 tecla simples	un	56,00	R$ 10,18	R$ 570,08		0,00%	R$ -	56,00	100,00%	R$ 570,08	56,00	100,00%	R$ 570,08
18.79	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	R$ 19,56	R$ 117,36		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 117,36	6,00	100,00%	R$ 117,36
18.80	Luminária calha sobrepor com proteção p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	8,00	R$ 72,99	R$ 583,92		0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 583,92	8,00	100,00%	R$ 583,92
18.81	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	17,00	R$ 147,30	R$ 2.504,10		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.504,10	17,00	100,00%	R$ 2.504,10
18.82	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	143,00	R$ 180,35	R$ 25.790,05		0,00%	R$ -	143,00	100,00%	R$ 25.790,05	143,00	100,00%	R$ 25.790,05
18.83	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	R$ 372,26	R$ 3.350,34		0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 3.350,34	9,00	100,00%	R$ 3.350,34
18.84	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	R$ 185,42	R$ 741,68		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 741,68	4,00	100,00%	R$ 741,68
18.85	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	R$ 214,03	R$ 214,03		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 214,03	1,00	100,00%	R$ 214,03
18.86	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	R$ 51,91	R$ 934,38		0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 934,38	18,00	100,00%	R$ 934,38
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 179.446,74			R$ -			R$ 165.422,59		92,18%	R$ 165.422,59
19	SUBESTAÇÃO 75KVA/220V													
19.1	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4 awg	un	3,00	R$ 13,06	R$ 39,18		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.2	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	40,00	R$ 0,50	R$ 20,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.3	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	R$ 31,42	R$ 31,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.4	Cabo de aluminio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento	kg	6,00	R$ 22,67	R$ 136,02		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.5	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 95mm², 1kv / 90° C	m	30,00	R$ 53,38	R$ 1.601,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 50mm², 1kv / 90° C	m	10,00	R$ 30,94	R$ 309,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.7	Cordoalha de cobre nu 50,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	20,00	R$ 30,45	R$ 609,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.8	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	R$ 681,30	R$ 681,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.9	Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm	un	3,00	R$ 7,01	R$ 21,03		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.10	Quadro de medição indireta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente padrão Sulgipe	un	1,00	R$ 662,31	R$ 662,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.11	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	Un	1,00	R$ 47,86	R$ 47,86		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.12	Eletroduto pvc roscavel, d=4 " - inclusive conexões	M	6,00	R$ 30,71	R$ 184,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Álvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9 / Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023				DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
21.12	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.268,50	R$ 6,66	R$ 8.448,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.13	Cabo coaxial	m	341,00	R$ 4,15	R$ 1.415,15		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.14	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	m	78,40	R$ 6,66	R$ 522,14		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.15	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	28,00	R$ 21,06	R$ 589,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.16	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	14,00	R$ 21,50	R$ 301,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.17	Central PABX 24 portas	un	1,00	R$ 5.202,38	R$ 5.202,38		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.18	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	4,00	R$ 128,18	R$ 512,72		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 512,72	4,00	100,00%	R$	512,72
21.19	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	R$ 6,11	R$ 250,51		0,00%	R$ -	41,00	100,00%	R$ 250,51	41,00	100,00%	R$	250,51
21.20	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	1,30	R$ 6,05	R$ 7,87		0,00%	R$ -	1,30	100,00%	R$ 7,87	1,30	100,00%	R$	7,87
21.21	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	119,30	R$ 4,76	R$ 567,87		0,00%	R$ -	119,30	100,00%	R$ 567,87	119,30	100,00%	R$	567,87
21.22	Eletroduto flexivel aco galvanizado d = 1" (25mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	50,40	R$ 9,89	R$ 498,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.23	Eletroduto flexivel aco galvanizado d = 1 1/4" (32mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	4,10	R$ 12,71	R$ 52,11		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.24	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 50mm (2"), tipo semi-pesado, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	22,00	R$ 42,45	R$ 933,90		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
21.25	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	77,74	R$ 20,00	R$ 1.554,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 42.982,83			R$ -			R$ 1.338,97		3,12%		R$ 1.338,97
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA														
22.1	Coifa em aço inox escovado AISI 304, tipo encostada, com filtros inercias, descarga vertical superior com diam=30cm, Exaustor, duto, chapeu chines, filtro, dimensões: Larg=1500 x Prof=1000 x alt=600mm	un	1,00	R$ 5.896,99	R$ 5.896,99		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
22.2	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	un	2,00	R$ 372,74	R$ 745,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 6.642,47			R$ -			R$ 0,00		0,00%		R$ 0,00
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)														
23.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	R$ 45,46	R$ 136,38		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 136,38	3,00	100,00%	R$	136,38
23.2	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, para pilares e malha enterrada	un	33,00	R$ 42,58	R$ 1.405,14		0,00%	R$ -	33,00	100,00%	R$ 1.405,14	33,00	100,00%	R$	1.405,14
23.3	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	48,00	R$ 1,81	R$ 86,88		0,00%	R$ -	48,00	100,00%	R$ 86,88	48,00	100,00%	R$	86,88
23.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	Un	24,00	R$ 5,14	R$ 123,36		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 123,36	24,00	100,00%	R$	123,36
23.5	Presilha em latão	un	24,00	R$ 0,99	R$ 23,76		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 23,76	24,00	100,00%	R$	23,76
23.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	R$ 228,17	R$ 228,17		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 228,17	1,00	100,00%	R$	228,17
23.7	Escavação e reaterro de vala para aterramento	m3	39,00	R$ 4,52	R$ 176,28		0,00%	R$ -	39,00	100,00%	R$ 176,28	39,00	100,00%	R$	176,28
23.8	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	5,00	R$ 10,98	R$ 54,90		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 54,90	5,00	100,00%	R$	54,90
23.9	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	330,00	R$ 21,51	R$ 7.098,30		0,00%	R$ -	330,00	100,00%	R$ 7.098,30	330,00	100,00%	R$	7.098,30
23.10	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	260,00	R$ 30,45	R$ 7.917,00		0,00%	R$ -	260,00	100,00%	R$ 7.917,00	260,00	100,00%	R$	7.917,00
23.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido conforme detalhe do projeto	un	4,00	R$ 83,22	R$ 332,88		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 332,88	4,00	100,00%	R$	332,88
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 17.583,05			R$ -			R$ 17.583,05		100,00%		R$ 17.583,05

Alvaro Barreto Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO		15/08/2015	FIM CONVÊNIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA		R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023				DATA INICIO DA OBRA:		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
24.1	Base para fixação de mastro tripio	un	1,00	R$ 495,76	R$ 495,76		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
24.2	Mastro simples em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") inclusive pintura conforme projeto	un	1,00	R$ 2.001,73	R$ 2.001,73		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
24.3	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm conforme projeto	m2	48,53	R$ 183,52	R$ 8.906,23		0,00%	R$ -	48,53	100,00%	R$ 8.906,23	48,53	100,00%	R$ 8.906,23
24.4	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm inclusive mão francesa conforme projeto	m2	56,26	R$ 279,11	R$ 15.702,73		0,00%	R$ -	56,26	100,00%	R$ 15.702,73	56,26	100,00%	R$ 15.702,73
24.5	Prateleira e escaninhos em MDF inclusive acessórios conforme projeto	m2	48,02	R$ 77,56	R$ 3.724,43		0,00%	R$ -	48,02	100,00%	R$ 3.724,43	48,02	100,00%	R$ 3.724,43
24.6	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto polido, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	17,00	R$ 120,04	R$ 2.040,68		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.040,68	17,00	100,00%	R$ 2.040,68
24.7	Banco e acabamento em granito	m	8,10	R$ 176,00	R$ 1.425,60		0,00%	R$ -	8,10	100,00%	R$ 1.425,60	8,10	100,00%	R$ 1.425,60
24.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, espessura variável e pingadeira	m	106,80	R$ 45,16	R$ 4.823,09		0,00%	R$ -	106,80	100,00%	R$ 4.823,09	106,80	100,00%	R$ 4.823,09
24.9	Letra de aco inox no22 alt=20cm fornecimento e colocacao (Fachada)	un	37,00	R$ 73,33	R$ 2.713,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 41.833,45			R$ -			R$ 36.622,76		87,54%	R$ 36.622,76
25	CASTELO D'ÁGUA - 30.000L													
25.1	Alça de Içamento	un	2,00	R$ 13,06	R$ 26,12		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 26,12	2,00	100,00%	R$ 26,12
25.2	Suporte de Luz Piloto	un	1,00	R$ 18,06	R$ 18,06		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 18,06	1,00	100,00%	R$ 18,06
25.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	R$ 18,06	R$ 18,06		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 18,06	1,00	100,00%	R$ 18,06
25.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	R$ 18,06	R$ 18,06		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 18,06	1,00	100,00%	R$ 18,06
25.5	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao e esmalte sintético	m	9,00	R$ 53,16	R$ 478,44		0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 478,44	9,00	100,00%	R$ 478,44
25.6	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	kg	1.702,30	R$ 16,13	R$ 27.458,10		0,00%	R$ -	1.702,30	100,00%	R$ 27.458,10	1.702,30	100,00%	R$ 27.458,10
25.7	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	6,00	R$ 330,28	R$ 1.981,68		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 1.981,68	6,00	100,00%	R$ 1.981,68
25.8	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3	m2	145,79	R$ 15,00	R$ 2.186,85		0,00%	R$ -	145,79	100,00%	R$ 2.186,85	145,79	100,00%	R$ 2.186,85
25.9	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m2	69,08	R$ 41,42	R$ 2.861,29		0,00%	R$ -	69,08	100,00%	R$ 2.861,29	69,08	100,00%	R$ 2.861,29
25.10	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m2	69,08	R$ 41,42	R$ 2.861,29		0,00%	R$ -	69,08	100,00%	R$ 2.861,29	69,08	100,00%	R$ 2.861,29
25.11	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m2	69,08	R$ 14,57	R$ 1.006,50		0,00%	R$ -	69,08	100,00%	R$ 1.006,50	69,08	100,00%	R$ 1.006,50
25.12	Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 3/4" - 1m de altura	m	6,97	R$ 100,59	R$ 701,11		0,00%	R$ -	6,97	100,00%	R$ 701,11	6,97	100,00%	R$ 701,11
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 39.615,56			R$ -			R$ 39.615,56		100,00%	R$ 39.615,56
26	ACESSOS													
26.1	Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, fck 35mpa, assentados sobre colchao de areia.	m2	246,70	R$ 53,10	R$ 13.099,77		0,00%	R$ -	246,70	100,00%	R$ 13.099,77	246,70	100,00%	R$ 13.099,77
26.2	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (CALÇADA)	m	42,45	R$ 19,96	R$ 847,30		0,00%	R$ -	42,45	100,00%	R$ 847,30	42,45	100,00%	R$ 847,30
26.3	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação plástica, incluso lançamento e adensamento	m2	63,67	R$ 24,50	R$ 1.559,92		0,00%	R$ -	63,67	100,00%	R$ 1.559,92	63,67	100,00%	R$ 1.559,92
26.4	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	R$ 215,84	R$ 215,84		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 215,84	1,00	100,00%	R$ 215,84
26.5	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (CANTEIRO)	m	45,00	R$ 19,96	R$ 898,20		0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 898,20	45,00	100,00%	R$ 898,20
26.6	Plantio de grama batatais em placas inclusive terra vegetal	m2	37,50	R$ 12,50	R$ 468,75		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
26.7	Piso tátil direcional 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	14,58	R$ 75,50	R$ 1.100,79		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO		15/08/2015	FIM CONVÊNIO						
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE	001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023		
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE	VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18		
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23			
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023		DATA INICIO DA OBRA:		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA			
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL			
		MEDIÇÃO ATUAL			R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07			
		INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$ -			
		VALOR MEDIDO NO PERÍODO			R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07			

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
26.8	Piso tátil de alerta 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	1,62	R$ 75,50	R$ 122,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 18.312,88			R$ -			R$ 16.621,03		90,76%	R$ 16.621,03
27	SERVIÇOS FINAIS													
27.1	Placa inauguracao em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocacao	un	1,00	R$ 479,55	R$ 479,55		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
27.2	Limpeza final da obra	m2	1.513,16	R$ 1,97	R$ 2.980,93		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 3.460,48			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
	ADITIVOS													
A1	INDICE DE REAJUSTE SOBRE SALDO DO CONTRATO				VALOR REAJUSTADO	SALDO DO REAJUSTE		VALOR MEDIDO						
A1.1	VALOR MEDIDO SOBRE INDICE DA MEDIÇÃO ATUAL	%	23.10				#VALOR!	R$ -		#VALOR!	R$ -	-	#VALOR!	R$ -
A1.2								R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A1.3								R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ -	-		R$ -			R$ -		#DIV/0!	R$ -
A2	ADITIVOS 2													
A2.1					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A2.2					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A2.3					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A2.4					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ -			R$ -			R$ -		#DIV/0!	R$ -
	RESUMO													
	VALOR DO CONTRATO ORIGINAL				R$ 1.716.378,07	6,42%		R$ 110.171,07		76,62%	R$ 1.315.123,85		83,04%	R$ 1.425.294,89
	TOTAL DE ADITIVOS				R$ -	#DIV/0!		R$ 0,00		#DIV/0!	R$ 0,00		#DIV/0!	R$ 0,00
	TOTAL GERAL DA OBRA:				R$ 1.716.378,07	6,42%		R$ 110.171,07		76,62%	R$ 1.315.123,85		83,04%	R$ 1.425.294,89

Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados

Atesto que os serviços foram executados e aceitos

Data: segunda-feira, 5 de junho de 2023

Medição aprovada para liberação

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366240

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL

(BM-16) : ITEM 14.17 FOI MEDIDO 33 UNIDADES A MAIS, TOTALIZANDO 134,02% R$ 220,77, ITEM 14.35 FOI MEDIDO 01 UNIDADE A MAIS, TOTALIZANDO 200% R$ 7,81. **TOTALIZANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 228,58 a menos que a medição**

(BM-17): Item 9.1 possuia acumulado de 2706,46 m², porém no BM-17 se equivocaram ao registrar como 2639,61 m² e medindo 96,85, sendo necessário somente 30 m² para concluir os 100% do item. Esse erro resultou em **R$ 186,51.a menos que a medição**

(BM-19): Item 9.5 possuia acumulado de 605,60 m², porém no bm-19 se equivocaram ao registrar como 475,80 m² e medindo 700, sendo necessário somente 646,01 m² para concluir os 100% do item. Esse erro resultou em **R$ 807,69.a menos que a medição**

(BM-20): Item 9.5 possuia acumulado de 1251,61 m², sendo 100% do item concluído, porém no BM-20 se equivocaram ao medirem mais 75,81 m². Esse erro resultou em **R$ 1134,12.a menos que a medição**

(BM-21): Item 14.16 possuia acumulado de 15 unidades, sendo necessário 22 unidades para 100% do item concluído, porém no BM-21 se equivocaram ao medirem mais 37 unidades. Esse erro resultou em R$ 166,65. No Item 14.17 possuia acumulado de 97 unidades com 100% do item concluído, porém no BM-21 se equivocaram ao medirem mais 17 unidades. Esse erro resultou em R$ 113,73. Dessa forma, resultou em **R$ 280,38 a menos que a medição**

(BM-23): possui algum somatorio que não foi encontrado, resultando no erro de **R$ 8,37 a menos que a medição**

(BM-24): possui algum somatorio que não foi encontrado, resultando no erro de **R$ 5,49 a mais que a medição**

(BM-26): Foi medido de forma equivocada novamente os itens 14.13 a 14.14, pois os mesmo já foram medidos no BM-20 e BM-22 respectivamente. **Esse erro resultou no total de R$ 21.234,29**

Dessa forma, o acumulativo dos BM anteriores resultou em um acumulado no valor de R$ 23.874,45, o qual foi corrigido nesse BM-27 lançando no acumulado anterior serviços já executado e não medido anteriomente. (o valor acumulado anterior de acordo com os comprovantes de pagamento é de R$ 1.315.123,85

Responsável Técnico pela Execução	Responsável Técnico pela Fiscalização	Prefeito Municipal de Cristinápolis
Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA BA Nº050366840-0	Prefeitura Municipal de Cristinápolis Praça da Bandeira, 81 - Centro - Cristinápolis - SE - CEP 49270-000 - Fone: (0xx79)3542-1265 / 1270 www.cristinapolis.se.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA					BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023				DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
15.11	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	R$ 281,36	R$ 4.220,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.12	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	R$ 119,66	R$ 3.111,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.13	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	R$ 49,07	R$ 1.079,54		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.14	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2"	un	8,00	R$ 109,07	R$ 872,56		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.15	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido Celite ou equivalente	un	4,00	R$ 109,07	R$ 436,28		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.16	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC em aço inox	un	1,00	R$ 181,24	R$ 181,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.17	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos d=1 1/4"	m	6,20	R$ 77,41	R$ 479,94		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.18	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00	R$ 376,20	R$ 1.504,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.19	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	R$ 187,63	R$ 375,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.20	Ducha Elétrica com desviador e mangueira 4.000W	un	4,00	R$ 451,26	R$ 1.805,04		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.21	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00	R$ 101,14	R$ 1.517,10		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.22	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	R$ 87,85	R$ 1.317,75		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.23	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	R$ 11,92	R$ 131,12		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.24	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00	R$ 43,91	R$ 1.405,12		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.25	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	R$ 60,95	R$ 914,25		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.26	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	R$ 350,03	R$ 2.450,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.27	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar (banheiros e ganchos para mochilas)	un	188,00	R$ 28,47	R$ 5.352,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.28	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2" para barra de apoio nas área dos chuveiros infantil e fraudário	m	6,92	R$ 85,88	R$ 594,29		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.29	Banco articulado para banho em aço inox com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	1,00	R$ 437,57	R$ 437,57		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.30	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") na entrada da cheche	m	7,00	R$ 140,39	R$ 982,73		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 50.708,68			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL													
16.1	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m2	0,16	R$ 345,62	R$ 55,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.2	Tubo de aço galvanizado 3/4" (20mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	43,00	R$ 22,08	R$ 949,44		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.3	Envelopamento de concreto - 3cm	m3	1,26	R$ 375,98	R$ 473,73		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.4	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00	R$ 13,30	R$ 39,90		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.5	Válvula de esfera 3/4" NPT 300	un	4,00	R$ 21,40	R$ 85,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.6	União 3/4" NPT 300	un	3,00	R$ 11,24	R$ 33,72		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.7	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	R$ 11,11	R$ 66,66		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.8	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	R$ 9,42	R$ 37,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.9	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	R$ 9,42	R$		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Álvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM CristinÁpolis - PAC1 ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
16.10	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	R$ 11,17	R$ 11,17		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.11	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	R$ 11,17	R$ 11,17		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.12	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	R$ 9,53	R$ 19,06		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.13	Luva de redução 1/4 x 1/2"	un	2,00	R$ 9,53	R$ 19,06		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.14	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	R$ 7,59	R$ 15,18		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.15	Regulador 1º estagio com manômetro	un	1,00	R$ 203,70	R$ 203,70		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.16	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	R$ 96,92	R$ 96,92		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.17	Mangueira Flexivel	m	2,00	R$ 18,67	R$ 37,34		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.18	Regulador 2º estagio com manômetro	un	2,00	R$ 203,70	R$ 407,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.19	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	Un	1,00	R$ 12,36	R$ 12,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	Un	1,00	R$ 12,36	R$ 12,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 2.625,43			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO													
17.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	R$ 150,34	R$ 1.052,38		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	1,00	R$ 448,99	R$ 448,99		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.3	Cotovelo de 45° em aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento, instalação e pintura	un	2,00	R$ 37,40	R$ 74,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.4	Cotovelo de 90° em aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento, instalação e pintura	un	7,00	R$ 37,40	R$ 261,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.5	Tubo de aço carbono 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes - fornecimento, instalacao e pintura	m	1,25	R$ 136,12	R$ 170,15		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" inclusive pintura	un	10,00	R$ 42,08	R$ 420,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.7	Te de aco galvanizado 2.1/2" - fornecimento, instalacao e pintura	un	4,00	R$ 91,61	R$ 366,44		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.8	Tubo de aço galvanizado 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes e pintura - fornecimento e instalacao	m	65,27	R$ 136,12	R$ 8.884,55		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.9	Caixa de incêndio metálica dimensões 0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2" l=15.00 m e esguicho	un	2,00	R$ 1.109,14	R$ 2.218,28		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.10	Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2"	un	3,00	R$ 42,08	R$ 126,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.11	Registro globo 2 1/2" 45°	un	3,00	R$ 183,20	R$ 549,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.12	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	3,00	R$ 218,15	R$ 654,45		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.13	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	R$ 243,54	R$ 1.217,70		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.14	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	R$ 104,91	R$ 209,82		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.15	União de ferro conimo macho-femea	un	4,00	R$ 43,55	R$ 174,20		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.16	Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	un	40,00	R$ 34,12	R$ 1.364,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.17	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (marcação no piso 1m x 1m para extintor)	m2	8,00	R$ 18,77	R$ 150,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.18	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro (marcação no piso 1m x 1m para hidrante)	m2	3,00	R$ 18,77	R$ 56,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.19	Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV completo inclusive acessórios conforme projeto	un	2,00	R$ 1.356,63	R$ 2.713,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.20	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio	Un	2,00	R$ 12,36	R$ 24,72		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.21	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	Un	15,00	R$ 12,36	R$ 185,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.22	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	Un	3,00	R$ 12,36	R$ 37,08		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.23	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	Un	8,00	R$ 12,36	R$ 98,88		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.24	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m no passeio	un	1,00	R$ 279,13	R$ 279,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
17.25	Tampa de ferro fundido 50X50cm para caixa de incêndio de passeio	un	1,00	R$ 232,96	R$ 232,96		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.26	Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 121,45	R$ 121,45		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 22.094,35			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
18.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	5,00	R$ 402,12	R$ 2.010,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	R$ 595,59	R$ 595,59		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	R$ 950,96	R$ 1.901,92		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.4	Disjuntos unipolar termomagnético 10A	un	27,00	R$ 11,79	R$ 318,33		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.5	Disjuntos unipolar termomagnético 16A	un	18,00	R$ 11,79	R$ 212,22		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.6	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	un	2,00	R$ 11,79	R$ 23,58		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.7	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	un	2,00	R$ 11,79	R$ 23,58		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.8	Disjuntos unipolar termomagnético 40A	un	15,00	R$ 18,44	R$ 276,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.9	Disjuntos unipolar termomagnético 50A	un	7,00	R$ 18,44	R$ 129,08		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.10	Disjuntos unipolar termomagnético 63A	un	1,00	R$ 104,13	R$ 104,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.11	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	12,00	R$ 11,79	R$ 141,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.12	Disjuntor unipolar termomagnético 80A	un	1,00	R$ 55,16	R$ 55,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.13	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	un	3,00	R$ 55,16	R$ 165,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.14	Disjuntor bipolar termomagnético 63A	un	3,00	R$ 104,13	R$ 312,39		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.15	Disjuntor bipolar termomagnético 100A	un	1,00	R$ 104,13	R$ 104,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.16	Disjuntor bipolar termomagnético 80A	un	1,00	R$ 104,13	R$ 104,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.17	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	R$ 77,21	R$ 77,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.18	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	1,00	R$ 77,21	R$ 77,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.19	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	un	2,00	R$ 18,44	R$ 36,88		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.20	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00	R$ 104,13	R$ 833,04		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.21	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	R$ 301,42	R$ 301,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.22	Disjuntor tripolar termomagnético 300A	un	1,00	R$ 784,67	R$ 784,67		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.23	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	R$ 203,56	R$ 610,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.24	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	R$ 130,66	R$ 391,98		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.25	Interruptor bipolar DR -63A	un	1,00	R$ 301,62	R$ 301,62		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.26	Interruptor bipolar DR -80A	un	1,00	R$ 301,62	R$ 301,62		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.27	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	28,00	R$ 107,82	R$ 3.018,96		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.28	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	R$ 101,31	R$ 810,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
18.29	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 16mm (1/2") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	2,00	R$ 3,91	R$ 7,82		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 7,82	2,00	100,00%	R$ 7,82
18.30	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	725,70	R$ 4,76	R$ 3.454,33		0,00%	R$ -	725,70	100,00%	R$ 3.454,33	725,70	100,00%	R$ 3.454,33
18.31	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	461,30	R$ 6,05	R$ 2.790,87		0,00%	R$ -	461,30	100,00%	R$ 2.790,87	461,30	100,00%	R$ 2.790,87
18.32	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/2") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	68,60	R$ 8,32	R$ 570,75		0,00%	R$ -	68,60	100,00%	R$ 570,75	68,60	100,00%	R$ 570,75
18.33	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	2,30	R$ 21,57	R$ 49,61		0,00%	R$ -	2,30	100,00%	R$ 49,61	2,30	100,00%	R$ 49,61

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023				DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
18.34	Eletroduto flexível aco galvanizado d = 1" (25mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	176,00	R$ 9,89	R$ 1.740,64		0,00%	R$ -	176,00	100,00%	R$ 1.740,64	176,00	100,00%	R$ 1.740,64
18.35	Eletroduto flexível aco galvanizado d = 1 1/4" (32mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	80,60	R$ 12,71	R$ 1.024,43		0,00%	R$ -	80,60	100,00%	R$ 1.024,43	80,60	100,00%	R$ 1.024,43
18.36	Eletroduto flexível aco galv tipo conduite d = 1 1/2" (40mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	5,20	R$ 14,35	R$ 74,62		0,00%	R$ -	5,20	100,00%	R$ 74,62	5,20	100,00%	R$ 74,62
18.37	Eletroduto flexível aco galv tipo conduite d = 2" (50mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	14,70	R$ 19,49	R$ 286,50		0,00%	R$ -	14,70	100,00%	R$ 286,50	14,70	100,00%	R$ 286,50
18.38	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 62mm (2 1/2"), tipo semi-pesado, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	3,50	R$ 58,91	R$ 206,19		0,00%	R$ -	3,50	100,00%	R$ 206,19	3,50	100,00%	R$ 206,19
18.39	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 75mm (3"), tipo semi-pesado, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	21,90	R$ 70,32	R$ 1.540,01		0,00%	R$ -	21,90	100,00%	R$ 1.540,01	21,90	100,00%	R$ 1.540,01
18.40	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	205,00	R$ 9,26	R$ 1.898,30		0,00%	R$ -	205,00	100,00%	R$ 1.898,30	205,00	100,00%	R$ 1.898,30
18.41	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao	un	10,00	R$ 7,19	R$ 71,90		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 71,90	10,00	100,00%	R$ 71,90
18.42	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	262,00	R$ 6,11	R$ 1.600,82		0,00%	R$ -	262,00	100,00%	R$ 1.600,82	262,00	100,00%	R$ 1.600,82
18.43	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	R$ 128,18	R$ 2.179,06		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.179,06	17,00	100,00%	R$ 2.179,06
18.44	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	R$ 136,95	R$ 2.328,15		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.328,15	17,00	100,00%	R$ 2.328,15
18.45	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00	R$ 38,82	R$ 77,64		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 77,64	2,00	100,00%	R$ 77,64
18.46	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	M	5.146,90	R$ 1,68	R$ 8.646,79		0,00%	R$ -	5.146,90	100,00%	R$ 8.646,79	5.146,90	100,00%	R$ 8.646,79
18.47	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimentoe instalacao	m	1.012,30	R$ 4,18	R$ 4.231,41		0,00%	R$ -	1.012,30	100,00%	R$ 4.231,41	1.012,30	100,00%	R$ 4.231,41
18.48	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimentoe instalacao	m	2.001,80	R$ 5,65	R$ 11.310,17		0,00%	R$ -	2.001,80	100,00%	R$ 11.310,17	2.001,80	100,00%	R$ 11.310,17
18.49	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	410,40	R$ 8,68	R$ 3.562,27		0,00%	R$ -	410,40	100,00%	R$ 3.562,27	410,40	100,00%	R$ 3.562,27
18.50	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	906,30	R$ 9,98	R$ 9.044,87		0,00%	R$ -	906,30	100,00%	R$ 9.044,87	906,30	100,00%	R$ 9.044,87
18.51	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.070,70	R$ 14,44	R$ 29.900,91		0,00%	R$ -	2.070,70	100,00%	R$ 29.900,91	2.070,70	100,00%	R$ 29.900,91
18.52	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	235,90	R$ 19,64	R$ 4.633,08		0,00%	R$ -	235,90	100,00%	R$ 4.633,08	235,90	100,00%	R$ 4.633,08
18.53	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	157,60	R$ 26,44	R$ 4.166,94		0,00%	R$ -	157,60	100,00%	R$ 4.166,94	157,60	100,00%	R$ 4.166,94
18.54	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 70mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	174,70	R$ 37,57	R$ 6.563,48		0,00%	R$ -	174,70	100,00%	R$ 6.563,48	174,70	100,00%	R$ 6.563,48
18.55	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 120mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	102,20	R$ 61,10	R$ 6.244,42		0,00%	R$ -	102,20	100,00%	R$ 6.244,42	102,20	100,00%	R$ 6.244,42
18.56	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 240mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	138,00	R$ 114,83	R$ 15.846,54		0,00%	R$ -	138,00	100,00%	R$ 15.846,54	138,00	100,00%	R$ 15.846,54
18.57	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	12,00	R$ 13,70	R$ 164,40		0,00%	R$ -	12,00	100,00%	R$ 164,40	12,00	100,00%	R$ 164,40
18.58	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,70	R$ 26,33	R$ 97,42		0,00%	R$ -	3,70	100,00%	R$ 97,42	3,70	100,00%	R$ 97,42
18.59	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	1,70	R$ 33,95	R$ 57,72		0,00%	R$ -	1,70	100,00%	R$ 57,72	1,70	100,00%	R$ 57,72
18.60	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	3,90	R$ 40,55	R$ 158,15		0,00%	R$ -	3,90	100,00%	R$ 158,15	3,90	100,00%	R$ 158,15
18.61	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	R$ 26,33	R$ 963,68		0,00%	R$ -	36,60	100,00%	R$ 963,68	36,60	100,00%	R$ 963,68
18.62	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	R$ 13,70	R$ 428,81		0,00%	R$ -	31,30	100,00%	R$ 428,81	31,30	100,00%	R$ 428,81
18.63	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50	R$ 26,33	R$ 487,11		0,00%	R$ -	18,50	100,00%	R$ 487,11	18,50	100,00%	R$ 487,11
18.64	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	R$ 26,33	R$ 302,80		0,00%	R$ -	11,50	100,00%	R$ 302,80	11,50	100,00%	R$ 302,80

Álvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
19.13	Luva de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	2,00	R$ 28,44	R$ 56,88		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.14	Conector ampactinho 4AWG	un	3,00	R$ 6,17	R$ 18,51		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.15	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 95mm2 - fornecimento e instalacao	un	2,00	R$ 9,17	R$ 18,34		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.16	Kit abraçadeira de aço carbono ¾" com feixo	un	1,00	R$ 31,94	R$ 31,94		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.17	Conector duplo terra	un	4,00	R$ 10,93	R$ 43,72		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.18	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00	R$ 13,30	R$ 13,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.19	Fita Isolante Colorida (vermelho, azul, amarelo, branco)	Un	4,00	R$ 7,25	R$ 29,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.20	Gancho olhal aço 50Kn	un	3,00	R$ 14,03	R$ 42,09		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.21	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m com conector	un	4,00	R$ 31,67	R$ 126,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.22	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	3,00	R$ 85,62	R$ 256,86		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.23	Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm	un	3,00	R$ 5,08	R$ 15,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.24	Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado	un	3,00	R$ 14,99	R$ 44,97		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.25	Caixa inspeção aterramento 300x300x400mm	un	2,00	R$ 38,82	R$ 77,64		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.26	Parafuso máquina 16x300mm	un	4,00	R$ 6,44	R$ 25,76		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.27	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	4,00	R$ 10,00	R$ 40,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.28	Para-raio polimérico 15 KV	un	3,00	R$ 182,16	R$ 546,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.29	Suporte para transformador	un	2,00	R$ 60,21	R$ 120,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.30	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2	Un	6,00	R$ 3,19	R$ 19,14		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.31	Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento	un	1,00	R$ 1.027,74	R$ 1.027,74		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.32	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	3,00	R$ 154,76	R$ 464,28		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.33	Transformador trifásico 75KVA-13.800/380/220V	un	1,00	R$ 10.825,42	R$ 10.825,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.34	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3,00	R$ 56,82	R$ 170,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.35	Estribo normal 4AWG	un	3,00	R$ 35,09	R$ 105,27		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 18.463,32			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO													
20.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado)	m	153,39	R$ 3,20	R$ 490,85		0,00%	R$ -	153,39	100,00%	R$ 490,85	153,39	100,00%	R$ 490,85
20.2	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00	R$ 3,24	R$ 74,52		0,00%	R$ -	23,00	100,00%	R$ 74,52	23,00	100,00%	R$ 74,52
20.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado ? fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	28,00	R$ 3,05	R$ 85,40		0,00%	R$ -	28,00	100,00%	R$ 85,40	28,00	100,00%	R$ 85,40
20.4	Caixa de concreto 40x40x40cm com fundo de brita conforme projeto	un	7,00	R$ 73,45	R$ 514,15		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 514,15	7,00	100,00%	R$ 514,15
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 1.164,92			R$ -			R$ 1.164,92		100,00%	R$ 1.164,92
21	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA													
21.1	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 42u x 680mm c/ 05 patch panel 24 portas cat.6e	un	3,00	R$ 6.436,70	R$ 19.310,10		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.2	Switch 48 portas - fonnecimento e instalação	un	1,00	R$ 1.141,45	R$ 1.141,45		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.3	Guias de cabos simples	un	2,00	R$ 11,12	R$ 22,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	R$ 11,12	R$ 11,12		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.5	Guia de Cabos Vertical	un	18,00	R$ 11,12	R$ 200,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.6	Guia de Cabos Superior, fechado	un	2,00	R$ 11,12	R$ 22,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.7	Perfil de montagem	un	1,00	R$ 284,74	R$ 284,74		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.8	Anel organizador de cabos	un	2,00	R$ 3,13	R$ 6,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.9	Bandeja deslizante perfurada	Un	2,00	R$ 175,32	R$ 350,64		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.10	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1,00	R$ 454,23	R$ 454,23		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
21.11	Roteador Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - 3 atenas - fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 161,43	R$ 322,86		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA								BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO					
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36		VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%		PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300		FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO				MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.8	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 233,78	R$ 935,12		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 935,12	4,00	100,00%	R$ 935,12
12.9	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 5,14	R$ 15,42		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 15,42	3,00	100,00%	R$ 15,42
12.10	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e	un	81,00	R$ 5,26	R$ 426,06		0,00%	R$ -	81,00	100,00%	R$ 426,06	81,00	100,00%	R$ 426,06
12.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 3,17	R$ 6,34		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 6,34	2,00	100,00%	R$ 6,34
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00	R$ 6,52	R$ 234,72		0,00%	R$ -	36,00	100,00%	R$ 234,72	36,00	100,00%	R$ 234,72
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	R$ 11,93	R$ 190,88		0,00%	R$ -	16,00	100,00%	R$ 190,88	16,00	100,00%	R$ 190,88
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 19,30	R$ 77,20		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 77,20	4,00	100,00%	R$ 77,20
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 26,68	R$ 106,72		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 106,72	4,00	100,00%	R$ 106,72
12.16	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm	un	2,00	R$ 55,44	R$ 110,88		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 110,88	2,00	100,00%	R$ 110,88
12.17	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 5,56	R$ 5,56		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 5,56	1,00	100,00%	R$ 5,56
12.18	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	24,00	R$ 9,08	R$ 217,92		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 217,92	24,00	100,00%	R$ 217,92
12.19	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	3,00	R$ 18,09	R$ 54,27		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 54,27	3,00	100,00%	R$ 54,27
12.20	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm	un	7,00	R$ 19,50	R$ 136,50		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 136,50	7,00	100,00%	R$ 136,50
12.21	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	30,00	R$ 10,37	R$ 311,10		0,00%	R$ -	30,00	100,00%	R$ 311,10	30,00	100,00%	R$ 311,10
12.22	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	2,00	R$ 11,11	R$ 22,22		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 22,22	2,00	100,00%	R$ 22,22
12.23	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	5,00	R$ 13,78	R$ 68,90		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 68,90	5,00	100,00%	R$ 68,90
12.24	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	15,00	R$ 20,23	R$ 303,45		0,00%	R$ -	15,00	100,00%	R$ 303,45	15,00	100,00%	R$ 303,45
12.25	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm	un	4,00	R$ 24,46	R$ 97,84		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 97,84	4,00	100,00%	R$ 97,84
12.26	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 3,24	R$ 19,44		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 19,44	6,00	100,00%	R$ 19,44
12.27	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 5,13	R$ 10,26		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 10,26	2,00	100,00%	R$ 10,26
12.28	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 8,84	R$ 17,68		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 17,68	2,00	100,00%	R$ 17,68
12.29	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 43,88	R$ 87,76		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 87,76	2,00	100,00%	R$ 87,76
12.30	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 49,81	R$ 99,62		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 99,62	2,00	100,00%	R$ 99,62
12.31	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	R$ 24,94	R$ 174,58		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 174,58	7,00	100,00%	R$ 174,58
12.32	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 4,57	R$ 13,71		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 13,71	3,00	100,00%	R$ 13,71
12.33	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00	R$ 5,38	R$ 812,38		0,00%	R$ -	151,00	100,00%	R$ 812,38	151,00	100,00%	R$ 812,38
12.34	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 7,12	R$ 21,36		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 21,36	3,00	100,00%	R$ 21,36
12.35	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 7,74	R$ 154,80		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 154,80	20,00	100,00%	R$ 154,80
12.36	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	R$ 20,83	R$ 229,13		0,00%	R$ -	11,00	100,00%	R$ 229,13	11,00	100,00%	R$ 229,13
12.37	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 63,97	R$ 127,94		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 127,94	2,00	100,00%	R$ 127,94
12.38	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 63,97	R$ 639,70		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 639,70	10,00	100,00%	R$ 639,70
12.39	Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 16,13	R$ 48,39		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 48,39	3,00	100,00%	R$ 48,39
12.40	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 50,18	R$ 100,36		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 100,36	2,00	100,00%	R$ 100,36
12.41	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	R$ 7,68	R$ 284,16		0,00%	R$ -	37,00	100,00%	R$ 284,16	37,00	100,00%	R$ 284,16
12.42	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 8,27	R$ 8,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 8,27	1,00	100,00%	R$ 8,27
12.43	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	R$ 14,22	R$ 184,86		0,00%	R$ -	13,00	100,00%	R$ 184,86	13,00	100,00%	R$ 184,86
12.44	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 37,89	R$ 454,68		0,00%	R$ -	12,00	100,00%	R$ 454,68	12,00	100,00%	R$ 454,68
12.45	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 34,05	R$ 102,15		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 102,15	3,00	100,00%	R$ 102,15
12.46	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	R$ 34,05	R$ 306,45		0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 306,45	9,00	100,00%	R$ 306,45
12.47	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 9,03	R$ 27,09		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 27,09	3,00	100,00%	R$ 27,09
12.48	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	R$ 14,34	R$ 401,52		0,00%	R$ -	28,00	100,00%	R$ 401,52	28,00	100,00%	R$ 401,52
12.49	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	R$ 45,62	R$ 501,82		0,00%	R$ -	11,00	100,00%	R$ 501,82	11,00	100,00%	R$ 501,82


Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366840-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 01/09/2021 a 30/05/2023				DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -	
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
5.6	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	22,63	R$ 266,85	R$ 6.038,82		0,00%	R$ -	22,63	100,00%	R$ 6.038,82	22,63	100,00%	R$ 6.038,82	
5.7	Vergas e contraverga 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a conforme projeto	m	262,10	R$ 15,71	R$ 4.117,59		0,00%	R$ -	262,10	100,00%	R$ 4.117,59	262,10	100,00%	R$ 4.117,59	
5.8	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos cerâmicos de 08 furos de 9x19x19cm (espessura 9cm) assentado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (MURETA)	m2	18,12	R$ 32,62	R$ 591,07		0,00%	R$ -	18,12	100,00%	R$ 591,07	18,12	100,00%	R$ 591,07	
5.9	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira (MURO)	m2	297,36	R$ 28,51	R$ 8.477,73		0,00%	R$ -	297,36	100,00%	R$ 8.477,73	297,36	100,00%	R$ 8.477,73	
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 68.665,12			R$ 0,00			R$ 68.665,12		100,00%	R$ 68.665,12	
6	ESQUADRIAS														
6.1	Porta de madeira PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica (alumínio), inclusive, aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	R$ 361,76	R$ 3.617,60		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 3.617,60	10,00	100,00%	R$ 3.617,60	
6.2	Porta de madeira PM2 - 80x210 com veneziana, inclusive, aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	R$ 367,14	R$ 1.835,70		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 1.835,70	5,00	100,00%	R$ 1.835,70	
6.3	Porta de madeira PM3 - 80x210 barra e chapa metálica (alumínio), inclusive aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	R$ 367,14	R$ 1.468,56		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 1.468,56	4,00	100,00%	R$ 1.468,56	
6.4	Porta de madeira PM4 - 80x210 chapa metálica (alumínio), inclusive aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	R$ 367,14	R$ 2.202,84		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 2.202,84	6,00	100,00%	R$ 2.202,84	
6.5	Porta de madeira PM5 - 80x210 barra, chapa metálica (alumínio) e visor, inclusive aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	R$ 965,50	R$ 9.655,00		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 9.655,00	10,00	100,00%	R$ 9.655,00	
6.6	Porta de madeira PM6 - 60x100 revestida com laminado melamínico (cores laranja, amarelo, rede e azul), incluso ferragens, marco com peril em alumínio natural e tarjeta metálica tipo livre-ocupado conforme projeto de esquadrias	un	16,00	R$ 274,79	R$ 4.396,64		0,00%	R$ -	16,00	100,00%	R$ 4.396,64	16,00	100,00%	R$ 4.396,64	
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas internas, conforme projeto de esquadrias	un	35,00	R$ 99,07	R$ 3.467,45		0,00%	R$ -	35,00	100,00%	R$ 3.467,45	35,00	100,00%	R$ 3.467,45	
6.8	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidros	m2	2,10	R$ 350,20	R$ 735,42		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 735,42	2,10	100,00%	R$ 735,42	
6.9	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	1,68	R$ 350,20	R$ 588,34		0,00%	R$ -	1,68	100,00%	R$ 588,34	1,68	100,00%	R$ 588,34	
6.10	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	6,72	R$ 350,20	R$ 2.353,34		0,00%	R$ -	6,72	100,00%	R$ 2.353,34	6,72	100,00%	R$ 2.353,34	
6.11	Porta de correr - PA4 - 450x210 - conforme projeto de esquadrias, incusive ferragens e vidros	m2	113,40	R$ 350,20	R$ 39.712,68		0,00%	R$ -	109,53	96,58%	R$ 38.355,69	109,53	96,58%	R$ 38.355,69	
6.12	Porta de correr - PA5 - 240x210 - com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	5,04	R$ 350,20	R$ 1.765,01		0,00%	R$ -	5,04	100,00%	R$ 1.765,01	5,04	100,00%	R$ 1.765,01	
6.13	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, incusive ferragens	m2	4,44	R$ 350,20	R$ 1.554,89		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	
6.14	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, incusive ferragens	m2	5,25	R$ 350,20	R$ 1.838,55		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	
6.15	Porta de vidro temperado 10mm - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m2	4,02	R$ 337,56	R$ 1.356,99		0,00%	R$ -	4,02	100,00%	R$ 1.356,99	4,02	100,00%	R$ 1.356,99	
6.16	Porta de vidro temperado 10mm - PV2 - 275+110x230+35 (inclusive parte fixas), com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m2	7,55	R$ 337,56	R$ 2.548,58		0,00%	R$ -	7,55	100,00%	R$ 2.548,58	7,55	100,00%	R$ 2.548,58	
6.17	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m2	1,75	R$ 316,31	R$ 553,54		0,00%	R$ -	1,75	100,00%	R$ 553,54	1,75	100,00%	R$ 553,54	
6.18	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m2	1,60	R$ 316,31	R$ 506,10		0,00%	R$ -	1,60	100,00%	R$ 506,10	1,60	100,00%	R$ 506,10	

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1- PADRÃO FNDE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO: 092/2015
Contratada : NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	Período: 01/09/2023 À 30/05/2023	

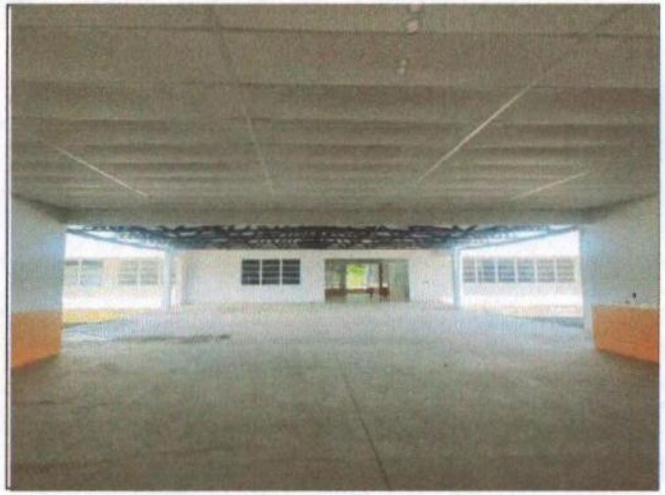

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1




CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1


Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2[illegible]0613770SE
Engenheiro Civil

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1- PADRÃO FNDE Contratada : NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO** Período: 01/09/2023 À 30/05/2023	CONTRATO: 092/2015

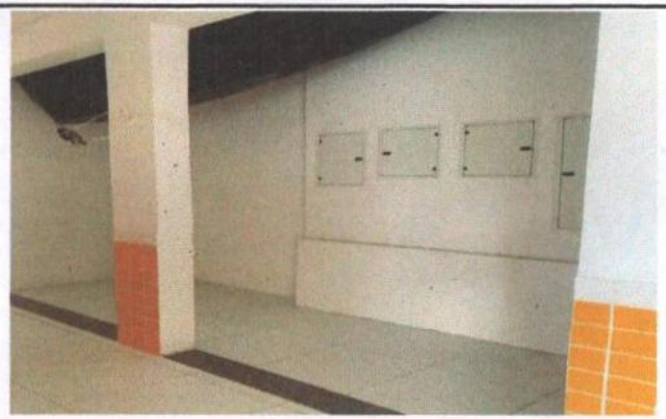

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

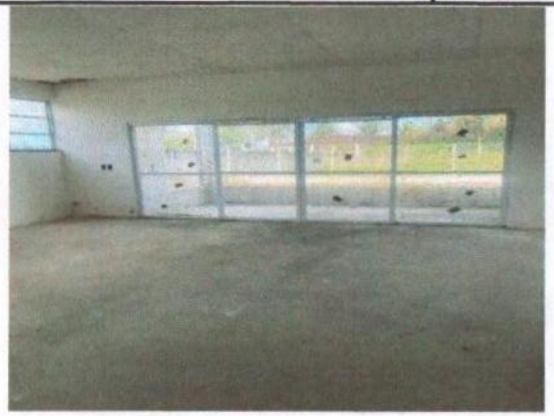

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA-177416/D 7709E
Engenheiro Civil

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1- PADRÃO FNDE	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	CONTRATO: 092/2015
Contratada : NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA		
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	Período: 01/09/2023 À 30/05/2023	




CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

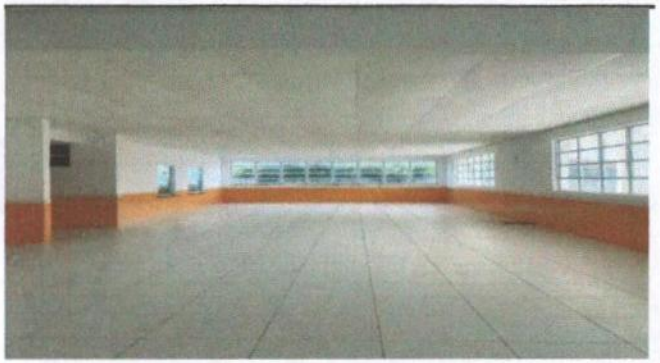

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1



CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA-TIPO 1

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-SE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº SE20230333106

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

INICIAL

1. Responsável Técnico

JOSE EDUARDO MACEDO CARVALHO
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **2720613770**
Registro: **2720613770SE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cristinápolis** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**
PRAçA da Bandeira Nº: **81**
Complemento: Bairro: **centro**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**

Contrato: **030/2023** Celebrado em: **02/01/2023**
Valor: **R$ 2.100,00** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Púbilco**
Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA Santa Clara Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **Santa Clara**
Cidade: **CRISTINÁPOLIS** UF: **SE** CEP: **49270000**
Data de Início: **02/01/2023** Previsão de término: **31/12/2023** Coordenadas Geográficas: **-11.480292, -37.768679**
Finalidade: **Escolar** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cristinápolis** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
18 - Fiscalização		
61 - Fiscalização de serviço técnico > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS	1.323,58	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART de Fiscalização da Construção de uma creche pro infancia padrão FNDE com área total de 1323,58 m² no Bairro Santa Clara, no município de Cristinápolis.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-SE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

CESE - CLUBE DE ENGENHARIA DE SERGIPE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

José Eduardo Macedo Carvalho

JOSE EDUARDO MACEDO CARVALHO - CPF: 068.807.915-65

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Prefeitura Municipal de Cristinápolis - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 96,62** Registrada em: **31/05/2023** Valor pago: **R$ 96,62** Nosso Número: **8202776009**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-se.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z03bx
Impresso em: 02/06/2023 às 09:11:28 por: , ip: 192.168.100.1

CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA

Receita Federal

Informações da obra

Número de inscrição da obra
90.013.41534/71

Nome da obra
NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Data do cadastramento
04/01/2023 15:17

Origem do cadastramento
e-CAC

ART | **RRT** | **CIB** | **Cadastro Imobiliário**
000

Data do início da obra
24/12/2015

CNAE
4120400 Construção de edifícios

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	24/12/2015

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	CRISTINAPOLIS	SE	49.270-000

Bairro	Logradouro	Número
CENTRO	PRACA DA BANDEIRA	81

Observações
Construção de uma creche tipo 1 padrão fnde, no Bairro Santa Clara na sede do município de Cristinapolis - Sergipe.

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	05.917.626/0001-80	Construtora

Data de início da responsabilidade
24/12/2015

Data de término da responsabilidade

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.096.029/0001-60	MUNICIPIO DE CRISTINAPOLIS

Obra por Contrato

Unidade de Medida	Medida	Número do Contrato	Valor do Contrato
Outra	1,00	92/2015	R$ 1.716.378,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO		15/08/2015	FIM CONVÊNIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 6308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA		R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
	PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA:		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
	DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
10.4	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m2	355,53	R$ 49,97	R$ 17.765,83	17,78	5,00%	R$ 888,47	337,75	95,00%	R$ 16.877,37	355,53	100,00%	R$ 17.765,83
10.5	Piso vinílico em manta e=2,0mm - conforme projeto	m2	394,33	R$ 75,53	R$ 29.783,74		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.6	Rodapé vinílico de aba curva h=5cm, e=1mm, fixado c/ cola, sobre emboço	m	254,10	R$ 15,92	R$ 4.045,27		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.7	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, fornecimento e assentamento	m2	27,90	R$ 203,13	R$ 5.667,33		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.8	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, fornecimento e assentamento	m2	22,68	R$ 203,13	R$ 4.606,99		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.9	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	90,00	R$ 35,51	R$ 3.195,90	15,00	16,67%	R$ 532,65	75,00	83,33%	R$ 2.663,25	90,00	100,00%	R$ 3.195,90
10.10	Soleira em granito cinza andorinha, l = 30 cm, e = 2 cm	m	1,77	R$ 38,15	R$ 67,53		0,00%	R$ -	1,77	100,00%	R$ 67,53	1,77	100,00%	R$ 67,53
10.11	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação plástica a cada 1,20m, incluso lançamento e adensamento	m2	345,98	R$ 24,50	R$ 8.476,51		0,00%	R$ -	345,98	100,00%	R$ 8.476,51	345,98	100,00%	R$ 8.476,51
10.12	Rampa de acesso em concreto	m2	28,22	R$ 27,33	R$ 771,25	28,22	100,00%	R$ 771,25		0,00%	R$ -	28,22	100,00%	R$ 771,25
10.13	Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, fck 35mpa,	m2	67,22	R$ 53,10	R$ 3.569,38		0,00%	R$ -	60,22	89,59%	R$ 3.197,68	60,22	89,59%	R$ 3.197,68
10.14	Piso tátil de alerta 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	4,86	R$ 75,50	R$ 366,93		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.15	Piso tátil direcional 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	8,64	R$ 75,50	R$ 652,32		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.16	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	23,10	R$ 19,96	R$ 461,08		0,00%	R$ -	23,10	100,00%	R$ 461,08	23,10	100,00%	R$ 461,08
10.17	Fornecimento e instalação de grama sintética 12mm para playground	m2	76,77	R$ 46,19	R$ 3.546,01		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.18	Plantio de grama batatais em placas inclusive terra vegetal	m2	368,56	R$ 12,50	R$ 4.607,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
10.19	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar para degraus do chuveiros infantis	m	2,40	R$ 25,16	R$ 60,38		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 130.061,80			R$ 4.412,66			R$ 71.941,47		56,71%	R$ 76.354,12
11	PINTURA													
11.1	Emassamento com massa acrílica de paredes internas e externas, com aplicação de 02 demãos e lixamento	m2	1.251,61	R$ 8,94	R$ 11.189,39	963,87	77,01%	R$ 8.617,00	187,74	15,00%	R$ 1.678,40	1.151,61	92,01%	R$ 10.295,39
11.2	Pintura acrílica 02 demãos sobre paredes internas e externas	m2	1.938,48	R$ 8,96	R$ 17.368,78		0,00%	R$ -	1.356,94	70,00%	R$ 12.158,18	1.356,94	70,00%	R$ 12.158,18
11.3	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto sobre forro de gesso acartonado	m2	498,03	R$ 5,14	R$ 2.559,87	200,00	40,16%	R$ 1.028,00		0,00%	R$ -	200,00	40,16%	R$ 1.028,00
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m2	107,10	R$ 19,54	R$ 2.092,73		0,00%	R$ -	107,10	100,00%	R$ 2.092,73	107,10	100,00%	R$ 2.092,73
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m2	19,13	R$ 19,64	R$ 375,71		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
11.6	Pintura epoxi, duas demaos nas paredes	m2	172,17	R$ 38,49	R$ 6.626,82		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
11.7	Pintura epoxi sobre piso em diversas cores 02 demãos	m2	58,70	R$ 38,49	R$ 2.259,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 42.472,68			R$ 9.645,00			R$ 15.929,31		60,21%	R$ 25.574,30
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA													
12.1	Engate flexivel plástico 1/2 -30cm	un	45,00	R$ 5,83	R$ 262,35		0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 262,35	45,00	100,00%	R$ 262,35
12.2	Tubo de descarga VDE 38mm	un	26,00	R$ 18,95	R$ 492,70		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 492,70	26,00	100,00%	R$ 492,70
12.3	Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario	un	26,00	R$ 16,18	R$ 420,68		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 420,68	26,00	100,00%	R$ 420,68
12.4	Luva soldável com rosca 25mm	un	15,00	R$ 2,97	R$ 44,55		0,00%	R$ -	15,00	100,00%	R$ 44,55	15,00	100,00%	R$ 44,55
12.5	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 110mmx4" - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$ 233,78	R$ 935,12		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 935,12	4,00	100,00%	R$ 935,12
12.6	Adaptador pvc soldavel com flanges livres para caixa d'agua 85mmx3" - fornecimento e instalacao	un	4,00	R$ 168,83	R$ 675,32		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 675,32	4,00	100,00%	R$ 675,32
12.7	Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 11,58	R$ 11,58		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 11,58	1,00	100,00%	R$ 11,58

Alvaro Barreiros Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	FM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA		R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
12.8	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 233,78	R$ 935,12		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 935,12	4,00	100,00%	R$ 935,12
12.9	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 5,14	R$ 15,42		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 15,42	3,00	100,00%	R$ 15,42
12.10	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e	un	81,00	R$ 5,26	R$ 426,06		0,00%	R$ -	81,00	100,00%	R$ 426,06	81,00	100,00%	R$ 426,06
12.11	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 3,17	R$ 6,34		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 6,34	2,00	100,00%	R$ 6,34
12.12	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	un	36,00	R$ 6,52	R$ 234,72		0,00%	R$ -	36,00	100,00%	R$ 234,72	36,00	100,00%	R$ 234,72
12.13	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	un	16,00	R$ 11,93	R$ 190,88		0,00%	R$ -	16,00	100,00%	R$ 190,88	16,00	100,00%	R$ 190,88
12.14	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 19,30	R$ 77,20		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 77,20	4,00	100,00%	R$ 77,20
12.15	Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 26,68	R$ 106,72		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 106,72	4,00	100,00%	R$ 106,72
12.16	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 85mm	un	2,00	R$ 55,44	R$ 110,88		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 110,88	2,00	100,00%	R$ 110,88
12.17	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 5,56	R$ 5,56		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 5,56	1,00	100,00%	R$ 5,56
12.18	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	24,00	R$ 9,08	R$ 217,92		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 217,92	24,00	100,00%	R$ 217,92
12.19	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm	un	3,00	R$ 18,09	R$ 54,27		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 54,27	3,00	100,00%	R$ 54,27
12.20	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 75mm	un	7,00	R$ 19,50	R$ 136,50		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 136,50	7,00	100,00%	R$ 136,50
12.21	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	30,00	R$ 10,37	R$ 311,10		0,00%	R$ -	30,00	100,00%	R$ 311,10	30,00	100,00%	R$ 311,10
12.22	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	2,00	R$ 11,11	R$ 22,22		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 22,22	2,00	100,00%	R$ 22,22
12.23	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 25mm	un	5,00	R$ 13,78	R$ 68,90		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 68,90	5,00	100,00%	R$ 68,90
12.24	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	15,00	R$ 20,23	R$ 303,45		0,00%	R$ -	15,00	100,00%	R$ 303,45	15,00	100,00%	R$ 303,45
12.25	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85 x 60mm	un	4,00	R$ 24,46	R$ 97,84		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 97,84	4,00	100,00%	R$ 97,84
12.26	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	6,00	R$ 3,24	R$ 19,44		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 19,44	6,00	100,00%	R$ 19,44
12.27	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 5,13	R$ 10,26		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 10,26	2,00	100,00%	R$ 10,26
12.28	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 8,84	R$ 17,68		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 17,68	2,00	100,00%	R$ 17,68
12.29	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 43,88	R$ 87,76		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 87,76	2,00	100,00%	R$ 87,76
12.30	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 49,81	R$ 99,62		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 99,62	2,00	100,00%	R$ 99,62
12.31	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	7,00	R$ 24,94	R$ 174,58		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 174,58	7,00	100,00%	R$ 174,58
12.32	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 4,57	R$ 13,71		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 13,71	3,00	100,00%	R$ 13,71
12.33	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	151,00	R$ 5,38	R$ 812,38		0,00%	R$ -	151,00	100,00%	R$ 812,38	151,00	100,00%	R$ 812,38
12.34	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 7,12	R$ 21,36		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 21,36	3,00	100,00%	R$ 21,36
12.35	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 7,74	R$ 154,80		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 154,80	20,00	100,00%	R$ 154,80
12.36	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	11,00	R$ 20,83	R$ 229,13		0,00%	R$ -	11,00	100,00%	R$ 229,13	11,00	100,00%	R$ 229,13
12.37	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 63,97	R$ 127,94		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 127,94	2,00	100,00%	R$ 127,94
12.38	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	10,00	R$ 63,97	R$ 639,70		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 639,70	10,00	100,00%	R$ 639,70
12.39	Joelho de redução 90° soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 16,13	R$ 48,39		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 48,39	3,00	100,00%	R$ 48,39
12.40	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 50,18	R$ 100,36		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 100,36	2,00	100,00%	R$ 100,36
12.41	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	37,00	R$ 7,68	R$ 284,16		0,00%	R$ -	37,00	100,00%	R$ 284,16	37,00	100,00%	R$ 284,16
12.42	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 8,27	R$ 8,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 8,27	1,00	100,00%	R$ 8,27
12.43	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	un	13,00	R$ 14,22	R$ 184,86		0,00%	R$ -	13,00	100,00%	R$ 184,86	13,00	100,00%	R$ 184,86
12.44	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	un	12,00	R$ 37,89	R$ 454,68		0,00%	R$ -	12,00	100,00%	R$ 454,68	12,00	100,00%	R$ 454,68
12.45	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 34,05	R$ 102,15		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 102,15	3,00	100,00%	R$ 102,15
12.46	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	un	9,00	R$ 34,05	R$ 306,45		0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 306,45	9,00	100,00%	R$ 306,45
12.47	Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 9,03	R$ 27,09		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 27,09	3,00	100,00%	R$ 27,09
12.48	Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	un	28,00	R$ 14,34	R$ 401,52		0,00%	R$ -	28,00	100,00%	R$ 401,52	28,00	100,00%	R$ 401,52
12.49	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	un	11,00	R$ 45,62	R$ 501,82		0,00%	R$ -	11,00	100,00%	R$ 501,82	11,00	100,00%	R$ 501,82

Alvaro Barreto Ventim Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377 0SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO		DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
				001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC	1016257	
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA) R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23
	PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA
	DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL
				MEDIÇÃO ATUAL		R$		1.716.378,07	R$ 110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$		1.716.378,07	R$ 110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Placa de obra em chapa de aco galvanizado - padrão Governo Federal	m2	6,00	R$ 236,74	R$ 1.420,44	-	0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 1.420,44	6,00	100,00%	R$ 1.420,44
1.2	Ligação provisória de água	un	1,00	R$ 303,48	R$ 303,48	-	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 303,48	1,00	100,00%	R$ 303,48
1.3	Ligação provisória de energia	un	1,00	R$ 1.387,07	R$ 1.387,07	-	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 1.387,07	1,00	100,00%	R$ 1.387,07
1.4	Ligação provisória de esgoto	un	1,00	R$ 303,48	R$ 303,48	-	0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 303,48	1,00	100,00%	R$ 303,48
1.5	Barracão provisório (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m2	40,00	R$ 149,95	R$ 5.998,00	-	0,00%	R$ -	40,00	100,00%	R$ 5.998,00	40,00	100,00%	R$ 5.998,00
1.6	Sondagem do terreno (um furo de 7 m a cada 200 m²) - SPT	m	56,00	R$ 49,33	R$ 2.762,48	-	0,00%	R$ -	56,00	100,00%	R$ 2.762,48	56,00	100,00%	R$ 2.762,48
1.7	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm (40x2,00m, frente do terreno)	m2	80,00	R$ 51,81	R$ 4.144,80	-	0,00%	R$ -	80,00	100,00%	R$ 4.144,80	80,00	100,00%	R$ 4.144,80
1.8	Limpeza e Regularização mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando motoniveladora	m2	3.084,20	R$ 0,56	R$ 1.727,15	-	0,00%	R$ -	3.084,20	100,00%	R$ 1.727,15	3.084,20	100,00%	R$ 1.727,15
1.9	Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura	m2	3.084,20	R$ 1,33	R$ 4.101,99	-	0,00%	R$ -	3.084,20	100,00%	R$ 4.101,99	3.084,20	100,00%	R$ 4.101,99
1.10	Aterro mecanizado compactado com emprestimo de areia (para nivelamento do terreno)	m3	65,00	R$ 43,91	R$ 2.854,15	-	0,00%	R$ -	65,00	100,00%	R$ 2.854,15	65,00	100,00%	R$ 2.854,15
1.11	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	1.510,23	R$ 3,57	R$ 5.391,52	-	0,00%	R$ -	1.510,23	100,00%	R$ 5.391,52	1.510,23	100,00%	R$ 5.391,52
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 30.394,56			R$ 0,00			R$ 30.394,56		100,00%	R$ 30.394,56
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES													
2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m	m3	146,87	R$ 25,10	R$ 3.686,44	-	0,00%	R$ -	146,87	100,00%	R$ 3.686,44	146,87	100,00%	R$ 3.686,44
2.2	Regularização e compactação do fundo de vala	m2	298,47	R$ 15,21	R$ 4.539,73	-	0,00%	R$ -	298,47	100,00%	R$ 4.539,73	298,47	100,00%	R$ 4.539,73
2.3	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m3	98,77	R$ 1,72	R$ 169,88	-	0,00%	R$ -	98,77	100,00%	R$ 169,88	98,77	100,00%	R$ 169,88
2.4	Aterro apiloado com camadas de 0,20 m com areia entre baldrames	m3	298,47	R$ 43,91	R$ 13.105,82	-	0,00%	R$ -	298,47	100,00%	R$ 13.105,82	298,47	100,00%	R$ 13.105,82
2.5	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m (MURETA)	m3	11,26	R$ 25,10	R$ 282,63	-	0,00%	R$ -	11,26	100,00%	R$ 282,63	11,26	100,00%	R$ 282,63
2.6	Regularização e compactação do fundo de vala (MURETA)	m2	17,74	R$ 15,21	R$ 269,83	-	0,00%	R$ -	17,74	100,00%	R$ 269,83	17,74	100,00%	R$ 269,83
2.7	Reaterro apiloado de vala com material da obra (MURETA)	m3	6,39	R$ 1,72	R$ 10,99	-	0,00%	R$ -	6,39	100,00%	R$ 10,99	6,39	100,00%	R$ 10,99
2.8	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m (CASTELO D' ÁGUA)	m3	5,78	R$ 25,10	R$ 145,08	-	0,00%	R$ -	5,78	100,00%	R$ 145,08	5,78	100,00%	R$ 145,08
2.9	Regularização e compactação do fundo de vala (CASTELO D' ÁGUA)	m2	12,96	R$ 15,21	R$ 197,12	-	0,00%	R$ -	12,96	100,00%	R$ 197,12	12,96	100,00%	R$ 197,12
2.10	Reaterro apiloado de vala com material da obra (CASTELO D' ÁGUA)	m3	1,06	R$ 1,72	R$ 1,82	-	0,00%	R$ -	1,06	100,00%	R$ 1,82	1,06	100,00%	R$ 1,82
2.11	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50m (MURO)	m3	72,03	R$ 25,10	R$ 1.807,95	-	0,00%	R$ -	72,03	100,00%	R$ 1.807,95	72,03	100,00%	R$ 1.807,95
2.12	Reaterro apiloado de vala com material da obra (MURO)	m3	13,60	R$ 1,72	R$ 23,39	-	0,00%	R$ -	13,60	100,00%	R$ 23,39	13,60	100,00%	R$ 23,39
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 24.240,88			R$ 0,00			R$ 24.240,88		100,00%	R$ 24.240,88
3	FUNDAÇÕES													
3.1	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico para sapatas (SAPATAS)	m2	108,97	R$ 18,04	R$ 1.965,82	-	0,00%	R$ -	108,97	100,00%	R$ 1.965,82	108,97	100,00%	R$ 1.965,82
3.2	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para sapatas	m2	193,58	R$ 23,37	R$ 4.523,96	-	0,00%	R$ -	193,58	100,00%	R$ 4.523,96	193,58	100,00%	R$ 4.523,96
3.3	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (SAPATAS)	kg	1.302,09	R$ 6,90	R$ 8.984,42	-	0,00%	R$ -	1.302,09	100,00%	R$ 8.984,42	1.302,09	100,00%	R$ 8.984,42
3.4	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (SAPATAS)	kg	151,64	R$ 6,64	R$ 1.006,89	-	0,00%	R$ -	151,64	100,00%	R$ 1.006,89	151,64	100,00%	R$ 1.006,89
3.5	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (SAPATAS)	m3	25,36	R$ 375,98	R$ 9.534,85	-	0,00%	R$ -	25,36	100,00%	R$ 9.534,85	25,36	100,00%	R$ 9.534,85
3.6	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (VIGA	m2	707,67	R$ 23,37	R$ 16.538,25	-	0,00%	R$ -	707,67	100,00%	R$ 16.538,25	707,67	100,00%	R$ 16.538,25

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO											
						NO PERÍODO				ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES				ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitario	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL		QUANT.	%	TOTAL		QUANT.	%	TOTAL	
3.7	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (VIGA BALDRAME)	kg	1.248,55	R$ 6,90	R$ 8.615,00	-	0,00%	R$ -		1.248,55	100,00%	R$	8.615,00	1.248,55	100,00%	R$	8.615,00
3.8	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (VIGA BALDRAME)	kg	645,82	R$ 6,64	R$ 4.288,24	-	0,00%	R$ -		645,82	100,00%	R$	4.288,24	645,82	100,00%	R$	4.288,24
3.9	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (VIGA BALDRAME)	m3	40,93	R$ 375,98	R$ 15.388,86	-	0,00%	R$ -		40,93	100,00%	R$	15.388,86	40,93	100,00%	R$	15.388,86
3.10	Estaca a trado (broca) diametro = 30 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa,	m	56,00	R$ 48,86	R$ 2.736,16	-	0,00%	R$ -		56,00	100,00%	R$	2.736,16	56,00	100,00%	R$	2.736,16
3.11	Corte e preparo em cabeca de estaca (CASTELO D' ÁGUA)	un	12,00	R$ 35,35	R$ 424,20	-	0,00%	R$ -		12,00	100,00%	R$	424,20	12,00	100,00%	R$	424,20
3.12	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico para bloco (CASTELO D'	m2	12,96	R$ 18,04	R$ 233,80	-	0,00%	R$ -		12,96	100,00%	R$	233,80	12,96	100,00%	R$	233,80
3.13	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (CASTELO D' ÁGUA)	m2	7,20	R$ 23,37	R$ 168,26	-	0,00%	R$ -		7,20	100,00%	R$	168,26	7,20	100,00%	R$	168,26
3.14	Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto (CASTELO D' ÁGUA)	un	6,48	R$ 604,72	R$ 3.918,59	-	0,00%	R$ -		6,48	100,00%	R$	3.918,59	6,48	100,00%	R$	3.918,59
3.15	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (CASTELO D' ÁGUA)	m3	4,71	R$ 375,98	R$ 1.770,87	-	0,00%	R$ -		4,71	100,00%	R$	1.770,87	4,71	100,00%	R$	1.770,87
3.16	Estaca a trado (broca) diametro = 30 cm, em concreto moldado in loco, 15 mpa, sem armacao - 7 m (MURETA - BLOCO)	m	52,50	R$ 48,86	R$ 2.565,15	-	0,00%	R$ -		52,50	100,00%	R$	2.565,15	52,50	100,00%	R$	2.565,15
3.17	Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecanico para bloco (MURETA - BLOCO)	m2	27,97	R$ 18,04	R$ 504,58	-	0,00%	R$ -		27,97	100,00%	R$	504,58	27,97	100,00%	R$	504,58
3.18	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (MURETA - BLOCO)	m2	21,39	R$ 23,37	R$ 499,88	-	0,00%	R$ -		21,39	100,00%	R$	499,88	21,39	100,00%	R$	499,88
3.19	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURETA - BLOCO)	kg	34,36	R$ 6,90	R$ 237,08	-	0,00%	R$ -		34,36	100,00%	R$	237,08	34,36	100,00%	R$	237,08
3.20	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (MURETA - BLOCO)	kg	37,91	R$ 6,64	R$ 251,72	-	0,00%	R$ -		37,91	100,00%	R$	251,72	37,91	100,00%	R$	251,72
3.21	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURETA BLOCO)	m3	2,38	R$ 375,98	R$ 894,83	-	0,00%	R$ -		2,38	100,00%	R$	894,83	2,38	100,00%	R$	894,83
3.22	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco (MURETA - VIGA BALDRAME)	m2	28,49	R$ 23,37	R$ 665,81	-	0,00%	R$ -		28,49	100,00%	R$	665,81	28,49	100,00%	R$	665,81
3.23	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURETA - VIGA BALDRAME)	kg	62,91	R$ 6,90	R$ 434,08	-	0,00%	R$ -		62,91	100,00%	R$	434,08	62,91	100,00%	R$	434,08
3.24	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (MURETA - VIGA BALDRAME)	kg	26,82	R$ 6,64	R$ 178,08	-	0,00%	R$ -		26,82	100,00%	R$	178,08	26,82	100,00%	R$	178,08
3.25	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURETA	m3	1,52	R$ 375,98	R$ 571,49	-	0,00%	R$ -		1,52	100,00%	R$	571,49	1,52	100,00%	R$	571,49
3.26	Alvenaria de pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte - 30cm x 30cm (MURO)	m3	17,47	R$ 305,64	R$ 5.339,53	-	0,00%	R$ -		17,47	100,00%	R$	5.339,53	17,47	100,00%	R$	5.339,53
3.27	Forma tabua p/ concreto em fundacao c/ reaproveitamento 10 x para bloco	m2	116,52	R$ 23,37	R$ 2.723,07	-	0,00%	R$ -		116,52	100,00%	R$	2.723,07	116,52	100,00%	R$	2.723,07
3.28	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - VIGA BALDRAME - 15cm x 30cm)	m3	8,74	R$ 375,98	R$ 3.286,07	-	0,00%	R$ -		8,74	100,00%	R$	3.286,07	8,74	100,00%	R$	3.286,07
3.29	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - SAPATAS - 80cm x 80cm x 30cm)	m3	12,28	R$ 375,98	R$ 4.617,03	-	0,00%	R$ -		12,28	100,00%	R$	4.617,03	12,28	100,00%	R$	4.617,03
3.30	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURO - SAPATAS)	kg	132,04	R$ 6,90	R$ 911,08	-	0,00%	R$ -		132,04	100,00%	R$	911,08	132,04	100,00%	R$	911,08
3.31	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de	kg	302,96	R$ 6,90	R$ 2.090,42	-	0,00%	R$ -		302,96	100,00%	R$	2.090,42	302,96	100,00%	R$	2.090,42
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 105.888,09			R$ 0,00				R$	105.888,07		100,00%	R$	105.888,07
4	SUPERESTRUTURA																
4.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (PILARES)	m2	459,20	R$ 28,53	R$ 13.100,98	-	0,00%	R$ -		459,20	100,00%	R$	13.100,98	459,20	100,00%	R$	13.100,98
4.2	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (PILARES)	kg	1.730,55	R$ 6,90	R$ 11.940,80	-	0,00%	R$ -		1.730,55	100,00%	R$	11.940,80	1.730,55	100,00%	R$	11.940,80

Alvaro Barreto Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA [illegible]366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613/D SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC: 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO: Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA: NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO											
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL					
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL			
4.3	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (PILARES)	kg	628,91	R$ 6,64	R$ 4.175,96	-	0,00%	R$ -	628,91	100,00%	R$ 4.175,96	628,91	100,00%	R$ 4.175,96			
4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (PILARES)	m3	25,19	R$ 375,98	R$ 9.470,94		0,00%	R$ -	25,19	100,00%	R$ 9.470,94	25,19	100,00%	R$ 9.470,94			
4.5	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (VIGAS)	m2	714,44	R$ 28,53	R$ 20.382,97		0,00%	R$ -	714,44	100,00%	R$ 20.382,97	714,44	100,00%	R$ 20.382,97			
4.6	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (VIGAS)	kg	1.152,73	R$ 6,90	R$ 7.953,84		0,00%	R$ -	1.152,73	100,00%	R$ 7.953,84	1.152,73	100,00%	R$ 7.953,84			
4.7	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (VIGAS)	kg	581,18	R$ 6,64	R$ 3.859,04		0,00%	R$ -	581,18	100,00%	R$ 3.859,04	581,18	100,00%	R$ 3.859,04			
4.8	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (VIGAS)	m3	41,19	R$ 375,98	R$ 15.486,62		0,00%	R$ -	41,19	100,00%	R$ 15.486,62	41,19	100,00%	R$ 15.486,62			
4.9	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (MURETA - PILARES)	m2	17,29	R$ 28,53	R$ 493,28		0,00%	R$ -	17,29	100,00%	R$ 493,28	17,29	100,00%	R$ 493,28			
4.10	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURETA - PILARES)	kg	48,82	R$ 6,90	R$ 336,86		0,00%	R$ -	48,82	100,00%	R$ 336,86	48,82	100,00%	R$ 336,86			
4.11	Armacao de aco ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de10%) / dobra / colocação (MURETA - PILARES)	kg	20,36	R$ 6,64	R$ 135,19		0,00%	R$ -	20,36	100,00%	R$ 135,19	20,36	100,00%	R$ 135,19			
4.12	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURETA - PILARES)	m3	0,80	R$ 375,98	R$ 300,78		0,00%	R$ -	0,80	100,00%	R$ 300,78	0,80	100,00%	R$ 300,78			
4.13	Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa (casa do gás/Lixo)	m2	6,38	R$ 65,92	R$ 420,57		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 420,57	6,38	100,00%	R$ 420,57			
4.14	Concreto usinado bombeado fck=20mpa, inclusive lancamento e adensamento	m3	0,73	R$ 415,00	R$ 302,95		0,00%	R$ -	0,73	100,00%	R$ 302,95	0,73	100,00%	R$ 302,95			
4.15	Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm (parede de concreto central gás)	m2	14,62	R$ 28,53	R$ 417,11		0,00%	R$ -	14,62	100,00%	R$ 417,11	14,62	100,00%	R$ 417,11			
4.16	Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x (MURO - PILAR)	m2	76,80	R$ 29,12	R$ 2.236,42		0,00%	R$ -	76,80	100,00%	R$ 2.236,42	76,80	100,00%	R$ 2.236,42			
4.17	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURO - PILARES)	kg	199,68	R$ 6,90	R$ 1.377,79		0,00%	R$ -	199,68	100,00%	R$ 1.377,79	199,68	100,00%	R$ 1.377,79			
4.18	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - PILARES), pilares a cada 3m	m3	3,45	R$ 375,98	R$ 1.297,13		0,00%	R$ -	3,45	100,00%	R$ 1.297,13	3,45	100,00%	R$ 1.297,13			
4.19	Forma tabua para concreto em cinta superior c/ reaproveitamento 5x (MURO -	m2	116,52	R$ 29,12	R$ 3.393,06		0,00%	R$ -	116,52	100,00%	R$ 3.393,06	116,52	100,00%	R$ 3.393,06			
4.20	Armacao aco ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação (MURO - VIGA SUPERIOR)	kg	302,96	R$ 6,90	R$ 2.090,42		0,00%	R$ -	302,96	100,00%	R$ 2.090,42	302,96	100,00%	R$ 2.090,42			
4.21	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado (MURO - CINTA SUPERIOR)	m3	5,24	R$ 375,98	R$ 1.970,14		0,00%	R$ -	5,24	100,00%	R$ 1.970,14	5,24	100,00%	R$ 1.970,14			
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 101.142,64			R$ 0,00			R$ 101.142,65		100,00%	R$ 101.142,65			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)																
5.1	Cobogo de concreto (elemento vazado), 6x40x40cm, assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia)	m2	5,14	R$ 91,58	R$ 470,72		0,00%	R$ -	5,14	100,00%	R$ 470,72	5,14	100,00%	R$ 470,72			
5.2	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos cerâmicos de 08 furos de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m2	942,96	R$ 28,51	R$ 26.883,79		0,00%	R$ -	942,96	100,00%	R$ 26.883,79	942,96	100,00%	R$ 26.883,79			
5.3	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 9x19x19cm, (espessura 19 cm), assentado em argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	17,07	R$ 56,71	R$ 968,04		0,00%	R$ -	17,07	100,00%	R$ 968,04	17,07	100,00%	R$ 968,04			
5.4	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 9x14x19; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m2	478,93	R$ 42,78	R$ 20.483,84		0,00%	R$ -	478,93	100,00%	R$ 20.483,84	478,93	100,00%	R$ 20.483,84			
5.5	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolos ceramicos macico 5,7x9x19cm 1 vez (espessura 20cm) com argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	m	50,56	R$ 12,53	R$ 633,52		0,00%	R$ -	50,56	100,00%	R$ 633,52	50,56	100,00%	R$ 633,52			

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
5.6	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	22,63	R$ 266,85	R$ 6.038,82		0,00%	R$ -	22,63	100,00%	R$ 6.038,82	22,63	100,00%	R$ 6.038,82	
5.7	Vergas e contraverga 10x10 cm, premoldadas c/ concreto fck=15 mpa (preparo mecanico), aco ca-50 com formas tabua de pinho 3a conforme projeto	m	262,10	R$ 15,71	R$ 4.117,59		0,00%	R$ -	262,10	100,00%	R$ 4.117,59	262,10	100,00%	R$ 4.117,59	
5.8	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em blocos cerâmicos de 08 furos de 9x19x19cm (espessura 9cm) assentado com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) (MURETA)	m2	18,12	R$ 32,62	R$ 591,07		0,00%	R$ -	18,12	100,00%	R$ 591,07	18,12	100,00%	R$ 591,07	
5.9	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com argamassa de assentamento com preparo em betoneira (MURO)	m2	297,36	R$ 28,51	R$ 8.477,73		0,00%	R$ -	297,36	100,00%	R$ 8.477,73	297,36	100,00%	R$ 8.477,73	
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 68.685,12			R$ 0,00			R$ 68.685,12		100,00%	R$ 68.685,12	
6	ESQUADRIAS														
6.1	Porta de madeira PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica (alumínio), inclusive, aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	R$ 361,76	R$ 3.617,60		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 3.617,60	10,00	100,00%	R$ 3.617,60	
6.2	Porta de madeira PM2 - 80x210 com veneziana, inclusive, aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	5,00	R$ 367,14	R$ 1.835,70		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 1.835,70	5,00	100,00%	R$ 1.835,70	
6.3	Porta de madeira PM3 - 80x210 barra e chapa metálica (alumínio), inclusive aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	4,00	R$ 367,14	R$ 1.468,56		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 1.468,56	4,00	100,00%	R$ 1.468,56	
6.4	Porta de madeira PM4 - 80x210 chapa metálica (alumínio), inclusive aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	6,00	R$ 367,14	R$ 2.202,84		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 2.202,84	6,00	100,00%	R$ 2.202,84	
6.5	Porta de madeira PM5 - 80x210 barra, chapa metálica (alumínio) e visor, inclusive aduelas, dobradiças e alizares, conforme projeto de esquadrias	un	10,00	R$ 965,50	R$ 9.655,00		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 9.655,00	10,00	100,00%	R$ 9.655,00	
6.6	Porta de madeira PM6 - 60x100 revestida com laminado melamínico (cores laranja, amarelo, rede e azul), incluso ferragens, marco com perfil em alumínio natural e tarjeta metálica tipo livre-ocupado conforme projeto de esquadrias	un	16,00	R$ 274,79	R$ 4.396,64		0,00%	R$ -	16,00	100,00%	R$ 4.396,64	16,00	100,00%	R$ 4.396,64	
6.7	Fechadura de embutir completa, para portas internas, conforme projeto de esquadrias	un	35,00	R$ 99,07	R$ 3.467,45		0,00%	R$ -	35,00	100,00%	R$ 3.467,45	35,00	100,00%	R$ 3.467,45	
6.8	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidros	m2	2,10	R$ 350,20	R$ 735,42		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 735,42	2,10	100,00%	R$ 735,42	
6.9	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	1,68	R$ 350,20	R$ 588,34		0,00%	R$ -	1,68	100,00%	R$ 588,34	1,68	100,00%	R$ 588,34	
6.10	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	6,72	R$ 350,20	R$ 2.353,34		0,00%	R$ -	6,72	100,00%	R$ 2.353,34	6,72	100,00%	R$ 2.353,34	
6.11	Porta de correr - PA4 - 450x210 - conforme projeto de esquadrias, incusive ferragens e vidros	m2	113,40	R$ 350,20	R$ 39.712,68		0,00%	R$ -	109,53	96,58%	R$ 38.355,69	109,53	96,58%	R$ 38.355,69	
6.12	Porta de correr - PA5 - 240x210 - com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m2	5,04	R$ 350,20	R$ 1.765,01		0,00%	R$ -	5,04	100,00%	R$ 1.765,01	5,04	100,00%	R$ 1.765,01	
6.13	Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, incusive ferragens	m2	4,44	R$ 350,20	R$ 1.554,89		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	
6.14	Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, incusive ferragens	m2	5,25	R$ 350,20	R$ 1.838,55		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	
6.15	Porta de vidro temperado 10mm - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m2	4,02	R$ 337,56	R$ 1.356,99		0,00%	R$ -	4,02	100,00%	R$ 1.356,99	4,02	100,00%	R$ 1.356,99	
6.16	Porta de vidro temperado 10mm - PV2 - 275+110x230+35 (inclusive parte fixas), com ferragens, conforme projeto de esquadrias	m2	7,55	R$ 337,56	R$ 2.548,58		0,00%	R$ -	7,55	100,00%	R$ 2.548,58	7,55	100,00%	R$ 2.548,58	
6.17	Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m2	1,75	R$ 316,31	R$ 553,54		0,00%	R$ -	1,75	100,00%	R$ 553,54	1,75	100,00%	R$ 553,54	
6.18	Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m2	1,60	R$ 316,31	R$ 506,10		0,00%	R$ -	1,60	100,00%	R$ 506,10	1,60	100,00%	R$ 506,10	

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO		15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO: 30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA): R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA		R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA:		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA

DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):

	VALOR CONTRATO + CORREÇÃO	MEDIÇÃO ATUAL
MEDIÇÃO ATUAL	R$ 1.716.378,07	R$ 110.171,07
INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL		R$ -
VALOR MEDIDO NO PERÍODO	R$ 1.716.378,07	R$ 110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
6.19	Vidro temperado incolor, espessura 6mm, JA-03, 140x115 completa conforme projeto de esquadrias	m2	3,22	R$ 208,79	R$ 672,30		0,00%	R$ -	3,22	100,00%	R$ 672,30	3,22	100,00%	R$ 672,30
6.20	Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina	m2	2,03	R$ 316,31	R$ 642,11	2,03	100,00%	R$ 642,11		0,00%	R$ -	2,03	100,00%	R$ 642,11
6.21	Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa	m2	2,10	R$ 279,08	R$ 586,07	2,10	100,00%	R$ 586,07		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 586,07
6.22	Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	2,10	R$ 336,02	R$ 705,64	2,10	100,00%	R$ 705,64		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 705,64
6.23	Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	12,60	R$ 336,02	R$ 4.233,85	12,60	100,00%	R$ 4.233,85		0,00%	R$ -	12,60	100,00%	R$ 4.233,85
6.24	Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	6,30	R$ 336,02	R$ 2.116,93	6,30	100,00%	R$ 2.116,93		0,00%	R$ -	6,30	100,00%	R$ 2.116,93
6.25	Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	18,90	R$ 336,02	R$ 6.350,78	12,44	65,80%	R$ 4.178,51	6,46	34,20%	R$ 2.172,27	18,90	100,00%	R$ 6.350,78
6.26	Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	2,10	R$ 336,02	R$ 705,64	2,10	100,00%	R$ 705,64		0,00%	R$ -	2,10	100,00%	R$ 705,64
6.27	Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	6,30	R$ 336,02	R$ 2.116,93	6,30	100,00%	R$ 2.116,93		0,00%	R$ -	6,30	100,00%	R$ 2.116,93
6.28	Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	8,40	R$ 336,02	R$ 2.822,57	8,40	100,00%	R$ 2.822,57		0,00%	R$ -	8,40	100,00%	R$ 2.822,57
6.29	Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	12,60	R$ 336,02	R$ 4.233,85	12,60	100,00%	R$ 4.233,85		0,00%	R$ -	12,60	100,00%	R$ 4.233,85
6.30	Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	33,60	R$ 336,02	R$ 11.290,27	33,60	100,00%	R$ 11.290,27		0,00%	R$ -	33,60	100,00%	R$ 11.290,27
6.31	Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro temperado liso incolor, espesura 6mm	m2	16,80	R$ 336,02	R$ 5.645,14	16,80	100,00%	R$ 5.645,14		0,00%	R$ -	16,80	100,00%	R$ 5.645,14
6.32	Tela de nylon de proteção com moldura em alumínio - fixada nas esquadrias - conforme projeto	m2	20,25	R$ 34,66	R$ 701,87		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.33	Vidro temperado incolor liso, espessura 6mm, fornecimento e instalação	m2	10,70	R$ 208,79	R$ 2.234,05		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.34	Vidro temperado incolor liso, espessura 10mm, fornecimento e instalação	m2	11,40	R$ 278,09	R$ 3.170,23		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.35	Espelho de cristal 4mm	m2	21,28	R$ 300,39	R$ 6.392,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.36	Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação	m2	145,20	R$ 128,06	R$ 18.594,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
6.37	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branco Gelo, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios (Portões de entrada e Gradil) - PO e GR	m²	53,75	R$ 159,48	R$ 8.572,05		0,00%	R$ -	53,75	100,00%	R$ 8.572,05	53,75	100,00%	R$ 8.572,05
6.38	Fornecimento de cadeado 50mm	un	6,00	R$ 28,41	R$ 170,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 102.114,56			R$ 39.277,51			R$ 86.823,42		77,75%	R$ 126.100,93
7	COBERTURA													
7.1	Estrutura metálica em tesoura inclusive pintura prime e esmalte sintético branco	m²	1.426,85	R$ 58,92	R$ 84.070,00		0,00%	R$ -	1.426,85	100,00%	R$ 84.070,00	1.426,85	100,00%	R$ 84.070,00
7.2	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduíche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm pintada	m2	1.283,33	R$ 109,82	R$ 140.935,30		0,00%	R$ -	1.283,33	100,00%	R$ 140.935,30	1.283,33	100,00%	R$ 140.935,30
7.3	Cumeeira metálica termoacústica trapezoidal	m	83,25	R$ 57,92	R$ 4.821,84		0,00%	R$ -	83,25	100,00%	R$ 4.821,84	83,25	100,00%	R$ 4.821,84
7.4	Calha em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm	m	186,15	R$ 49,88	R$ 9.285,16		0,00%	R$ -	186,15	100,00%	R$ 9.285,16	186,15	100,00%	R$ 9.285,16
7.5	Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm	m	258,90	R$ 25,94	R$ 6.715,87		0,00%	R$ -	258,90	100,00%	R$ 6.715,87	258,90	100,00%	R$ 6.715,87
7.6	Pingadeira (Chapim) de concreto conforme projeto	m	258,20	R$ 26,14	R$ 6.751,93		0,00%	R$ -	258,20	100,00%	R$ 6.751,93	258,20	100,00%	R$ 6.751,93
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 252.580,10			R$ 0,00			R$ 252.580,10		100,00%	R$ 252.580,10

Álvaro Barreiro Ventura Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 272061377-0SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO		15/08/2015	FIM CONVÊNIO			BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA		R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA:		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO			R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
8	IMPERMEABILIZAÇÃO													
8.1	Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundações, blocos e baldrames, duas demaos	m2	707,67	R$ 8,32	R$ 5.887,81		0,00%	R$ -	707,67	100,00%	R$ 5.887,81	707,67	100,00%	R$ 5.887,81
8.2	Impermeabilizaçao flexivel, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, pilajes	m2	6,38	R$ 45,03	R$ 287,29		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 287,29	6,38	100,00%	R$ 287,29
8.3	Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica duas demãos para área do chuveiro infantil	m2	17,52	R$ 20,02	R$ 350,75		0,00%	R$ -	17,52	100,00%	R$ 350,75	17,52	100,00%	R$ 350,75
8.4	Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm (laje da casa do gás/lixo)	m2	6,38	R$ 67,33	R$ 429,57		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 429,57	6,38	100,00%	R$ 429,57
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 6.955,42			R$ 0,00			R$ 6.955,42		100,00%	R$ 6.955,42
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS													
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibandas e calhas	m2	2.736,46	R$ 2,79	R$ 7.634,72		0,00%	R$ -	2.736,46	100,00%	R$ 7.634,72	2.736,46	100,00%	R$ 7.634,72
9.2	Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m2	6,38	R$ 8,14	R$ 51,93		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 51,93	6,38	100,00%	R$ 51,93
9.3	Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:8 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m2	2.826,43	R$ 21,96	R$ 62.068,40		0,00%	R$ -	2.826,43	100,00%	R$ 62.068,40	2.826,43	100,00%	R$ 62.068,40
9.4	Emboço paulista, para paredes, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	686,87	R$ 23,94	R$ 16.443,67		0,00%	R$ -	686,87	100,00%	R$ 16.443,67	686,87	100,00%	R$ 16.443,67
9.5	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm	m2	1.251,61	R$ 14,96	R$ 18.724,09		0,00%	R$ -	1.251,61	100,00%	R$ 18.724,09	1.251,61	100,00%	R$ 18.724,09
9.6	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	6,38	R$ 21,63	R$ 138,00		0,00%	R$ -	6,38	100,00%	R$ 138,00	6,38	100,00%	R$ 138,00
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - branca	m2	629,61	R$ 40,00	R$ 25.184,40	535,43	85,04%	R$ 21.417,20	94,18	14,96%	R$ 3.767,20	629,61	100,00%	R$ 25.184,40
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - azul	m2	9,21	R$ 41,94	R$ 386,27	4,60	49,95%	R$ 192,92	4,61	50,05%	R$ 193,34	9,21	100,00%	R$ 386,27
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - vermelho	m2	7,49	R$ 41,94	R$ 314,13	3,75	50,07%	R$ 157,28	3,74	49,93%	R$ 156,86	7,49	100,00%	R$ 314,13
9.10	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - branco	m2	15,17	R$ 41,94	R$ 636,23	7,60	50,10%	R$ 318,74	7,57	49,90%	R$ 317,49	15,17	100,00%	R$ 636,23
9.11	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm inclusive argamassa e rejunte conforme projeto - amarelo	m2	136,50	R$ 41,94	R$ 5.724,81	120,20	88,06%	R$ 5.041,19	16,30	11,94%	R$ 683,62	136,50	100,00%	R$ 5.724,81
9.12	Faixa em madeira de lei aparelhada 10 x 2,5 cm, para proteção de parede	m	191,30	R$ 19,33	R$ 3.697,83		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
9.13	Forro de gesso acartonado estruturado - fornecimento e aplicação	m2	498,03	R$ 72,55	R$ 36.132,08	250,00	50,20%	R$ 18.137,50	168,03	33,74%	R$ 12.190,58	418,03	83,94%	R$ 30.328,08
9.14	Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	m2	738,27	R$ 82,68	R$ 61.040,16	139,95	18,96%	R$ 11.571,07	498,32	67,50%	R$ 41.201,10	638,27	86,45%	R$ 52.772,16
9.15	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pórticos, vigas, platibandas e calhas (MURO)	m2	776,84	R$ 2,79	R$ 2.167,38		0,00%	R$ -	776,84	100,00%	R$ 2.167,38	776,84	100,00%	R$ 2.167,38
9.16	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4:5 - espessura 0,5 cm (MURO)	m2	776,84	R$ 14,96	R$ 11.621,53		0,00%	R$ -	776,84	100,00%	R$ 11.621,53	776,84	100,00%	R$ 11.621,53
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 251.985,63			R$ 56.835,90			R$ 177.369,91		82,95%	R$ 234.195,80
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA													
10.1	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa (inclusive lona preta para impermeabilização)	m2	1.159,70	R$ 18,18	R$ 21.083,35		0,00%	R$ -	1.159,70	100,00%	R$ 21.083,35	1.159,70	100,00%	R$ 21.083,35
10.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, cor cinza, inclusive, juntas de	m2	386,12	R$ 38,69	R$ 14.938,98	49,12	12,72%	R$ 1.900,45	337,00	87,28%	R$ 13.038,53	386,12	100,00%	R$ 14.938,98
10.3	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m2	226,97	R$ 28,18	R$ 6.396,01	11,35	5,00%	R$ 319,84	215,62	95,00%	R$ 6.076,17	226,97	100,00%	R$ 6.396,01

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO			R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI			20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO			300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO				MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$ -	
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
12.50	Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	R$ 45,62	R$ 228,10		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 228,10	5,00	100,00%	R$	228,10
12.51	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	un	5,00	R$ 86,63	R$ 433,15		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 433,15	5,00	100,00%	R$	433,15
12.52	Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 86,63	R$ 173,26		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 173,26	2,00	100,00%	R$	173,26
12.53	Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	7,00	R$ 8,74	R$ 61,18		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 61,18	7,00	100,00%	R$	61,18
12.54	Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	88,00	R$ 16,13	R$ 1.419,44		0,00%	R$ -	88,00	100,00%	R$ 1.419,44	88,00	100,00%	R$	1.419,44
12.55	Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	14,00	R$ 7,48	R$ 104,72		0,00%	R$ -	14,00	100,00%	R$ 104,72	14,00	100,00%	R$	104,72
12.56	Tê de Redução 90° sodável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	un	20,00	R$ 7,80	R$ 156,00		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 156,00	20,00	100,00%	R$	156,00
12.57	Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	un	3,00	R$ 5,84	R$ 17,52		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 17,52	3,00	100,00%	R$	17,52
12.58	Joelho 90 soldavel com rosca 20mm	un	5,00	R$ 4,87	R$ 24,35		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 24,35	5,00	100,00%	R$	24,35
12.59	Tê soldavel com rosca bolsa central 20mm - 1/2"	un	1,00	R$ 5,84	R$ 5,84		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 5,84	1,00	100,00%	R$	5,84
12.60	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	m	36,78	R$ 11,35	R$ 417,45		0,00%	R$ -	36,78	100,00%	R$ 417,45	36,78	100,00%	R$	417,45
12.61	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	m	275,11	R$ 3,20	R$ 880,35		0,00%	R$ -	275,11	100,00%	R$ 880,35	275,11	100,00%	R$	880,35
12.62	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	m	16,43	R$ 6,43	R$ 105,64		0,00%	R$ -	16,43	100,00%	R$ 105,64	16,43	100,00%	R$	105,64
12.63	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	m	115,77	R$ 11,43	R$ 1.323,25		0,00%	R$ -	115,77	100,00%	R$ 1.323,25	115,77	100,00%	R$	1.323,25
12.64	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	m	42,95	R$ 17,47	R$ 750,34		0,00%	R$ -	42,95	100,00%	R$ 750,34	42,95	100,00%	R$	750,34
12.65	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	m	50,33	R$ 24,35	R$ 1.225,54		0,00%	R$ -	50,33	100,00%	R$ 1.225,54	50,33	100,00%	R$	1.225,54
12.66	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	m	94,74	R$ 30,52	R$ 2.891,46		0,00%	R$ -	94,74	100,00%	R$ 2.891,46	94,74	100,00%	R$	2.891,46
12.67	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	m	46,40	R$ 70,10	R$ 3.252,64		0,00%	R$ -	46,40	100,00%	R$ 3.252,64	46,40	100,00%	R$	3.252,64
12.68	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 14,27	R$ 14,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 14,27	1,00	100,00%	R$	14,27
12.69	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 72,22	R$ 72,22		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 72,22	1,00	100,00%	R$	72,22
12.70	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 14,27	R$ 14,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 14,27	1,00	100,00%	R$	14,27
12.71	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	un	8,00	R$ 101,06	R$ 808,48		0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 808,48	8,00	100,00%	R$	808,48
12.72	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 243,54	R$ 487,08		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 487,08	2,00	100,00%	R$	487,08
12.73	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 421,56	R$ 843,12		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 843,12	2,00	100,00%	R$	843,12
12.74	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 39,59	R$ 79,18		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 79,18	2,00	100,00%	R$	79,18
12.75	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 704,20	R$ 1.408,40		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 1.408,40	2,00	100,00%	R$	1.408,40
12.76	Registro gaveta 1" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	1,00	R$ 97,72	R$ 97,72		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 97,72	1,00	100,00%	R$	97,72
12.77	Registro gaveta 1.1/2" com canopla acabamento cromado - fornecimento e instalacao	un	5,00	R$ 143,97	R$ 719,85		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 719,85	5,00	100,00%	R$	719,85
12.78	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	31,00	R$ 79,68	R$ 2.470,08		0,00%	R$ -	31,00	100,00%	R$ 2.470,08	31,00	100,00%	R$	2.470,08
12.79	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	un	15,00	R$ 69,35	R$ 1.040,25		0,00%	R$ -	15,00	100,00%	R$ 1.040,25	15,00	100,00%	R$	1.040,25
12.80	Ligação predial individual de água, na parede, cavalete com registro esfera pvc sold, d=25mm, inclusive hidrômetro padrão DESO	un	1,00	R$ 173,13	R$ 173,13		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 173,13	1,00	100,00%	R$	173,13
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 32.689,80			R$ -			R$ 32.689,79		100,00%		R$ 32.689,79
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS														
13.1	Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação	m	237,27	R$ 18,74	R$ 4.446,44		0,00%	R$ -	237,27	100,00%	R$ 4.446,44	237,27	100,00%	R$	4.446,44
13.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	m	107,14	R$ 35,06	R$ 3.756,33		0,00%	R$ -	107,14	100,00%	R$ 3.756,33	107,14	100,00%	R$	3.756,33
13.3	Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	52,00	R$ 21,03	R$ 1.093,56		0,00%	R$ -	52,00	100,00%	R$ 1.093,56	52,00	100,00%	R$	1.093,56
13.4	Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação	un	26,00	R$ 14,03	R$ 364,78		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 364,78	26,00	100,00%	R$	364,78
13.5	Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 15,71	R$ 62,84		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 62,84	4,00	100,00%	R$	62,84
13.6	Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 54,54	R$ 218,16		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 218,16	4,00	100,00%	R$	218,16
13.7	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	24,00	R$ 34,50	R$ 826,08		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 826,08	24,00	100,00%	R$	826,08

Alvaro Barreiros Martin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO		BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
13.8	Caixa de concreto com tampa 80x80cm conforme projeto	un	20,00	R$ 73,45	R$ 1.469,00		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 1.469,00	20,00	100,00%	R$ 1.469,00	
13.9	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014	un	6,00	R$ 43,95	R$ 263,70		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 263,70	6,00	100,00%	R$ 263,70	
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 12.500,89			R$ -			R$ 12.500,89		100,00%	R$ 12.500,89	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA														
14.1	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar	un	19,00	R$ 35,97	R$ 683,43		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 683,43	19,00	100,00%	R$ 683,43	
14.2	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	1,00	R$ 46,66	R$ 46,66		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 46,66	1,00	100,00%	R$ 46,66	
14.3	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado	un	30,00	R$ 6,83	R$ 204,90		0,00%	R$ -	30,00	100,00%	R$ 204,90	30,00	100,00%	R$ 204,90	
14.4	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	39,00	R$ 4,07	R$ 158,73		0,00%	R$ -	39,00	100,00%	R$ 158,73	39,00	100,00%	R$ 158,73	
14.5	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	213,06	R$ 18,74	R$ 3.992,74		0,00%	R$ -	213,06	100,00%	R$ 3.992,74	213,06	100,00%	R$ 3.992,74	
14.6	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	125,81	R$ 9,61	R$ 1.209,03		0,00%	R$ -	125,81	100,00%	R$ 1.209,03	125,81	100,00%	R$ 1.209,03	
14.7	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	136,81	R$ 13,72	R$ 1.877,03		0,00%	R$ -	136,81	100,00%	R$ 1.877,03	136,81	100,00%	R$ 1.877,03	
14.8	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	92,42	R$ 21,12	R$ 1.951,91		0,00%	R$ -	92,42	100,00%	R$ 1.951,91	92,42	100,00%	R$ 1.951,91	
14.9	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	37,60	R$ 35,06	R$ 1.318,26		0,00%	R$ -	37,60	100,00%	R$ 1.318,26	37,60	100,00%	R$ 1.318,26	
14.10	Caixa de gordura simples em concreto com tampa e puxador conforme projeto - CG 37cm	un	7,00	R$ 81,74	R$ 572,18		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 572,18	7,00	100,00%	R$ 572,18	
14.11	Caixa de inspeção em concreto com tampa e puxador conforme projeto - 60 x 60 cm	un	17,00	R$ 310,78	R$ 5.283,26		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 5.283,26	17,00	100,00%	R$ 5.283,26	
14.12	Caixa de passagem modulada em concreto DN 30cm com tampa e puxador conforme projeto	un	1,00	R$ 128,35	R$ 128,35		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -	
14.13	Fossa séptica em concretro armado conforme projeto 3,05mx2,70mx2,70m inclusive tampa de concreto armado, escavação e conexões conforme projeto	un	1,00	R$ 9.285,02	R$ 9.285,02		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 9.285,02	1,00	100,00%	R$ 9.285,02	
14.14	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 3,05x2,70x2,80 m inclusive escavação, tampas, brita nº 4 e conexões conforme projeto	un	1,00	R$ 11.949,27	R$ 11.949,27		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 11.949,27	1,00	100,00%	R$ 11.949,27	
14.15	Sumidouro em alvenaria de tijolo ceramico maciço diametro 2,40m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado, espessura 10cm inclusive escavação conforme projeto	un	1,00	R$ 3.139,54	R$ 3.139,54		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 3.139,54	1,00	100,00%	R$ 3.139,54	
14.16	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	37,00	R$ 11,11	R$ 411,07		0,00%	R$ -	37,00	100,00%	R$ 411,07	37,00	100,00%	R$ 411,07	
14.17	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p	un	97,00	R$ 6,69	R$ 648,93		0,00%	R$ -	97,00	100,00%	R$ 648,93	97,00	100,00%	R$ 648,93	
14.18	Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm	un	23,00	R$ 37,47	R$ 861,81		0,00%	R$ -	23,00	100,00%	R$ 861,81	23,00	100,00%	R$ 861,81	
14.19	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	7,00	R$ 15,31	R$ 107,17		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 107,17	7,00	100,00%	R$ 107,17	
14.20	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	4,00	R$ 13,75	R$ 55,00		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 55,00	4,00	100,00%	R$ 55,00	
14.21	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	62,00	R$ 6,77	R$ 419,74		0,00%	R$ -	62,00	100,00%	R$ 419,74	62,00	100,00%	R$ 419,74	
14.22	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	49,00	R$ 5,50	R$ 269,50		0,00%	R$ -	49,00	100,00%	R$ 269,50	49,00	100,00%	R$ 269,50	
14.23	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	26,00	R$ 15,71	R$ 408,46		0,00%	R$ -	26,00	100,00%	R$ 408,46	26,00	100,00%	R$ 408,46	
14.24	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	35,00	R$ 11,43	R$ 400,05		0,00%	R$ -	35,00	100,00%	R$ 400,05	35,00	100,00%	R$ 400,05	
14.25	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	3,00	R$ 6,34	R$ 19,02		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 19,02	3,00	100,00%	R$ 19,02	
14.26	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19,00	R$ 5,33	R$ 101,27		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 101,27	19,00	100,00%	R$ 101,27	
14.27	Joelho de 90° com anel, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	65,00	R$ 7,42	R$ 482,30		0,00%	R$ -	65,00	100,00%	R$ 482,30	65,00	100,00%	R$ 482,30	

Alvaro Barreto Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Banco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO: 30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO			R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA): R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI			20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23
	PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020		DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO			300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA
	DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):				VALOR CONTRATO + CORREÇÃO				MEDIÇÃO ATUAL
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$ -
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
14.28	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	25,00	R$ 26,98	R$ 674,50		0,00%	R$ -	25,00	100,00%	R$ 674,50	25,00	100,00%	R$ 674,50
14.29	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2,00	R$ 30,82	R$ 61,64		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 61,64	2,00	100,00%	R$ 61,64
14.30	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	19,00	R$ 31,19	R$ 592,61		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 592,61	19,00	100,00%	R$ 592,61
14.31	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	5,00	R$ 20,37	R$ 101,85		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 101,85	5,00	100,00%	R$ 101,85
14.32	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	2,00	R$ 23,36	R$ 46,72		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 46,72	2,00	100,00%	R$ 46,72
14.33	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	6,00	R$ 11,76	R$ 70,56		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 70,56	6,00	100,00%	R$ 70,56
14.34	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	5,00	R$ 8,60	R$ 43,00		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 43,00	5,00	100,00%	R$ 43,00
14.35	Tê PVC 45° - 40mm - fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 7,81	R$ 7,81		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 7,81	1,00	100,00%	R$ 7,81
14.36	Tê 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19,00	R$ 7,81	R$ 148,39		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 148,39	19,00	100,00%	R$ 148,39
14.37	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	11,00	R$ 31,86	R$ 350,46		0,00%	R$ -	11,00	100,00%	R$ 350,46	11,00	100,00%	R$ 350,46
14.38	Tê redução 90 gr pvc rígido p/esgoto primário diâmetro 150x100mm	un	2,00	R$ 72,36	R$ 144,72		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 144,72	2,00	100,00%	R$ 144,72
14.39	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	19,00	R$ 14,76	R$ 280,44		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 280,44	19,00	100,00%	R$ 280,44
14.40	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	4,00	R$ 28,50	R$ 114,00		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 114,00	4,00	100,00%	R$ 114,00
14.41	Tê 90° de inspeção em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm	un	20,00	R$ 58,52	R$ 1.170,40		0,00%	R$ -	20,00	100,00%	R$ 1.170,40	20,00	100,00%	R$ 1.170,40
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 49.791,74			R$ -			R$ 49.669,38		99,75%	R$ 49.669,38
15	LOUÇAS E METAIS													
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, inclusive asento com furo, acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 221,18	R$ 442,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente inclusive assento plástico e acessórios - fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 204,94	R$ 819,76		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.3	Vaso sanitário convencional, linha infantil 08254, CELITE ou similar, inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	20,00	R$ 381,31	R$ 7.626,20		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.4	Valvula descarga 1.1/2" com registro, com duplo acionamento, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalacao	un	26,00	R$ 224,14	R$ 5.827,64		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.5	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	26,00	R$ 63,71	R$ 1.656,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.6	Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00	R$ 163,98	R$ 655,92		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.7	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados	un	4,00	R$ 325,71	R$ 1.302,84		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.8	Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L.915 DECA ou equivalente	un	6,00	R$ 91,24	R$ 547,44		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.9	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira	un	22,00	R$ 103,87	R$ 2.285,14		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.10	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	4,00	R$ 94,05	R$ 376,20		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreto Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Banco do Brasil / Ag. 8308-9	Conta: 707-2	FIM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
15.11	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	15,00	R$ 281,36	R$ 4.220,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.12	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	26,00	R$ 119,66	R$ 3.111,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.13	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	un	22,00	R$ 49,07	R$ 1.079,54		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.14	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2"	un	8,00	R$ 109,07	R$ 872,56		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.15	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente	un	4,00	R$ 109,07	R$ 436,28		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.16	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC em aço inox	un	1,00	R$ 181,24	R$ 181,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.17	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos d=1 1/4"	m	6,20	R$ 77,41	R$ 479,94		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.18	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Buriqotto ou equivalente	un	4,00	R$ 376,20	R$ 1.504,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.19	Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2,00	R$ 187,63	R$ 375,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.20	Ducha Elétrica com desviador e mangueira 4.000W	un	4,00	R$ 451,26	R$ 1.805,04		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.21	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	15,00	R$ 101,14	R$ 1.517,10		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.22	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	15,00	R$ 87,85	R$ 1.317,75		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.23	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	un	11,00	R$ 11,92	R$ 131,12		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.24	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	32,00	R$ 43,91	R$ 1.405,12		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.25	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	15,00	R$ 60,95	R$ 914,25		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.26	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	un	7,00	R$ 350,03	R$ 2.450,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.27	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar (banheiros e ganchos para mochilas)	un	188,00	R$ 28,47	R$ 5.352,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.28	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2" para barra de apoio nas área dos chuveiros infantil e fraudário	m	6,92	R$ 85,88	R$ 594,29		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.29	Banco articulado para banho em aço inox com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	1,00	R$ 437,57	R$ 437,57		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
15.30	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,92 m), com barras verticais a cada 2,00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/4") e barra horizontal superior (1 1/4") na entrada da cheche	m	7,00	R$ 140,39	R$ 982,73		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 50.709,58			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL													
16.1	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m2	0,16	R$ 345,62	R$ 55,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.2	Tubo de aço galvanizado 3/4" (20mm), inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	43,00	R$ 22,08	R$ 949,44		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.3	Envelopamento de concreto - 3cm	m3	1,26	R$ 375,98	R$ 473,73		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.4	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	un	3,00	R$ 13,30	R$ 39,90		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.5	Válvula de esfera 3/4" NPT 300	un	4,00	R$ 21,40	R$ 85,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.6	União 3/4" NPT 300	un	3,00	R$ 11,24	R$ 33,72		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.7	Niple 3/4" NPT 300	un	6,00	R$ 11,11	R$ 66,66		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.8	Niple 1/2" NPT 300	un	4,00	R$ 9,42	R$ 37,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.9	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	R$ 9,42	R$ 37,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA [illegible] Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitario	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
16.10	Tê redução 3/4"x1/2"	un	1,00	R$ 11,17	R$ 11,17		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.11	Redução 1/2" x 1/4"	un	1,00	R$ 11,17	R$ 11,17		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.12	Luva de redução 3/4 x 1/2"	un	2,00	R$ 9,53	R$ 19,06		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.13	Luva de redução 1/4 x 1/2"	un	2,00	R$ 9,53	R$ 19,06		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.14	Joelho 1/2" NPT 300	un	2,00	R$ 7,59	R$ 15,18		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.15	Regulador 1º estagio com manômetro	un	1,00	R$ 203,70	R$ 203,70		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.16	Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi	un	1,00	R$ 96,92	R$ 96,92		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.17	Mangueira Flexível	m	2,00	R$ 18,67	R$ 37,34		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.18	Regulador 2º estagio com manômetro	un	2,00	R$ 203,70	R$ 407,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.19	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	Un	1,00	R$ 12,36	R$ 12,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	Un	1,00	R$ 12,36	R$ 12,36		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 2.625,43			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO													
17.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	7,00	R$ 150,34	R$ 1.052,38		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	1,00	R$ 448,99	R$ 448,99		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.3	Cotovelo de 45° em aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento, instalação e pintura	un	2,00	R$ 37,40	R$ 74,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.4	Cotovelo de 90° em aço galvanizado 2.1/2" - fornecimento, instalação e pintura	un	7,00	R$ 37,40	R$ 261,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.5	Tubo de aço carbono 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes - fornecimento, instalacao e pintura	m	1,25	R$ 136,12	R$ 170,15		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" inclusive pintura	un	10,00	R$ 42,08	R$ 420,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.7	Te de aco galvanizado 2.1/2" - fornecimento, instalacao e pintura	un	4,00	R$ 91,61	R$ 366,44		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.8	Tubo de aço galvanizado 2.1/2" (65mm), inclusive conexoes e pintura - fornecimento e instalacao	m	65,27	R$ 136,12	R$ 8.884,55		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.9	Caixa de incêndio metálica dimensões 0,90x0,60x0,17 m, c/ tampa de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2" l=15,00 m e esguicho	un	2,00	R$ 1.109,14	R$ 2.218,28		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.10	Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2"	un	3,00	R$ 42,08	R$ 126,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.11	Registro globo 2 1/2" 45°	un	3,00	R$ 183,20	R$ 549,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.12	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	3,00	R$ 218,15	R$ 654,45		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.13	Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	un	5,00	R$ 243,54	R$ 1.217,70		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.14	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	un	2,00	R$ 104,91	R$ 209,82		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.15	União de ferro conimo macho-femea	un	4,00	R$ 43,55	R$ 174,20		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.16	Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de 1 hora	un	40,00	R$ 34,12	R$ 1.364,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.17	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (marcação no piso 1m x 1m para extintor)	m2	8,00	R$ 18,77	R$ 150,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.18	Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro (marcação no piso 1m x 1m para hidrante)	m2	3,00	R$ 18,77	R$ 56,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.19	Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV completo inclusive acessórios conforme projeto	un	2,00	R$ 1.356,63	R$ 2.713,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.20	Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio	Un	2,00	R$ 12,36	R$ 24,72		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.21	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saida de emergência	Un	15,00	R$ 12,36	R$ 185,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.22	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	Un	3,00	R$ 12,36	R$ 37,08		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.23	Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio	Un	8,00	R$ 12,36	R$ 98,88		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
17.24	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m no passeio	un	1,00	R$ 279,13	R$ 279,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-SE Nº050366340-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	

DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):

	VALOR CONTRATO + CORREÇÃO	MEDIÇÃO ATUAL
MEDIÇÃO ATUAL	R$ 1.716.378,07	R$ 110.171,07
INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL		R$ -
VALOR MEDIDO NO PERÍODO	R$ 1.716.378,07	R$ 110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO									
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL			
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	
17.25	Tampa de ferro fundido 50X50cm para caixa de incêndio de passeio	un	1,00	R$ 232,96	R$ 232,96		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
17.26	Válvula de retenção horizontal ø 65mm (2.1/2") - fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 121,45	R$ 121,45		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 22.094,35			R$ -			R$ 0,00		0,00%		R$ 0,00
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS														
18.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostatica epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	5,00	R$ 402,12	R$ 2.010,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	1,00	R$ 595,59	R$ 595,59		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	un	2,00	R$ 950,96	R$ 1.901,92		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.4	Disjuntos unipolar termomagnético 10A	un	27,00	R$ 11,79	R$ 318,33		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.5	Disjuntos unipolar termomagnético 16A	un	18,00	R$ 11,79	R$ 212,22		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.6	Disjuntos unipolar termomagnético 20A	un	2,00	R$ 11,79	R$ 23,58		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.7	Disjuntos unipolar termomagnético 25A	un	2,00	R$ 11,79	R$ 23,58		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.8	Disjuntos unipolar termomagnético 40A	un	15,00	R$ 18,44	R$ 276,60		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.9	Disjuntos unipolar termomagnético 50A	un	7,00	R$ 18,44	R$ 129,08		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.10	Disjuntos unipolar termomagnético 63A	un	1,00	R$ 104,13	R$ 104,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.11	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	un	12,00	R$ 11,79	R$ 141,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.12	Disjuntor unipolar termomagnético 80A	un	1,00	R$ 55,16	R$ 55,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.13	Disjuntor bipolar termomagnético 25A	un	3,00	R$ 55,16	R$ 165,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.14	Disjuntor bipolar termomagnético 63A	un	3,00	R$ 104,13	R$ 312,39		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.15	Disjuntor bipolar termomagnético 100A	un	1,00	R$ 104,13	R$ 104,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.16	Disjuntor bipolar termomagnético 80A	un	1,00	R$ 104,13	R$ 104,13		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.17	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	un	1,00	R$ 77,21	R$ 77,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.18	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	un	1,00	R$ 77,21	R$ 77,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.19	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	un	2,00	R$ 18,44	R$ 36,88		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.20	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00	R$ 104,13	R$ 833,04		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.21	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	un	1,00	R$ 301,42	R$ 301,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.22	Disjuntor tripolar termomagnético 300A	un	1,00	R$ 784,67	R$ 784,67		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.23	Interruptor bipolar DR - 100A	un	3,00	R$ 203,56	R$ 610,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.24	Interruptor bipolar DR - 25A	un	3,00	R$ 130,66	R$ 391,98		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.25	Interruptor bipolar DR -63A	un	1,00	R$ 301,62	R$ 301,62		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.26	Interruptor bipolar DR -80A	un	1,00	R$ 301,62	R$ 301,62		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.27	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	un	28,00	R$ 107,82	R$ 3.018,96		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.28	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	un	8,00	R$ 101,31	R$ 810,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$	-
18.29	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 16mm (1/2") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	2,00	R$ 3,91	R$ 7,82		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 7,82	2,00	100,00%	R$	7,82
18.30	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	725,70	R$ 4,76	R$ 3.454,33		0,00%	R$ -	725,70	100,00%	R$ 3.454,33	725,70	100,00%	R$	3.454,33
18.31	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	461,30	R$ 6,05	R$ 2.790,87		0,00%	R$ -	461,30	100,00%	R$ 2.790,87	461,30	100,00%	R$	2.790,87
18.32	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn32 mm (1 1/2") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	68,60	R$ 8,32	R$ 570,75		0,00%	R$ -	68,60	100,00%	R$ 570,75	68,60	100,00%	R$	570,75
18.33	Eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao	m	2,30	R$ 21,67	R$ 49,81		0,00%	R$ -	2,30	100,00%	R$ 49,81	2,30	100,00%	R$	49,81

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº050366340-0

José Eduardo Macêdo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO			R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI			20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO			300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO				MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL						R$ -	
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07				R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
18.34	Eletroduto flexivel aco galvanizado d = 1" (25mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	176,00	R$ 9,89	R$ 1.740,64		0,00%	R$ -	176,00	100,00%	R$ 1.740,64	176,00	100,00%	R$ 1.740,64
18.35	Eletroduto flexivel aco galvanizado d = 1 1/4" (32mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	80,60	R$ 12,71	R$ 1.024,43		0,00%	R$ -	80,60	100,00%	R$ 1.024,43	80,60	100,00%	R$ 1.024,43
18.36	Eletroduto flexivel aco galv tipo conduite d = 1 1/2" (40mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	5,20	R$ 14,35	R$ 74,62		0,00%	R$ -	5,20	100,00%	R$ 74,62	5,20	100,00%	R$ 74,62
18.37	Eletroduto flexivel aco galv tipo conduite d = 2" (50mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	14,70	R$ 19,49	R$ 286,50		0,00%	R$ -	14,70	100,00%	R$ 286,50	14,70	100,00%	R$ 286,50
18.38	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 62mm (2 1/2"), tipo semi-pesado, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	3,50	R$ 58,91	R$ 206,19		0,00%	R$ -	3,50	100,00%	R$ 206,19	3,50	100,00%	R$ 206,19
18.39	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 75mm (3"), tipo semi-pesado, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	21,90	R$ 70,32	R$ 1.540,01		0,00%	R$ -	21,90	100,00%	R$ 1.540,01	21,90	100,00%	R$ 1.540,01
18.40	Caixa de passagem pvc 3" octogonal	un	205,00	R$ 9,26	R$ 1.898,30		0,00%	R$ -	205,00	100,00%	R$ 1.898,30	205,00	100,00%	R$ 1.898,30
18.41	Caixa de passagem pvc 4x4" - fornecimento e instalacao	un	10,00	R$ 7,19	R$ 71,90		0,00%	R$ -	10,00	100,00%	R$ 71,90	10,00	100,00%	R$ 71,90
18.42	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	262,00	R$ 6,11	R$ 1.600,82		0,00%	R$ -	262,00	100,00%	R$ 1.600,82	262,00	100,00%	R$ 1.600,82
18.43	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	R$ 128,18	R$ 2.179,06		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.179,06	17,00	100,00%	R$ 2.179,06
18.44	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	17,00	R$ 136,95	R$ 2.328,15		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.328,15	17,00	100,00%	R$ 2.328,15
18.45	Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm	un	2,00	R$ 38,82	R$ 77,64		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 77,64	2,00	100,00%	R$ 77,64
18.46	Cabo de cobre flexivel isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c - fornecimento	M	5.146,90	R$ 1,68	R$ 8.646,79		0,00%	R$ -	5.146,90	100,00%	R$ 8.646,79	5.146,90	100,00%	R$ 8.646,79
18.47	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 4mm2 resistente a chama - fornecimentoe instalacao	m	1.012,30	R$ 4,18	R$ 4.231,41		0,00%	R$ -	1.012,30	100,00%	R$ 4.231,41	1.012,30	100,00%	R$ 4.231,41
18.48	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 6mm2 resistente a chama - fornecimentoe instalacao	m	2.001,80	R$ 5,65	R$ 11.310,17		0,00%	R$ -	2.001,80	100,00%	R$ 11.310,17	2.001,80	100,00%	R$ 11.310,17
18.49	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 10mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	410,40	R$ 8,68	R$ 3.562,27		0,00%	R$ -	410,40	100,00%	R$ 3.562,27	410,40	100,00%	R$ 3.562,27
18.50	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 16mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	906,30	R$ 9,98	R$ 9.044,87		0,00%	R$ -	906,30	100,00%	R$ 9.044,87	906,30	100,00%	R$ 9.044,87
18.51	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 25mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	2.070,70	R$ 14,44	R$ 29.900,91		0,00%	R$ -	2.070,70	100,00%	R$ 29.900,91	2.070,70	100,00%	R$ 29.900,91
18.52	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 35mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	235,90	R$ 19,64	R$ 4.633,08		0,00%	R$ -	235,90	100,00%	R$ 4.633,08	235,90	100,00%	R$ 4.633,08
18.53	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 50mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	157,60	R$ 26,44	R$ 4.166,94		0,00%	R$ -	157,60	100,00%	R$ 4.166,94	157,60	100,00%	R$ 4.166,94
18.54	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 70mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	174,70	R$ 37,57	R$ 6.563,48		0,00%	R$ -	174,70	100,00%	R$ 6.563,48	174,70	100,00%	R$ 6.563,48
18.55	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 120mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	102,20	R$ 61,10	R$ 6.244,42		0,00%	R$ -	102,20	100,00%	R$ 6.244,42	102,20	100,00%	R$ 6.244,42
18.56	Cabo de cobre isolado pvc 450/750v 240mm2 resistente a chama - fornecimento e instalacao	m	138,00	R$ 114,83	R$ 15.846,54		0,00%	R$ -	138,00	100,00%	R$ 15.846,54	138,00	100,00%	R$ 15.846,54
18.57	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	m	12,00	R$ 13,70	R$ 164,40		0,00%	R$ -	12,00	100,00%	R$ 164,40	12,00	100,00%	R$ 164,40
18.58	Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões	m	3,70	R$ 26,33	R$ 97,42		0,00%	R$ -	3,70	100,00%	R$ 97,42	3,70	100,00%	R$ 97,42
18.59	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	m	1,70	R$ 33,95	R$ 57,72		0,00%	R$ -	1,70	100,00%	R$ 57,72	1,70	100,00%	R$ 57,72
18.60	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	m	3,90	R$ 40,55	R$ 158,15		0,00%	R$ -	3,90	100,00%	R$ 158,15	3,90	100,00%	R$ 158,15
18.61	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	m	36,60	R$ 26,33	R$ 963,68		0,00%	R$ -	36,60	100,00%	R$ 963,68	36,60	100,00%	R$ 963,68
18.62	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	m	31,30	R$ 13,70	R$ 428,81		0,00%	R$ -	31,30	100,00%	R$ 428,81	31,30	100,00%	R$ 428,81
18.63	Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões	m	18,50	R$ 26,33	R$ 487,11		0,00%	R$ -	18,50	100,00%	R$ 487,11	18,50	100,00%	R$ 487,11
18.64	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	m	11,50	R$ 26,33	R$ 302,80		0,00%	R$ -	11,50	100,00%	R$ 302,80	11,50	100,00%	R$ 302,80

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº060366340-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

		TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO			
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			001-Banco do Brasil / Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1 / ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO	R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):						VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL	
				MEDIÇÃO ATUAL		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL				R$	-
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$	1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
18.65	Suporte vertical 120 x 146 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	4,40	R$ 9,53	R$ 41,93		0,00%	R$ -	4,40	100,00%	R$ 41,93	4,40	100,00%	R$ 41,93
18.66	Suporte vertical 120 x 160 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	3,00	R$ 9,53	R$ 28,59		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 28,59	3,00	100,00%	R$ 28,59
18.67	Suporte vertical 70 x 125 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	6,00	R$ 9,53	R$ 57,18		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 57,18	6,00	100,00%	R$ 57,18
18.68	Suporte vertical 70 x 81 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	18,00	R$ 9,53	R$ 171,54		0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 171,54	18,00	100,00%	R$ 171,54
18.69	Suporte vertical 70 x 96 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	22,00	R$ 9,53	R$ 209,66		0,00%	R$ -	22,00	100,00%	R$ 209,66	22,00	100,00%	R$ 209,66
18.70	Suporte vertical 95 x 114 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	19,00	R$ 9,53	R$ 181,07		0,00%	R$ -	19,00	100,00%	R$ 181,07	19,00	100,00%	R$ 181,07
18.71	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	38,00	R$ 5,92	R$ 224,96		0,00%	R$ -	38,00	100,00%	R$ 224,96	38,00	100,00%	R$ 224,96
18.72	Tala plana perfurada 75mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	6,00	R$ 6,70	R$ 40,20		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 40,20	6,00	100,00%	R$ 40,20
18.73	Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar)	un	4,00	R$ 6,70	R$ 26,80		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 26,80	4,00	100,00%	R$ 26,80
18.74	Tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - cor branca - fornecimento e instalacao	un	137,00	R$ 12,41	R$ 1.700,17		0,00%	R$ -	137,00	100,00%	R$ 1.700,17	137,00	100,00%	R$ 1.700,17
18.75	Tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - cor branca - fornecimento e instalacao	un	18,00	R$ 21,39	R$ 385,02		0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 385,02	18,00	100,00%	R$ 385,02
18.76	Interruptor 1 tecla paralela	un	2,00	R$ 12,20	R$ 24,40		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 24,40	2,00	100,00%	R$ 24,40
18.77	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	un	36,00	R$ 22,57	R$ 812,52		0,00%	R$ -	36,00	100,00%	R$ 812,52	36,00	100,00%	R$ 812,52
18.78	Interruptor 1 tecla simples	un	56,00	R$ 10,18	R$ 570,08		0,00%	R$ -	56,00	100,00%	R$ 570,08	56,00	100,00%	R$ 570,08
18.79	Interruptor 2 teclas simples	un	6,00	R$ 19,56	R$ 117,36		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 117,36	6,00	100,00%	R$ 117,36
18.80	Luminária calha sobrepor com proteção p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas	un	8,00	R$ 72,99	R$ 583,92		0,00%	R$ -	8,00	100,00%	R$ 583,92	8,00	100,00%	R$ 583,92
18.81	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	17,00	R$ 147,30	R$ 2.504,10		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.504,10	17,00	100,00%	R$ 2.504,10
18.82	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa	un	143,00	R$ 180,35	R$ 25.790,05		0,00%	R$ -	143,00	100,00%	R$ 25.790,05	143,00	100,00%	R$ 25.790,05
18.83	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	un	9,00	R$ 372,26	R$ 3.350,34		0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 3.350,34	9,00	100,00%	R$ 3.350,34
18.84	Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	4,00	R$ 185,42	R$ 741,68		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 741,68	4,00	100,00%	R$ 741,68
18.85	Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	1,00	R$ 214,03	R$ 214,03		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 214,03	1,00	100,00%	R$ 214,03
18.86	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	un	18,00	R$ 51,91	R$ 934,38		0,00%	R$ -	18,00	100,00%	R$ 934,38	18,00	100,00%	R$ 934,38
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 179.449,74			R$ -			R$ 165.422,59		92,18%	R$ 165.422,59
19	SUBESTAÇÃO 75KVA/220V													
19.1	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4 awg	un	3,00	R$ 13,06	R$ 39,18		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.2	Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm	un	40,00	R$ 0,50	R$ 20,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.3	Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento	Un	1,00	R$ 31,42	R$ 31,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.4	Cabo de alumínio nu acsr/caa 6 fios - 4/0 awg - fornecimento	kg	6,00	R$ 22,67	R$ 136,02		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.5	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 95mm², 1kv / 90° C	m	30,00	R$ 53,38	R$ 1.601,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.6	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 50mm², 1kv / 90° C	m	10,00	R$ 30,94	R$ 309,40		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.7	Cordoalha de cobre nu 50,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	20,00	R$ 30,45	R$ 609,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.8	Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA	un	1,00	R$ 681,30	R$ 681,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.9	Fornecimento de elo fusível tipo 3 h, comp.= 500mm	un	3,00	R$ 7,01	R$ 21,03		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.10	Quadro de medição indireta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente padrão Sulgipe	un	1,00	R$ 662,31	R$ 662,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.11	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	Un	1,00	R$ 47,88	R$ 47,88		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
19.12	Eletroduto pvc roscavel, d=4 " - inclusive conexões	M	6,00	R$ 30,71	R$ 184,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO					
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE	001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE	VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO			R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$	-
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$		1.716.378,07	R$	110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO											
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL					
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL			
19.13	Luva de pvc rígido roscável diâm = 4"	un	2,00	R$ 28,44	R$ 56,88		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.14	Conector ampactinho 4AWG	un	3,00	R$ 6,17	R$ 18,51		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.15	Conector parafuso fendido "split-bolt" - para cabo de 95mm2 - fornecimento e instalacao	un	2,00	R$ 9,17	R$ 18,34		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.16	Kit abraçadeira de aço carbono ¾" com feixo	un	1,00	R$ 31,94	R$ 31,94		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.17	Conector duplo terra	un	4,00	R$ 10,93	R$ 43,72		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.18	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1,00	R$ 13,30	R$ 13,30		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.19	Fita Isolante Colorida (vermelho, azul, amarelo, branco)	Un	4,00	R$ 7,25	R$ 29,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.20	Gancho olhal aço 50Kn	un	3,00	R$ 14,03	R$ 42,09		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.21	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m com conector	un	4,00	R$ 31,67	R$ 126,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.22	Fornecimento de isolador de disco polimérico 15 kv	un	3,00	R$ 85,62	R$ 256,86		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.23	Fornecimento de porca olhal em aço carbono 16 mm	un	3,00	R$ 5,08	R$ 15,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.24	Fornecimento de manilha sapatilha em ferro nodular galvanizado	un	3,00	R$ 14,99	R$ 44,97		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.25	Caixa inspeção aterramento 300x300x400mm	un	2,00	R$ 38,82	R$ 77,64		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.26	Parafuso máquina 16x300mm	un	4,00	R$ 6,44	R$ 25,76		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.27	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 400mm	un	4,00	R$ 10,00	R$ 40,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.28	Para-raio polimérico 15 KV	un	3,00	R$ 182,16	R$ 546,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.29	Suporte para transformador	un	2,00	R$ 60,21	R$ 120,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.30	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2	Un	6,00	R$ 3,19	R$ 19,14		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.31	Poste de concreto duplo T (DT) 10/600 - fornecimento	un	1,00	R$ 1.027,74	R$ 1.027,74		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.32	Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm	un	3,00	R$ 154,76	R$ 464,28		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.33	Transformador trifásico 75KVA-13.800/380/220V	un	1,00	R$ 10.825,42	R$ 10.825,42		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.34	Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg	un	3,00	R$ 56,82	R$ 170,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
19.35	Estribo normal 4AWG	un	3,00	R$ 35,09	R$ 105,27		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
	SUB-TOTAL ITEM				**R$ 16.463,32**			**R$ -**			**R$ 0,00**			**R$ 0,00**			
20	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO**																
20.1	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado)	m	153,39	R$ 3,20	R$ 490,85		0,00%	R$ -	153,39	100,00%	R$ 490,85	153,39	100,00%	R$ 490,85			
20.2	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	un	23,00	R$ 3,24	R$ 74,52		0,00%	R$ -	23,00	100,00%	R$ 74,52	23,00	100,00%	R$ 74,52			
20.3	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado ? fornecimento e instalação. af_12/2014_p	un	28,00	R$ 3,05	R$ 85,40		0,00%	R$ -	28,00	100,00%	R$ 85,40	28,00	100,00%	R$ 85,40			
20.4	Caixa de concreto 40x40x40cm com fundo de brita conforme projeto	un	7,00	R$ 73,45	R$ 514,15		0,00%	R$ -	7,00	100,00%	R$ 514,15	7,00	100,00%	R$ 514,15			
	SUB-TOTAL ITEM				**R$ 1.164,92**			**R$ -**			**R$ 1.164,92**			**R$ 1.164,92**			
21	**INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA**																
21.1	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 42u x 680mm c/ 05 patch panel 24 portas cat.6e	un	3,00	R$ 6.436,70	R$ 19.310,10		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.2	Switch 48 portas - fornecimento e instalação	un	1,00	R$ 1.141,45	R$ 1.141,45		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.3	Guias de cabos simples	un	2,00	R$ 11,12	R$ 22,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.4	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	1,00	R$ 11,12	R$ 11,12		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.5	Guia de Cabos Vertical	un	18,00	R$ 11,12	R$ 200,16		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.6	Guia de Cabos Superior, fechado	un	2,00	R$ 11,12	R$ 22,24		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.7	Perfil de montagem	un	1,00	R$ 284,74	R$ 284,74		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.8	Anel organizador de cabos	un	2,00	R$ 3,13	R$ 6,26		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.9	Bandeja deslizante perfurada	Un	2,00	R$ 175,32	R$ 350,64		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.10	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	1,00	R$ 454,23	R$ 454,23		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.11	Roteador Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - 3 atenas - fornecimento e instalação	un	2,00	R$ 161,43	R$ 322,86		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2220613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE			TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO	
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE			001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36
				VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA		R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		
				MEDIÇÃO ATUAL			R$		1.716.378,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO			R$		1.716.378,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO											
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL					
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL			
21.12	Cabo UTP -6 (24AWG)	m	1.268,50	R$ 6,66	R$ 8.448,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.13	Cabo coaxial	m	341,00	R$ 4,15	R$ 1.415,15		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.14	Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros	m	78,40	R$ 6,66	R$ 522,14		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.15	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	28,00	R$ 21,06	R$ 589,68		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.16	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	un	14,00	R$ 21,50	R$ 301,00		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.17	Central PABX 24 portas	un	1,00	R$ 5.202,38	R$ 5.202,38		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.18	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	4,00	R$ 128,18	R$ 512,72		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 512,72	4,00	100,00%	R$ 512,72			
21.19	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	un	41,00	R$ 6,11	R$ 250,51		0,00%	R$ -	41,00	100,00%	R$ 250,51	41,00	100,00%	R$ 250,51			
21.20	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 25mm (1") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	1,30	R$ 6,05	R$ 7,87		0,00%	R$ -	1,30	100,00%	R$ 7,87	1,30	100,00%	R$ 7,87			
21.21	Eletroduto de pvc flexivel corrugado dn 20mm (3/4") fornecimento e instalacao - inclusive conexões	m	119,30	R$ 4,76	R$ 567,87		0,00%	R$ -	119,30	100,00%	R$ 567,87	119,30	100,00%	R$ 567,87			
21.22	Eletroduto flexivel aco galvanizado d = 1" (25mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	50,40	R$ 9,89	R$ 498,46		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.23	Eletroduto flexivel aco galvanizado d = 1 1/4" (32mm) - inclusive conexões - fornecimento e instalacao	m	4,10	R$ 12,71	R$ 52,11		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.24	Eletroduto de aco galvanizado eletrolitico dn 50mm (2"), tipo semi-pesado, inclusive conexoes - fornecimento e instalacao	m	22,00	R$ 42,45	R$ 933,90		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
21.25	Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões	m	77,74	R$ 20,00	R$ 1.554,80		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 42.982,83			R$ -			R$ 1.338,97		3,12%	R$ 1.338,97			
22	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA																
22.1	Coifa em aço inox escovado AISI 304, tipo encostada, com filtros inercias, descarga vertical superior com diam=30cm, Exaustor, duto, chapeu chines, filtro, dimensões: Larg=1500 x Prof=1000 x alt=600mm	un	1,00	R$ 5.896,99	R$ 5.896,99		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
22.2	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexivel - kit	un	2,00	R$ 372,74	R$ 745,48		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -			
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 6.642,47			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00			
23	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)																
23.1	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples	m	3,00	R$ 45,46	R$ 136,38		0,00%	R$ -	3,00	100,00%	R$ 136,38	3,00	100,00%	R$ 136,38			
23.2	Fornecimento e instalação de haste de aterramento galvanizada a fogo 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760, para pilares e malha enterrada	un	33,00	R$ 42,58	R$ 1.405,14		0,00%	R$ -	33,00	100,00%	R$ 1.405,14	33,00	100,00%	R$ 1.405,14			
23.3	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	48,00	R$ 1,81	R$ 86,88		0,00%	R$ -	48,00	100,00%	R$ 86,88	48,00	100,00%	R$ 86,88			
23.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	Un	24,00	R$ 5,14	R$ 123,36		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 123,36	24,00	100,00%	R$ 123,36			
23.5	Presilha em latão	un	24,00	R$ 0,99	R$ 23,76		0,00%	R$ -	24,00	100,00%	R$ 23,76	24,00	100,00%	R$ 23,76			
23.6	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1,00	R$ 228,17	R$ 228,17		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 228,17	1,00	100,00%	R$ 228,17			
23.7	Escavação e reaterro de vala para aterramento	m3	39,00	R$ 4,52	R$ 176,28		0,00%	R$ -	39,00	100,00%	R$ 176,28	39,00	100,00%	R$ 176,28			
23.8	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	5,00	R$ 10,98	R$ 54,90		0,00%	R$ -	5,00	100,00%	R$ 54,90	5,00	100,00%	R$ 54,90			
23.9	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	330,00	R$ 21,51	R$ 7.098,30		0,00%	R$ -	330,00	100,00%	R$ 7.098,30	330,00	100,00%	R$ 7.098,30			
23.10	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm2 - fornecimento e instalacao	m	260,00	R$ 30,45	R$ 7.917,00		0,00%	R$ -	260,00	100,00%	R$ 7.917,00	260,00	100,00%	R$ 7.917,00			
23.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido conforme detalhe do projeto	un	4,00	R$ 83,22	R$ 332,88		0,00%	R$ -	4,00	100,00%	R$ 332,88	4,00	100,00%	R$ 332,88			
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 17.583,05			R$ -			R$ 17.583,05			R$ 17.583,05			

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

Jose Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA

BOLETIM DE MEDIÇÃO nº 27

TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO					
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE	001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	FIM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC	1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE	VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE		R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA		R$ 1.716.378,07	BDI	20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020				DATA INICIO DA OBRA:		24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO	300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							VALOR CONTRATO + CORREÇÃO		MEDIÇÃO ATUAL
				MEDIÇÃO ATUAL			R$	1.716.378,07	R$ 110.171,07
				INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -
				VALOR MEDIDO NO PERÍODO			R$	1.716.378,07	R$ 110.171,07

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES													
24.1	Base para fixação de mastro triplo	un	1,00	R$ 495,76	R$ 495,76		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
24.2	Mastro simples em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") inclusive pintura conforme projeto	un	1,00	R$ 2.001,73	R$ 2.001,73		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
24.3	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm conforme projeto	m2	48,53	R$ 183,52	R$ 8.906,23		0,00%	R$ -	48,53	100,00%	R$ 8.906,23	48,53	100,00%	R$ 8.906,23
24.4	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm inclusive mão francesa conforme projeto	m2	56,26	R$ 279,11	R$ 15.702,73		0,00%	R$ -	56,26	100,00%	R$ 15.702,73	56,26	100,00%	R$ 15.702,73
24.5	Prateleira e escaninhos em MDF inclusive acessórios conforme projeto	m2	48,02	R$ 77,56	R$ 3.724,43		0,00%	R$ -	48,02	100,00%	R$ 3.724,43	48,02	100,00%	R$ 3.724,43
24.6	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto polido, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	17,00	R$ 120,04	R$ 2.040,68		0,00%	R$ -	17,00	100,00%	R$ 2.040,68	17,00	100,00%	R$ 2.040,68
24.7	Banco e acabamento em granito	m	8,10	R$ 176,00	R$ 1.425,60		0,00%	R$ -	8,10	100,00%	R$ 1.425,60	8,10	100,00%	R$ 1.425,60
24.8	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, espessura variável e pingadeira	m	106,80	R$ 45,16	R$ 4.823,09		0,00%	R$ -	106,80	100,00%	R$ 4.823,09	106,80	100,00%	R$ 4.823,09
24.9	Letra de aco inox no22 alt=20cm fornecimento e colocacao (Fachada)	un	37,00	R$ 73,33	R$ 2.713,21		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 41.833,45			R$ -			R$ 36.622,76		87,54%	R$ 36.622,76
25	CASTELO D'ÁGUA - 30.000L													
25.1	Alça de içamento	un	2,00	R$ 13,06	R$ 26,12		0,00%	R$ -	2,00	100,00%	R$ 26,12	2,00	100,00%	R$ 26,12
25.2	Suporte de Luz Piloto	un	1,00	R$ 18,06	R$ 18,06		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 18,06	1,00	100,00%	R$ 18,06
25.3	Suporte para cinto de segurança	un	1,00	R$ 18,06	R$ 18,06		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 18,06	1,00	100,00%	R$ 18,06
25.4	Suporte para Pára-raio	un	1,00	R$ 18,06	R$ 18,06		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 18,06	1,00	100,00%	R$ 18,06
25.5	Escada tipo marinheiro em aco ca-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcao e esmalte sintético	m	9,00	R$ 53,16	R$ 478,44		0,00%	R$ -	9,00	100,00%	R$ 478,44	9,00	100,00%	R$ 478,44
25.6	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto	kg	1.702,30	R$ 16,13	R$ 27.458,10		0,00%	R$ -	1.702,30	100,00%	R$ 27.458,10	1.702,30	100,00%	R$ 27.458,10
25.7	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	un	6,00	R$ 330,28	R$ 1.981,68		0,00%	R$ -	6,00	100,00%	R$ 1.981,68	6,00	100,00%	R$ 1.981,68
25.8	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3	m2	145,79	R$ 15,00	R$ 2.186,85		0,00%	R$ -	145,79	100,00%	R$ 2.186,85	145,79	100,00%	R$ 2.186,85
25.9	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m2	69,08	R$ 41,42	R$ 2.861,29		0,00%	R$ -	69,08	100,00%	R$ 2.861,29	69,08	100,00%	R$ 2.861,29
25.10	Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi	m2	69,08	R$ 41,42	R$ 2.861,29		0,00%	R$ -	69,08	100,00%	R$ 2.861,29	69,08	100,00%	R$ 2.861,29
25.11	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	m2	69,08	R$ 14,57	R$ 1.006,50		0,00%	R$ -	69,08	100,00%	R$ 1.006,50	69,08	100,00%	R$ 1.006,50
25.12	Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco galvanizado 3/4" - 1m de altura	m	6,97	R$ 100,59	R$ 701,11		0,00%	R$ -	6,97	100,00%	R$ 701,11	6,97	100,00%	R$ 701,11
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 39.615,56			R$ -			R$ 39.615,56		100,00%	R$ 39.615,56
26	ACESSOS													
26.1	Pavimentacao em blocos de concreto sextavado, espessura 6,0 cm, fck 35mpa, assentados sobre colchao de areia.	m2	246,70	R$ 53,10	R$ 13.099,77		0,00%	R$ -	246,70	100,00%	R$ 13.099,77	246,70	100,00%	R$ 13.099,77
26.2	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (CALÇADA)	m	42,45	R$ 19,96	R$ 847,30		0,00%	R$ -	42,45	100,00%	R$ 847,30	42,45	100,00%	R$ 847,30
26.3	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação plástica, incluso lançamento e adensamento	m2	63,67	R$ 24,50	R$ 1.559,92		0,00%	R$ -	63,67	100,00%	R$ 1.559,92	63,67	100,00%	R$ 1.559,92
26.4	Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	1,00	R$ 215,84	R$ 215,84		0,00%	R$ -	1,00	100,00%	R$ 215,84	1,00	100,00%	R$ 215,84
26.5	Meio-fio de concreto simples, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (CANTEIRO)	m	45,00	R$ 19,96	R$ 898,20		0,00%	R$ -	45,00	100,00%	R$ 898,20	45,00	100,00%	R$ 898,20
26.6	Plantio de grama batatais em placas inclusive terra vegetal	m2	37,50	R$ 12,50	R$ 468,75		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
26.7	Piso tátil direcional 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	14,58	R$ 75,50	R$ 1.100,79		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA							BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
	TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE		001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE		VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ: 05.917.626/0001-80	VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020			DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):					VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
			MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	
			INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -	
			VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL
26.8	Piso tátil de alerta 30 x 30 cm em placas de concreto pré-moldadas na cor vermelha	m2	1,62	R$ 75,50	R$ 122,31		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 18.312,88			R$ -			R$ 10.621,03		90,76%	R$ 10.621,03
27	SERVIÇOS FINAIS													
27.1	Placa inauguracao em aluminio 0.40x0,60m fornecimento e colocacao	un	1,00	R$ 479,55	R$ 479,55		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
27.2	Limpeza final da obra	m2	1.513,16	R$ 1,97	R$ 2.980,93		0,00%	R$ -		0,00%	R$ -	-	0,00%	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ 3.460,48			R$ -			R$ 0,00		0,00%	R$ 0,00
	ADITIVOS													
A1	INDICE DE REAJUSTE SOBRE SALDO DO CONTRATO				VALOR REAJUSTADO	SALDO DO REAJUSTE		VALOR MEDIDO						
A1.1	VALOR MEDIDO SOBRE INDICE DA MEDIÇÃO ATUAL	%	23.10				#VALOR!	R$ -		#VALOR!	R$ -	-	#VALOR!	R$ -
A1.2								R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A1.3								R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ -	-		R$ -			R$ -		#DIV/0!	R$ -
A2	ADITIVOS 2													
A2.1					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A2.2					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A2.3					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
A2.4					R$ -		#DIV/0!	R$ -		#DIV/0!	R$ -	-	#DIV/0!	R$ -
	SUB-TOTAL ITEM				R$ -			R$ -			R$ -		#DIV/0!	R$ -

RESUMO

VALOR DO CONTRATO ORIGINAL	R$ 1.716.378,07	6,42%	R$ 110.171,07	76,62%	R$ 1.315.123,85		83,04%	R$ 1.425.294,89
TOTAL DE ADITIVOS	R$ -	#DIV/0!	R$ 0,00	#DIV/0!	R$ 0,00		#DIV/0!	R$ 0,00
TOTAL GERAL DA OBRA:	R$ 1.716.378,07	6,42%	R$ 110.171,07	76,62%	R$ 1.315.123,85		83,04%	R$ 1.425.294,89

Atesto que os serviços foram executados conforme projetos aprovados

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

Atesto que os serviços foram executados e aceitos

Data: quarta-feira, 31 de maio de 2023

José Eduardo Macedo Carvalho

Medição aprovada para liberação

José Eduardo Macedo Carvalho
CREA 2720613770SE
Engenheiro Civil

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINÁPOLIS				SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - SEINFRA						BOLETIM DE MEDIÇÃO nº	27
			TERMO DE COMPROMISSO	PAC 10029/2014	INICIO CONVÊNIO	15/08/2015	FIM CONVÊNIO				
OBRA	CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - TIPO 1 - PADRÃO FNDE				001-Bamco do Brasil	Ag. 8308-9	Conta: 707-2	PM Cristinápolis - PAC1	ID SIMEC 1016257	DATA DA FISCALIZAÇÃO	30/05/2023
ENDEREÇO	Rua Santa Clara, s/nº, Bairro Santa Clara, Cristinápolis/SE				VALOR TOTAL DO REPASSE - FNDE	R$ 1.775.662,43	DIFERENÇA REPASSE E LICITAÇÃO		R$ 59.284,36	VALOR RESTANTE DO CONTRATO (EMPRESA)	R$ 291.083,18
EMPRESA	NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	CNPJ:	05.917.626/0001-80		VALOR TOTAL CONTRATO CONSTRUTORA	R$ 1.716.378,07	BDI		20,91%	PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/09/21 A 30/05/23	
PERÍODO: 02/01/2020 a 21/01/2020					DATA INICIO DA OBRA:	24/12/2015	PRAZO DE EXECUÇÃO		300	FIM EXECUÇÃO DA OBRA	
DESCRIÇÃO DA OBRA E ESTÁGIO ATUAL (Observações):							VALOR CONTRATO + CORREÇÃO			MEDIÇÃO ATUAL	
					MEDIÇÃO ATUAL		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	
					INDICE MEDIDO SOBRE MEDIÇÃO ATUAL					R$ -	
					VALOR MEDIDO NO PERÍODO		R$ 1.716.378,07			R$ 110.171,07	

ITENS	SERVIÇOS LICITADOS	CONTRATADO				EXECUTADO								
						NO PERÍODO			ACUMULADO NAS MEDIÇÕES ANTERIORES			ACUMULADO TOTAL		
		UNID.	QUANT.	Valor Unitário	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL	QUANT.	%	TOTAL

(BM-16) : ITEM 14.17 FOI MEDIDO 33 UNIDADES A MAIS, TOTALIZANDO 134,02% R$ 220,77, ITEM 14.35 FOI MEDIDO 01 UNIDADE A MAIS, TOTALIZANDO 200% R$ 7,81, **TOTALIZANDO UMA DIFERENÇA DE R$ 228,58 a menos que a medição**

(BM-17): item 9.1 possuía acumulado de 2706,46 m², porém no BM-17 se equivocaram ao registrar como 2639,61 m² e medindo 96,85, sendo necessário somente 30 m² para concluir os 100% do item. Esse erro resultou em **R$ 186,51.a menos que a medição**

(BM-19): Item 9.5 possuía acumulado de 605,60 m², porém no bm-19 se equivocaram ao registrar como 475,80 m² e medindo 700, sendo necessário somente 646,01 m² para concluir os 100% do item. Esse erro resultou em **R$ 807,69.a menos que a medição**

(BM-20): Item 9.5 possuía acumulado de 1251,61 m², sendo 100% do item concluido, porém no BM-20 se equivocaram ao medirem mais 75,81 m². Esse erro resultou em **R$ 1134,12.a menos que a medição**

(BM-21): Item 14.16 possuía acumulado de 15 unidades, sendo necessário 22 unidades para 100% do item concluido, porém no BM-21 se equivocaram ao medirem mais 37 unidades. Esse erro resultou em R$ 166,65. No item 14.17 possuía acumulado de 97 unidades com 100% do item concluído, porém no BM-21 se equivocaram ao medirem mais 17 unidades. Esse erro resultou em R$ 113,73. Dessa forma, resultou em **R$ 280,38 a menos que a medição**

(BM-23): possui algum somatorio que não foi encontrado, resultando no erro de **R$ 8,37 a menos que a medição**

(BM-24): possui algum somatorio que não foi encontrado, resultando no erro de **R$ 5,49 a mais que a medição**

(BM-26): Foi medido de forma equivocada novamente os itens 14.13 e 14.14, pois os mesmo já foram medidos no BM-20 e BM-22 respectivamente. **Esse erro resultou no total de R$ 21.234,29**

Dessa forma, o acumulativo dos BM anteriores resultou em um acumulado no valor de R$ 23.874,45, o qual foi corrigido nesse BM-27 lançando no acumulado anterior serviços já executado e não medido anteriormente. (o valor acumulado anterior de acordo com os comprovantes de pagamento é de R$ 1.316.123,85

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 050366840-0

Responsável Técnico pela Execução	Responsável Técnico pela Fiscalização	Prefeito Municipal de Cristinápolis

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160016637

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

ALVARO BARREIRO VENTIN FILHO

Título profissional: **Engenheiro Civil** RNP: **050366840-0**

Empresa contratada: **NORRAU CONSTRUÇÕES,TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA ME** Registro: **000016516-0**

2. Contratante

Contratante: **Prefeitura Municipal de Cristinapolis Sergipe** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

PRAçA Da Bandeira Nº: **81**

Complemento: Bairro: **Santa Clara Centro**

Cidade: **Cristinápolis** UF: **SE** CEP: **49270000**

Telefone: Email:

Contrato: **02/2015** Celebrado em: **24/12/2015**

Valor: **R$ 1.716.378,07** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Cristinapolis Sergipe** CPF/CNPJ: **13.096.029/0001-60**

RUA Santa Clara Nº: **s/n**

Complemento: Bairro: **Santa Clara**

Cidade: **Cristinápolis** UF: **SE** CEP: **49270000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **24/12/2015** Previsão de término: **24/10/2016**

Finalidade: **Escolar**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA	1.510,23	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	66,38	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> ESTRUTURAS E CONCRETOS -> #110 - ESTRUTURA METALICA	1.426,85	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM -> #125 - FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	25,36	m³
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #191 - REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS	24,00	Pontos
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.	322,00	Pontos
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS -> UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA -> #325 - ATERRAMENTO	1.510,23	m2
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #71 - REDE DE AGUA	43,00	Pontos
111 - Execução de Obra Técnica > CREA-BA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO -> SANEAMENTO -> #72 - REDE DE ESGOTO	39,00	Pontos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Construção de uma creche proinfância Tipo 1 padrão FNDE no Bairro Santa Clara no município de Cristinápolis-SE conforme 02/2015.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20160016637

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL
INDIVIDUAL

Alvaro Barreiro Ventin Filho
Engenheiro Civil
Registro 13788/D-CREA-BA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ALVARO BARREIRO VENTIN FILHO - CPF: 094.149.405-30

Cristinapolis, 04 de março de 2016
Local data

Prefeitura Municipal de Cristinapolis Sergipe - CNPJ: 13.096.029/0001-60

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 195,96** Pago em: **01/03/2016** Nosso Número: **45448917**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://sitac.creaba.org.br/publico/, com a chave: 2Y8Y0x
Impresso em: 02/03/2016 às 09:32:03 por: , ip: 177.70.162.193

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
CNPJ: 05.917.626/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:24 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: **6F40.083B.EB35.577D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 03/05/2023 18:29

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20232601083**

RAZÃO SOCIAL	
NORRAU - CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
064.249.946 - BAIXADO	**05.917.626/0001-80**

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 03/05/2023, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.917.626/0001-80
Certidão nº: 6628302/2023
Expedição: 13/02/2023, às 10:09:29
Validade: 12/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.917.626/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

SIMPLES NACIONAL

Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

Declaração Original

Período de Apuração: **01/04/2023 a 30/04/2023**

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz:	**05.917.626/0001-80**
Nome empresarial:	**NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA**
Data de abertura no CNPJ:	**30/09/2003**
Optante pelo Simples Nacional:	**Sim**
Regime de Apuração:	**Competência**
Nº da Declaração:	**05917626202304001**

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2.Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	15.263,91	0,00	15.263,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.675.814,66	0,00	1.675.814,66
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.121.121,56	0,00	1.121.121,56
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	569.957,01	0,00	569.957,01
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	81.886,63	08/2022	90.897,22
09/2022	55.931,20	10/2022	105.044,17	11/2022	236.197,79	12/2022	0,00
01/2023	363.006,16	02/2023	145.687,46	03/2023	597.164,03		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R$)
15.263,91	1.064,77

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 05.917.626/0001-80	
Município: OLINDINA	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):

Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS

Receita Bruta Informada: R$ 15.263,91

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

Parcela 1: R$ 15.263,91

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 15.263,91

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 19/05/2023 11:24:50

Número do Recibo: 01.07.23139.0132026-5

Autenticação: 05303.91203.76498.26651

SIMPLES NACIONAL

RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ da Matriz
NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	**05.917.626/0001-80**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
30/09/2003	**Sim**
CNPJ das filiais presentes nesta declaração	
Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
04/2023	05917626202304001	R$ 15.263,91	R$ 1.064,77	R$ 0,00	R$ 1.064,77

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília)
19/05/2023 11:24:50
CPF do Responsável
634.220.695-34
IP do Usuário
131.161.67.142
Número do Recibo
01.07.23139.0132026-5
Autenticação
05303.91203.76498.26651

SIMPLES NACIONAL

Extrato do Simples Nacional

Gerado em 01/06/2023 11:01:07
Apurado em 19/05/2023 11:23:46
Apuração Original
PGDAS-D 2018 Versão 2.2.19

1) Informações do Contribuinte

CNPJ Básico: 05.917.626	Nome Empresarial: NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	
Data de Abertura: 30/09/2003	Regime de Apuração: Competência	Optante pelo Simples Nacional: Sim

2) Informações da Apuração 05917626202304001

Período de Apuração (PA): 04/2023

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	15.263,91	0,00	15.263,91
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	1.675.814,66	0,00	1.675.814,66
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.121.121,56	0,00	1.121.121,56
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	569.957,01	0,00	569.957,01
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	81.886,63	08/2022	90.897,22
09/2022	55.931,20	10/2022	105.044,17	11/2022	236.197,79	12/2022	0,00
01/2023	363.006,16	02/2023	145.687,46	03/2023	597.164,03		
2.2.2) Mercado Externo							
01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00		

2.3) Folha de Salários Anteriores (R$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

3) Informações dos Estabelecimentos - valores referentes às Receitas Informadas

CNPJ Estabelecimento: 05.917.626/0001-80	
Município: OLINDINA	UF: BA
Sublimite de Receita Anual (R$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R$):								
Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao Anexo IV, com retenção/substituição tributária de ISS								
Receita Bruta Informada: R$ 15.263,91								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77
Parcela 1: R$ 15.263,91								

Informações por Estabelecimento								
Valor Informado: 15.263,91								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

4) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
315,88	340,73	335,40	72,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,77

5) Este item não se aplica à primeira apuração do PA:

6) Informações sobre DAS Gerado na apuração: 05917626202304001

Número: 07202313960399206				Data de Vencimento: 22/05/2023		Data limite para acolhimento: 22/05/2023		
IRPJ	315,88	CSLL	340,73	COFINS	335,40	PIS/PASEP	72,76	
INSS/CPP	0,00	ICMS	0,00	IPI	0,00	ISS	0,00	
Principal	1.064,77	Multa	0,00	Juros	0,00	Total	1.064,77	

6.1) Discriminação dos Valores Calculados no DAS Gerado

Tributo	Valor	Ente Federativo de Destino
IRPJ	315,88	União
CSLL	340,73	União
COFINS	335,40	União
PIS	72,76	União

6.2) Informações da Arrecadação do DAS gerado nesta apuração

Data de Pagamento	Banco/Agência de Arrecadação	Valor Pago

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 171739/2023
Emissão: 24/02/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 648W3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: NORRAU CONSTRUÇÕES,TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - EPP

CNPJ: 05.917.626/0001-80

Registro: 0000165160

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 2.100.000,00

Data do Capital: 22/11/2021

Faixa: 6

Objetivo Social: OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS (COLETA DE LIXO;CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS;PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS; CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZACAO (RUAS PRACAS E CALCADAS); CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS; DEMOLICAO DE EDIFICIOS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO; INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA EDIFICAÇÕES; INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS; OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES; IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS; SERVICOS DE PINTURA EM EDIFICIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; OBRAS DE FUNDACAO; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E ESTRUTURAS TEMPORARIAS; OBRAS DE ALVENARIA E REBOCO; SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO CIVIL.TUDO NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA JONIVAL LUCAS DA SILVA, 12, SALA, CENTRO, OLINDINA, BA, 48470000

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 20/09/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 16516

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ALVARO BARREIRO VENTIN FILHO

Registro: 0503668400

CPF: 094.***.***-53

Data Início: 20/09/2007

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-ba.sitac.com.br/publico/, com a chave: 648W3
Impresso em: 24/02/2023 às 10:15:32 por: adapt, ip: 192.168.100.1

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 165774/2023
Emissão: 03/01/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: 2D1db

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: ALVARO BARREIRO VENTIN FILHO
Registro: 0503668400
CPF: 094.***.***-53

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 17/11/1981

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: Artigo 7º da resolução 218/73 do CONFEA
Instituição de Ensino: UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Data de Formação: 15/08/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NORRAU CONSTRUÇÕES,TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - EPP
Registro: 0000165160
CNPJ: 05.917.626/0001-80
Data Início: 20/09/2007
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.917.626/0001-80
Razão Social: NORRAU CONSTRUCOES TRANSPORTES E LOCACOES LTDA ME
Endereço: AV JONIVAL LUCAS DA SILVA 12 SALA / CENTRO / OLINDINA / BA / 48470-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051701290252753504

Informação obtida em 23/05/2023 17:23:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

ESTADO DA BAHIA
MUNICIPIO DE OLINDINA
Secretaria Municipal de Finanças
PCA Antônio Borges Santana, SN - CENTRO - 48.470-000
CNPJ: 13647854000106

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE EMPRESA RELATIVOS AOS TRIBUTOS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CNPJ/CPF:	05917626000180
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	44300134
NOME / RAZÃO SOCIAL:	NORRAU - CONSTRUCOES, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
ENDEREÇO:	AVENIDA JONIVAL LUCAS DA SILVA, 12 - SALA - CENTRO
MUNICIPIO / UF:	Olindina / BA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas aos tributos administrados pela(o) Secretaria Municipal de Finanças e inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

DATA EMISSÃO: 19/05/2023
VÁLIDO ATÉ: 18/06/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: AGWMJACNYMW

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SEDE CHORROCHÓ	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS

OCORRENCIAS:

OBRA PARADA POR O PERÍODO DE 17.04.23 A 30.05.23

OBSERVAÇÕES :

PERÍODO DE RETORNO PREVISTO DAS OBRAS PARA O DIA 06.06.23

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	05.06.23

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SANTA CLARA	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	14.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	Barra choça	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-6	13.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SANTA CLARA	01.09.22 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	12.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Bom Gosto	01.09.22 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	11.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sítio do Meio	01/09/21 A 30/05/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-6	10/01/2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	[illegible]	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA/BA Nº 063660840-0	09.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SEDE CLINA	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	06.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Barra choça	01.09.21 A 30.05.22

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra Parada por falta de Material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366340-0	05.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRAS CHC	SANTA CLARA	

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	04.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sapucaia	01.09.22 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA/BA Nº 050366340-0	03.01.2023

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
COLÉGIO	SANTA CLARA	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA DURANTE O PERÍODO DE 21.01. A 30.12.23
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	30.12.2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
ENCOL	ST CLARA	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIROS	
1 AJUDANTE	COLOCAÇÃO DE FERRO MIUDO
1 PINTOR	E ACABAMENTO ASSENTAMENTO
	DE PISO CERAMICO

OCORRENCIAS:

OBSERVAÇÕES :

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA N°050366840-0	20/01/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	[illegible] creche	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 encarregado	
2 pedreiros	
1 ajudante	serviços aplicação de massa
1 pintor	colocação de forro mineral c
	acabamento e assentamento
	de piso cerâmico
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	19/01/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
Creche	Sra Clara	01.09.22 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
4 Encarregado	
2 Pedreiro	
1 Pintor	Assentamento de piso cerâmico
2 Ajudante	Aplicação de massa PVA e de massa acrílica.
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	18/01/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
Creche	Sra Clara	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material. Desde
	01.01 a 17.01.22
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	17/01/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
	FERIADO ANO NOVO
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	31/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sn clima	01.09.21 à 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	30/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
Creche	Sra Elvira	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta
	de material.
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	29/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sta Clara	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	28/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	em cima	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreto Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	27/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	24/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	sn claro	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra Parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	22/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sta Clara	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra Parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA N°050366840-0	21/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
ene. Chc	Sta CLARA	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	20/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	STA ELINA	01.09.21 à 31.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	17/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
Creche	Sm clara	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	16/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
exec clic	sa clinica	01.09.22 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	15/12/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CMEI	Sta Cruz	01.09.21 à 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	14/01/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
cmei chc	Sta clara	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-6	10/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sta clara	01.09.21 à 30.05.22

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	09/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	sítio canto	01.09.21 A 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	08/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	PAU CLARO	01.09.21 A 30-05-23
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	**SERVIÇOS EXECUTADOS**	
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL	
OBSERVAÇÕES :		
FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	**EMPRESA CONTRATADA**	**DATA**
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-1	07/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche -	Sta clara	02 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra parada por falta de madeira.
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	06/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
encht	Sta clara	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	obra parada por falta de materiais
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	03/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01-09-21 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIROS	
2 AJUDANTES	SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO, COLOCAÇÃO DE FORRO MINERAL E ALVENARIA DO HIDRÁULICO, ELÉTRICA.
1 PINTOR	
ELETRICISTA	

OCORRENCIAS:	

OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	02/12/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CRUZ	01-09-21 - A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 - CARPINTEIRO	
2 - PEDREIRO	
2 - AJUDANTE	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA
1 - PINTOR	PVA, ASSENTAMENTO DE PISO
1 - ELETRICISTA	CERÂMICO, HIDRÁULICA, ELÉTRICA
-	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	01/12/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sn Clara	01-09-21 - 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 CARPINTEIRO	
2 PEDREIRO	Serviços de colocação de forro
2 AJUDANTES	Mineral e acabamento, assen-
1 ELETRICISTA	tamento de piso cerâmico e
1 PINTOR	aplicação de massa PVA
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA/BA Nº 050366840-0	30/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sra elvira	01-09-21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 - CARPINTEIRO	
2 - PEDREIRO	
2 - AJUDANTE	SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERAMICO, APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PVA, HIDRAULICA, ELETRICA, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO.
1 - PINTOR	
1 - SERVENTE	
1 - ENCANADOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	29/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	São Clara	01.09.22 - 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 encarregado	
2 pedreiros	
2 ajudantes	Serviços de assentamento de piso cerâmico, colocação de forro mineral e tratamento, hidráulica e elétrica.
1 eletricista	
1 encanador	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	26/11/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sem chuva	01.09.21 a 30.05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra parada por falta de material.
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	25/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	São Clara	01-09-21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	24/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	São elena	01.09.22 a 30.05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	21/11/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	SM eliza	01-09-21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	19/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01.09.21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	18/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
cacha	Sra elvira	01-09-21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 0523[illegible]40-0	17/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	são elena	01.09.21 a 30.05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL.
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	16/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	15/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sta clara	01-09-21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	12/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	sem chuva	01-09-22 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARALIZADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	11/11/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Sta clara	01-09-21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	10/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
cacheche	sede eletrobras	01-09-21 a 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA BA Nº 050366840-0	09/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	Em elmo	01-09-21 a 30.05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	08/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	BOM CLIMA	01-09-21 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	
	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	05/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	gov clarn	01-09-21 a 30-5-22

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	obra parada por falta de medição.
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	04/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
Creche	Sta Clara	01-09-21 À 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	Obra parada por falta de material
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	03/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
	FERIADO
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	02/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	Santa elvira	01-09-21 A 30.05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
1 CALCADOR	
1 ELETRICISTA	
1 PINTOR	
2 PEDREIRO	
2 APONTADOR	
	Fernando
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 060366840-0	01/11/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO ELVIRA	01-09-21 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	
2 AJUDANTE	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO
1 ENCANADOR	MINERAL, ACARTONADO, APLICAÇÃO
1 ELETRICISTA	DE MASSA PVA ASSENTAMENTO DE
1 PINTOR	PISO CERÂMICO, HIDRÁULICA E
	ELÉTRICA,
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	29/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	STA CLARA	01-09-21 A 30-05.23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCANADOR	
1 ENCANADOR	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO
2 AJUDANTE	MINERAL E ACRILTON 400,
1 ELETRICISTA	APLICAÇÃO DE MASSA PVA,
1 PINTOR	HIDRAULICA, ELETRICA, ASSENTA-
	MENTO DE PISO CERAMICO.
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	28/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01-09-21 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO
2 AJUDANTE	CERAMICO, APLICAÇÃO DE MASSA PVA
1 ELETRICISTA	HIDRAULICA E ELETRICA.
1 ENCANADOR	
1 PINTOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	27/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	STA CLARA	01-09-21 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	
2 AJUDANTE	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA
1 PINTOR	PVA, ASSENTAMENTO DE PISO
1 ENCANADOR	CERÂMICO, HIDRÁULICA E ELÉTRICA
1 ELETRICISTA	

OCORRENCIAS:

OBSERVAÇÕES :

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	26/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SM Claro	01-09-21 À 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 CARREGADO	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA
2 AJUDANTE	PVA, ASSENTAMENTO DE PISO
1 OPERADOR	CERÂMICO, HIDRÁULICA E CORRER
1 ENCANADOR	
1 PINTOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA N°050366840-0	29/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01-09-21 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 CARPINTEIRO	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DE REGISTRO ESCAVAÇÃO
2 AJUDANTE	APLICAÇÃO DE MASSA PVA, HIDRAULICA
1 ENCANADOR	ELETRICA,
1 PINTOR	
1 ELETRICISTA	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	22/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO ELOY	01-09-21 A 30-05-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	
2 AJUDANTE	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
1 ELETRICISTA	CERÂMICO, ELÉTRICA, HIDRÁULICA
1 ENCANADOR	E ASSENTAMENTO DE CERÂMICOS
1 PINTOR	

OCORRENCIAS:

OBSERVAÇÕES :

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	21/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01-09-21 A 16-01-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Vemin Filho Engenheiro Civil CREA BA Nº 050366840-0	20/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
creche	SÃO CLARA	01-09-21 A 16-01-23
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	**SERVIÇOS EXECUTADOS**	
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL	
OBSERVAÇÕES :		
FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	**EMPRESA CONTRATADA**	**DATA**
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	19/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
Creche	São Elena	01/09-21 A 16-01-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
OCORRENCIAS:	OBRA PARADA POR FALTA DE MATERIAL
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	18/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01-09-21 A 16-01-22

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
01 ENCARREGADO	
02 PEDREIRO	SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MASSA
02 AJUDANTE	PVA E REGULARIZAÇÃO CERÂMICO
01 PINTOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	15/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	BOA ESPERANÇA	01-09-21 A 16-01-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
01 ENCARREGADO	
02 PEDREIROS	SERVIÇOS DIVERSOS
02 AJUDANTES	
01 PINTOR	SERVIÇOS REGULARIZAÇÃO PISO
01 ELETRICISTA	EM CONCRETO.
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	14/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
[illegible]	[illegible]	01/09/22 A 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
01 [illegible]	
02 [illegible]	[illegible]
02 [illegible]	
01 [illegible]	APLICAÇÃO DE MASSA PVA, MASSA
01 [illegible]	ACRÍLICA, REVESTIMENTO CERÂMICO,
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	13/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CACHG -	SÃO CAETANO	01/09/21 A 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCANADOR	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DIVERSOS;
2 AJUDANTE	
1 PINTOR	APLICAÇÃO MASSA PVA, MASSA ACRÍLICA, ROUGSTIMENTO CERÂMICO
1 ELETRICISTA	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	12/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01-09-21 A 16-01-23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DIVERSOS
2 AJUDANTE	
1 ELETRICISTA	APLICAÇÃO DE MASSA PVA, MASSA ACRÍLICA, REVESTIMENTO CERÂMICO
1 PINTOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	15/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
ENTRADA	SÃO CLARA	01/09/21 A 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 CALAFATADOR	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DIVERSOS.
2 AJUDANTE	
1 CARPINTEIRO	APLICAÇÃO DE MASSA PVA, MASSA ACRÍLICA
	RECUPERAÇÃO CERÂMICO,
	PINTURA DE REGULARIZAÇÃO CIMENTADO
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050368840-0	08/10/2021/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDC	SÃO CLARA	01/09/22 - A 16/04/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
1 CARPINTEIRO	SERVIÇOS DIVERSOS
1 PINTOR	
2 AJUDANTE	APLICAÇÃO DE MASSA PVA, MASSA
1 ELETRICISTA	ACRÍLICA, REMANEJAMENTO ELÉTRICO
2 PEDREIRO	INSTALAÇÃO ELÉTRICA
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	04/10/2021/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
ENG OHC	STA CLARA	01/09/21 - A 16/06/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DIVERSOS.
2 AJUDANTE	
1 PINTOR	APLICAÇÃO DE MASSA PVA, MASSA ACRILICA, REJUNTAMENTO CERAMICO
2 ENCANADOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	06/10/2021/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SÃO CLARA	01/09/21 A 16/04/22

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	LEVANTAMENTO DE MUROS
2 AJUDANTE	
2 CALAFETADOR	PINTURA, REVESTIMENTO
1 PINTOR	CERÂMICO, CONSTRUÇÃO DE
	AGUA

OCORRENCIAS:

OBSERVAÇÕES :

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA N°050366840-0	05/10/2021/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CACHOEIRA	SANTA CLARA	01/09/21 A 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DIVERSOS.
2 APRENDIZ	
1 P/ AUXILIAR	LIMPEZA, REVESTIMENTO CERÂMICO
2 CARPINTEIRO	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	04/10/2021/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	ETA CHAVE	01/09/21 A 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
ENCANADOR	
2 PEDREIRO	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CANALETA
2 SERVENTE	PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS
2 ENCANADOR	
1 PINTOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA N°050366840-0	01/10/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	STA CLARA	02/09/21 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
ENCARREGADO	GERAL DE REVESTIMENTO
2 PEDREIRO	CERAMICA, PINTURA, ACABAMENTOS
2 AJUDANTE	
1 PINTOR	
2 SERVENTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840 0	20/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
	CONTINUAÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO
ELDER GOMES	CERÂMICA
2 PEDREIRO	
2 SERVENTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	29/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	Gta CARA	21/09/21 à 16/05/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 - ENCARREGADO	CONTINUAÇÃO DE REVESTIMENTO
2 - PEDREIROS	
1 - AJUDANTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	28/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	Stª CRUZ	05/09/21 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
ELIANDRO	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
2 - PEDREIROS	CERÂMICO PISO E PAREDES.
2 - AJUDANTES	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	27/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE GRANDE	STA CRUZ	23/09/21 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1-CARREGADOR	SERVIÇOS DE PINTURA, MONTA
2-PINTORES	COM ESQUADRIAS DE ALUM
2-MONTADORES	MIO, FORRO MINERAL.
2-SERRALHEIRO	
6-SERVENTES	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	24/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	SANTA CRUZ	01/04/21 à 16/05/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 CARREGADO	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACABAMENTO FINAL DA OBRA.
2 PEDREIRO	
2 ARMADOR	
2 PINTOR	
4 AJUDANTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	23/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	Gta CLARA	05/09/21 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
2 - CARPINTEIRO	ACABAMENTO E MONTAGEM --
2 - SERRALHEIROS	
2 - MONTADORES	
6 - AJUDANTES	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	22/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	STA CLARA	03/09/21 à 16/05/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 - CARREGADO	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS
2 - PEDREIROS	
2 - PINTORES	
2 - CARPINTEIROS	
2 - MONTADORES	
4 - AJUDANTES	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	21/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	SANTA CRUZ	01/09/21 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	PINTURA, ESQUADRIA DE MADEIRA
2 PEDREIRO	ESQUADRIA DE ALUMINIO, FORRO
2 CARPINTEIRO	DRYWALL, PINTURA.
2 MONTADOR	
6 SERVENTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	20/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SANTA CRUZ	02/09/21 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
ELETRICISTA CARPINTEIRO MONTADOR PINTOR ENCANADOR	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ESQUADRIAS.
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	17/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	SANTA CRUZ	01/09/2021 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 CARREGADO	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
2 PEDREIRO	ACOMPANHAMENTO E ANDAMENTO DA
1 AJUDANTE	OBRA
2 PINTOR	
1 CARPINTEIRO	
1 MONTADOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	16/09/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE	SANTA CRUZ	01/09/21 à 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	MONTAGEM DE PONTO DE OBRA
2 PEDREIRO	ACOMPANHADO, REGISTRO FOTOGRÁFICO
2 ARMADOR	MEDIÇÃO/PRAZOS
4 SERVENTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	15/04/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	SANTA CRUZ	01/09/21 à 16/01/22

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCAR	MONTAGEM DA FORMA MURO
2 PEDR	EM ESTRUTURA METÁLICA.
1 MONTADO	
2 AJUDANTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	14/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	SANTA CRUZ	01/09/21 À 16/05/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENGENHEIRO	CONTINUIDADE DE OBRA DE
2 PEDREIRO	ACABAMENTO (Alvenaria, Reboco
1 PINTOR	ESQUADRIA
1 SOLDADOR	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	13/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	SANTA CRUZ	01/04/2022-16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO 4 CARPINTEIRO 1 PEDREIRO 2 PINTOR 6-SERVENTE	CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE ALVENARIA. CERAMICA, ESQUADRIAS, ENCOSTO, PINTURA.
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	10/09/2022

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	RUA 90 C CAMPO CARVALHAES	01/09/2021 – 16/11/2021

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS
4 PEDREIRO	DE ALVENARIA COBERTURA
2 CARPINTEIRO	MONTAGEM DE TERÇAS, ESTRU
1 ELETRICISTA	DE MADEIRA E TELHA
2 PINTOR	ENCERRAMENTO.
6 SERVENTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	04/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
Creche Tipo FNDE	Rua [illegible]	01/01/21 - 16/01/2023

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1-Encarregado	Continuação dos serviços de
4-Pedreiro	Reboco interno, chapisco
2-Carpinteiro	de esquadrias de madeira
1-Eletricista	portas, instalação de elétrica
6-Servente	

OCORRENCIAS:

OBSERVAÇÕES :

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	8/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FUNDE	SANTA CRUZ CABRÁLIA	01/04/21 – 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1 ENCARREGADO	Reforma DE CRECHE
4 PEDREIRO	RUA/PRAÇA, GUARDIÃO DE OBRA
1 CARPINTEIRO	SERRALHEIRO - ELETRICISTA
1 ELETRICISTA	
6 - SERVENTE	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº 050366840-0	07/04/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRAMA FARE	RUA 07 = CAIXA	01/09/2021 - 01/2022

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1-CARREGADO	CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS
4-PEDREIROS	DE REGULARIZAÇÃO
6-SERVENTE	
2-ENCANADOR	
1-ELETRICISTA	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	06/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	RUA GRUTA CAIRA CRUZ NOVA	01/09/2021 - 16/01/23

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	SERVIÇOS EXECUTADOS
1- CARREGADO	RECEBIMENTO CIMENTO P320/MISTO
4- PEDREIRO	DE, LOCAÇÃO DE GRADIS DE
6- GERENTE	MADEIRA, DUTOS TUBO-GÁS
2- CARPINTEIRO	
1- ELETRICISTA	
OCORRENCIAS:	
OBSERVAÇÕES :	

FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	EMPRESA CONTRATADA	DATA
	Alvaro Barreiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	07/09/2021

NORRAU
CONSTRUÇÕES, TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA

OBRA	LOCAL	PERÍODO DO SERVIÇO
CRECHE FNDE	RUA 9 ANTIGA CAMPO CRISTINA/BELO	01/09/2021 - 16/01/23
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	**SERVIÇOS EXECUTADOS**	
1- ENCARREGADO	- EXECUÇÃO DA ALVENARIA DE	
4- PEDREIRO	ALVENARIA E REVESTIMENTO ARGAMASSA	
6- SERVENTE	- INSTALAÇÕES ELETRICAS.	
1- CARPINTEIRO		
1- ELETRICISTA		
OCORRENCIAS:		
OBSERVAÇÕES :		
FISCALIÇÃO DA PREFEITURA	**EMPRESA CONTRATADA**	**DATA**
	Alvaro Barbeiro Ventin Filho Engenheiro Civil CREA-BA Nº050366840-0	02/09/2021
